



OPPDRAG ID #KAH9304

JTR Gruppen  
tlf: 976 35 530  
www.jtrgruppen.no  
post@jtrgruppen.no

# Rapport

## Rørinspeksjon

**Utført** 2022-06-03

**Lokasjon** Fredheimvegen 30,

**Kunde** Birkeland AS

**Kontakt** Glenn Roar

**Merking**

**Operatør** Kevin André Håland

**Til stede** David

**Bilder** [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/cd8dcef1-569b-4ebe-80cc-2a9c1dee605d/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/cd8dcef1-569b-4ebe-80cc-2a9c1dee605d/zippedImages)

### Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk. Fargestoff benyttet.

### Innhold:

[Fra septiktank mot hus](#)



[Fra utløp septiktank](#)



# Fra septiktank mot hus

Dato <b>2022-06-03</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Glenn Roar</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Fredheimvegen 30,</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Retning <b>Motstrøms</b>	Rørtype <b>Spilvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

Anmerkning  
**Ingen bemerkelser**

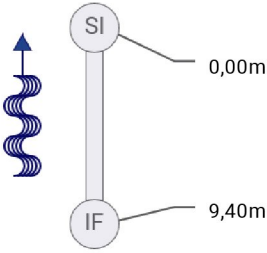
1:363	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra septiktank mot hus		
	9,40m	IF	Inspeksjon fullført ved bend opp		

Konklusjon  
**Kan ikke se noe fell på røret**

## Foto fra Fra septiktank mot hus



SI 0,00m Fra septiktank mot hus





[Klikk her for å laste ned videofilen "Fredheimvegen\\_30.avi"](https://admin.zapit.no/report/cd8dcef1-569b-4ebe-80cc-2a9c1dee605d/media/videodownload/fc2044071108b3507edc1dd8d21ab3abdefc7126.avi/Fredheimvegen_30.avi) ([https://admin.zapit.no/report/cd8dcef1-569b-4ebe-80cc-2a9c1dee605d/media/videodownload/fc2044071108b3507edc1dd8d21ab3abdefc7126.avi/Fredheimvegen\\_30.avi](https://admin.zapit.no/report/cd8dcef1-569b-4ebe-80cc-2a9c1dee605d/media/videodownload/fc2044071108b3507edc1dd8d21ab3abdefc7126.avi/Fredheimvegen_30.avi))

# Fra utløp septiktank

Dato <b>2022-06-03</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Glenn Roar</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Fredheimvegen 30,</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Retning <b>Medstrøms</b>	Rørtype <b>Spilvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

Anmerkning  
**Ingen bemerkelser**


1:777	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra utløp septiktank		
	1,90m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	4,80m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	6,40m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	9,90m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	11,30m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	20,00m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3 fredheimvegen 28		
	23,80m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	24,40m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3 fredheimvegen 28		
	31,50m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	37,30m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	52,00m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	56,70m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	58,20m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	59,00m	IF	Inspeksjon fullført i kum		

Konklusjon  
**Kan ikke se noen feil på røret.**

# Foto fra Fra utløp septiktank



SI 0,00m Fra utløp septiktank

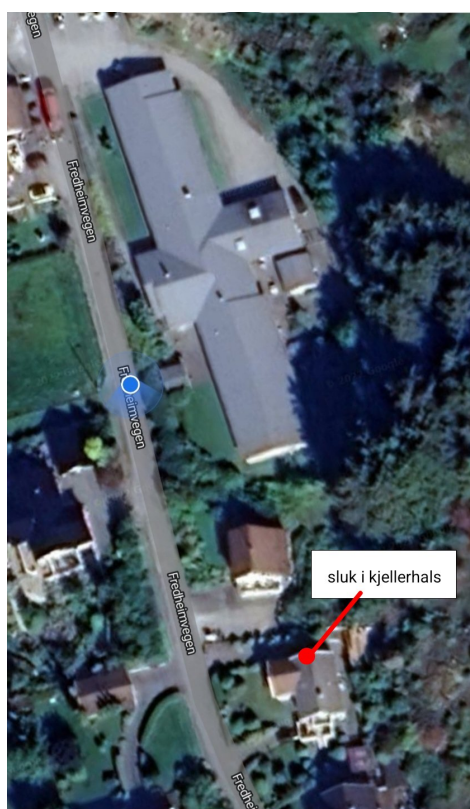

06.29 ons. 8. jun. Fredheimvegen 30 - Lagret

**Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger**

Navn:  
Eiendom (gnr/bnr): 10/37  
Adresse: Fredheimvegen 30


Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spyllt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spyllt	Ja	
5	Ledning groft - septiktank spyllt	Ja	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	Reuser ut i grunn
8	Fargeprøve fra skakvann?	Ja	Reuser ut i grunn
9	Fargeprøve fra dreisvann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhall og hvor er den koblet	Ja	Reuser ut i grunn
13	Er det sanifang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		Ut i grunn
17	Hvor er takvannet ført?		
18	Hvor er dreisvannet ført?		Ut i grunn
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ut i grunn

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier

Dato: 3/6-2022

Underskrift operatør: Kevin Andre Håland



Klikk her for å laste ned videofilen "Fredheimvegen\_30 (2).avi" ([https://admin.zapit.no/report/cd8dcef1-569b-4ebe-80cc-2a9c1dee605d/media/videodownload/41939a81b979240740992c59c51a0598b6386ca2.avi/Fredheimvegen\\_30%20%28%29.avi](https://admin.zapit.no/report/cd8dcef1-569b-4ebe-80cc-2a9c1dee605d/media/videodownload/41939a81b979240740992c59c51a0598b6386ca2.avi/Fredheimvegen_30%20%28%29.avi))
