



OPPDRAAG ID #KAH0007

JTR Gruppen  
tlf: 976 35 530  
www.jtrgruppen.no  
post@jtrgruppen.no

# Rapport

## Rørinspeksjon

**Utført** 2022-03-24

**Lokasjon** Vestre Karmøyveg 240, Sævelandsvik

**Kunde** Birkeland AS

**Kontakt** Glenn Roar

**Merking**

**Operatør** Kevin André Håland

**Til stede** Rune

**Bilder** [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/73469876-6e01-469b-b599-0063f220efb7/zipedImages\)](https://admin.zapit.no/report/73469876-6e01-469b-b599-0063f220efb7/zipedImages)

### Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.



# Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 ov

Dato <b>2022-03-24</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Glenn Roar</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Vestre Karmøyveg 240, Sævelandsvik</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Fra	Til	Retning <b>Motstrøms</b>			
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Værtype	Rørtype <b>Overvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

## Anmerkning

**Står vann enkelte plasser langs strekket**

1:577	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 ov		
	0,10m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	9,60m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	10,40m	VN4->30%	Vannivå, Gradering 4	4	
	15,70m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	18,00m	RE-KL12	Retningsendring, Kl 12		
	20,90m	IF	Inspeksjon fullført i rør ved hus		

## Konklusjon

# Foto fra Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 ov



SI 0,00m Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 ov




vestre karmøyvei 240  
fra rør i grøft 110mm ov

08:40:58 18-FEB-2022

0.00m


VN 0,10m Vannivå, Gradering 2

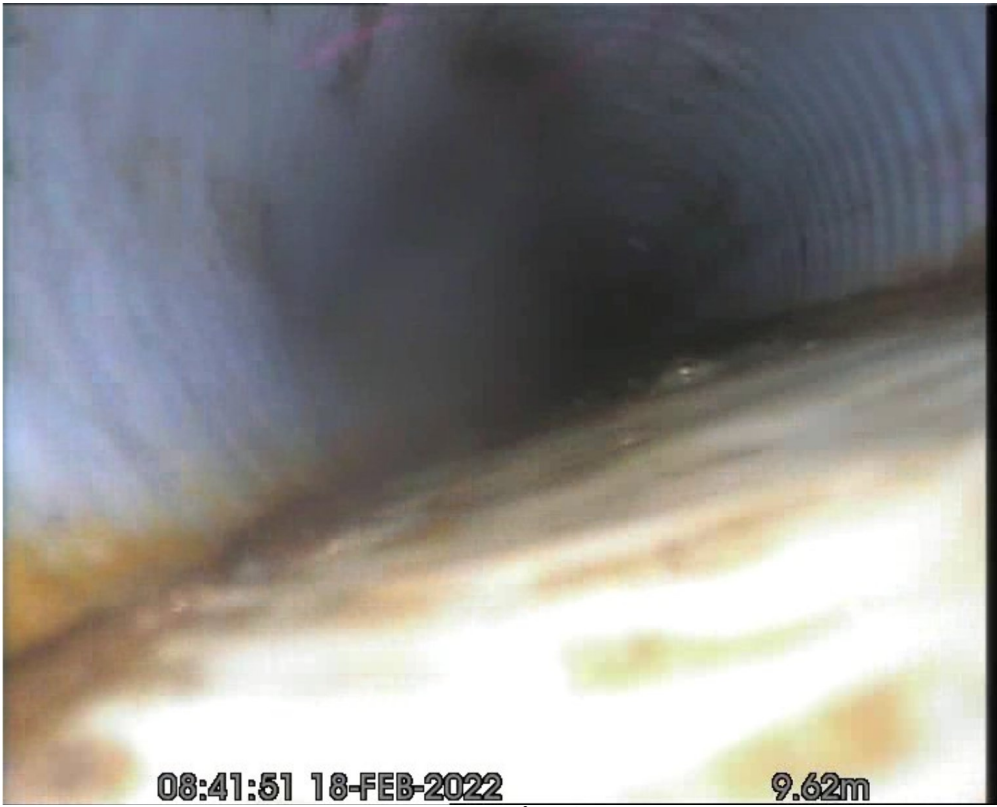

08:41:51 18-FEB-2022

9.62m

VN 9,60m Vannivå, Gradering 2

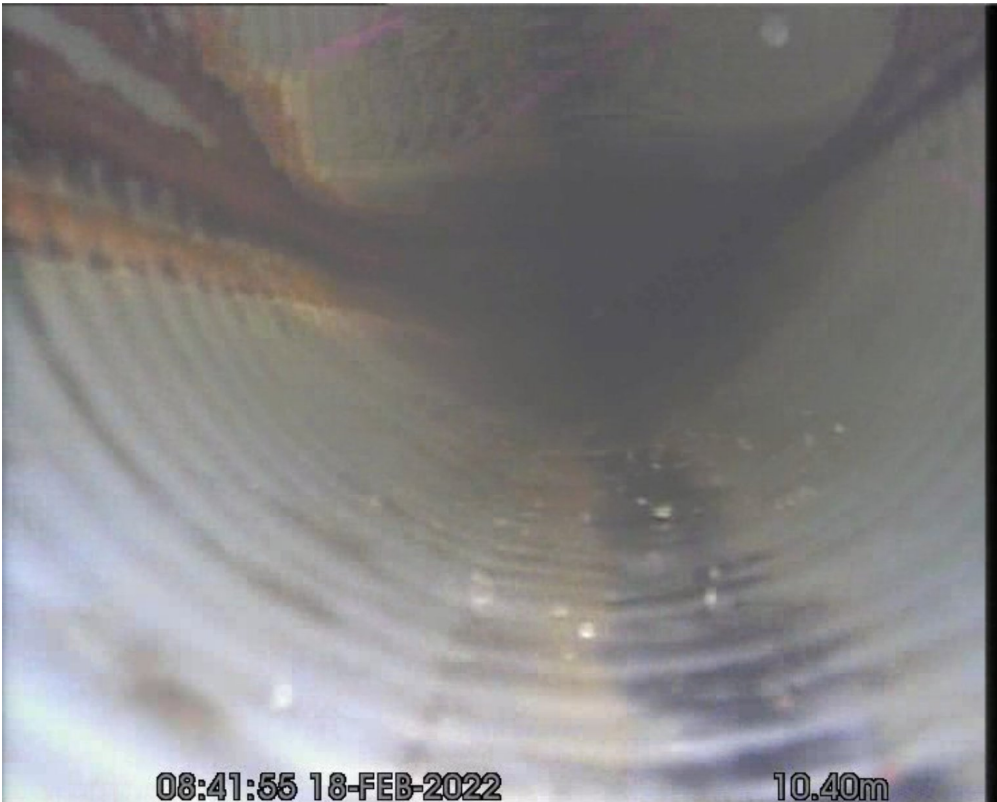

08:41:55 18-FEB-2022

10.40m

VN 10,40m Vannivå, Gradering 4





Sjekkliste ved kontroll av private kloakkledninger.

Gjelder: VESTRE KARØYVEG 240  
 Eiendom: gnr. 60 bnr. 40

Adresse: .....

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Resultat påført i rapport	
				Ja	Nei
1	Er det ført dialog med eier.		X		X
2	Er septiktanken lokalisert og klargjort		X		X
3	Er ledning mot huset spylt		X		
4	Er ledning nedstrøms sept.tank spylt	X			
4	Er ledning groft - septiktank spylt	X			
5	Er dykker på sept.tank satt på igjen		X		
6	Er det undersøkt hvor takvannet er ført		X		
7	Er det drenering rundt huset. (snakk med eier)		X		
8	Er det undersøkt hvor drens vannet er ført		X		
9	Er det undersøkt hvor avløp fra utv. sluker er ført		X		
10	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset		X		
11	Dersom ja: Er det undersøkt hvilket vann påkobl. fører		X		
12	Er det helt klart hvilken dimensjon det er på ledningen	X			
13	Er det helt klart hvilket materiale ledningen er av	X		X	
14	Er alle feil, skader, forskyvninger etc. funnet		X		
15	Er det sandfang med vannlås på eiendommen		X		
16	Er det tatt fargeprøve fra takvann		X		
17	Er det tatt fargeprøve fra slukvann		X		
18	Er det tatt fargeprøve fra drens vann		X		

Andre merknader:

Dato: 18/2-2022

KEVIN ANDRE HÅJANM  
 Underskrift operatør
