


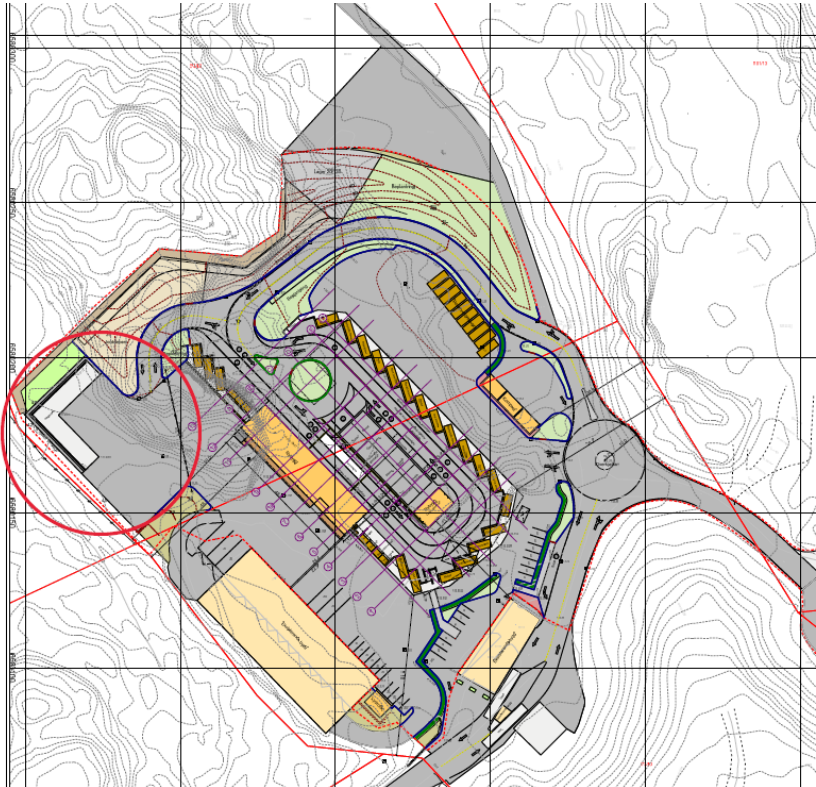

Møtereferat		ACOS dokument nr:	Side 1 av 2
Emne Referat fra tilbudsbehandling – Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen		Møtenr. 1	
Dato 22.03.23	Kl. 12-13.30	Lokasjon Borgaredalen miljøpark	
Referat ved Enrique Guerrero			
Deltakere Enrique Guerrero Kristoffer Sele Bjørnar Spissøy Fredrik Hansen Audun Haraldsen Thomas Bøe Egil Eike Vivoll Harald Næss		Rolle Prosjektleder – Karmøy kommune Byggeleder – Karmøy kommune Grunntrepreneur – Landmark maskin Veidekke Veidekke GL Prosjektservice I GANG Totalentreprenør I GANG Totalentreprenør	
Fraværende			
Kopi til			

Sak nr.	Kommentar
1.	<p>Betongdekke og mur til hageavfall – Denne skal ikke leveres av totalentreprenør.</p> 
2.	<p>Asfaltering av første lag blir utført i grunntreprise 1 som vist i asfalteringsplan. Totalentreprenør skal medta asfalt ihht asfalteringsplan.</p>
3.	<p>Byggetid er satt til 14 måneder. Det er beregnet at estimert byggetid er ca 12 måneder inkludert testing og innregulering. Det er lagt inn to ekstra måneder for å gi TE tid til å prosjektere, rigge seg til og gjøre seg kjent med byggeplassen.</p>
4.	<p>Byggestrøm – BH etablerer provisorisk strøm i området ihht vedlagt skisse «Provisorisk strøm Borgaredalen». TE får koble seg opp på Underfordeling 1 – 160A skap. Strømkostnad og leie for underfordeling 1 dekkes av BH. Resterende skap, kabler, arbeider m.m. som TE trenger for å drifte byggeplassen skal bekostes av TE.</p>
