


Strekkinspeksjon - 24.08.2023 - 24.08.2023 08:07:13

Dato 24.08.2023	Kamera	Avrenning	Lsid 24.08.2023 08:07:13	No 1
Prosjektnavn Ringenevegen Felles Extra	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil	Operatør Sindre Vassbrekke	Skadepoeng 1

By/Sted Ringenevegen	Oppstrøms Kum 7314	Rørlengde [m] 1 000
Adresse/Gate	Opp. kum type	Total lengde [l] 49,20
Overlate forhold	Nedstrøms Kum 7590	Inspeksjonsbil 49,20
Fra kart	Ned. kum type	Byggear
Diameter sirkulær 250mm -	Inspeksjonsformål	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor
Ledningstype Avløp felles	Inspeksjonsretning Motstrøms	Rengjøring Ikke rengjort
Renoveringsmetode:	Anmerkning/Generell kommentar	
Foringsmateriale:		
Rørmateriale Betong		


1:362	m +	Kode	Observasjon	Målenøyaktighet	MPEG	Foto	Grad	Vann
								
	0.00	SI	Start inspeksjon, 5%		00:00:00	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082	5 %	
	5.70	IR2	Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% av 12 Kl. til 1 Kl.		00:00:50	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082	2,00	5 %
	12.20	IR4	Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mer enn 30 % av 11 Kl. til 1 Kl.		00:01:50	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082	4,00	5 %
	13.30	TK-IT	Tilkobling. Innhugget tilkobling på 3 Kl.		00:02:21	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082		5 %
	13.90	IR2	Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% av 9 Kl. til 11 Kl.		00:02:41	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082	2,00	5 %
	30.10	IR2	Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% av 1 Kl. til 3 Kl.		00:06:03	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082	2,00	5 %
	33.20	IR2	Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% på 10 Kl.		00:06:27	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082	2,00	5 %
	49.20	IF	Inspeksjon fullført		00:08:21	24.08.2023 080713_7314 _7590_24082		5 %

Strekkbilder - 24.08.2023 - 24.08.2023 08:07:13

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
	Ringelvegen	24.08.2023	24.08.2023 08:07:13	1



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_002.jpg,
00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 5%

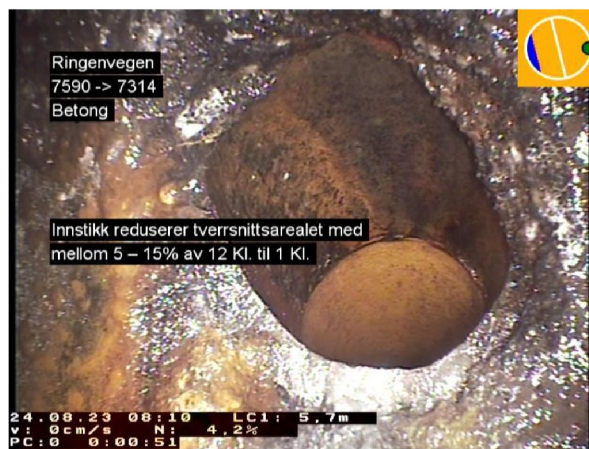

24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_003.jpg,
00:00:50, 5.70m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% av 12 KI. til 1 KI.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_004.jpg,
00:01:50, 12.20m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mer enn 30 % av 11 KI. til 1 KI.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_005.jpg,
00:02:21, 13.30m
Tilkobling. Innhugget tilkobling på 3 KI.

Strekkbilder - 24.08.2023 - 24.08.2023 08:07:13

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
	Ringelvegen	24.08.2023	24.08.2023 08:07:13	1



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_006.jpg, 00:02:41, 13.90m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% av 9 Kl. til 11 Kl.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_007.jpg, 00:06:03, 30.10m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% av 1 Kl. til 3 Kl.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_008.jpg, 00:06:27, 32.20m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% på 10 Kl.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_009.jpg, 00:08:21, 49.20m
Inspeksjon fullført
