

## Sluttbefaring Lyngvegen

Prosjekt: 24359 Stangaland Skole og  
Stangalandshallen - **LYNGVEGEN**

Byggherre: Karmøy kommune

Ifbm overtagelse 08.04.2022 ble det avtalt separat sluttbefaring av uteområdet når fallunderlaget er komplett utført.

Sluttbefaring utført  
Deltagere

20.03.2023

**Karmøy kommune:**

Jan Arvid Sandvik

Elin Therese Storesund

Berit Thuestad

Knut Sunnanå

Roy Magne Mikalsen

Kurt Sunnanå

**Kruse Smith:**

Geir Arne Hilt

**Birkeland:**

Arvid M Hetland

**Teqva/ Rønning:**

Roar Sæbø

## Saker med aksjoner

### 1. Asfaltanalyser er ikke tatt.

5 stk borreprøver planlagt tatt 20.03.2023 og sendes Vegteknisk institutt for analyse. BH ønsker å bidra i dialogen dersom analyser forsinkes. Forbehold om tiltak dersom prøvene ikke viser tilfredsstillende resultat.



Aksjon Birkeland



Frist 28.04.2022

### 2. Flere asfaltskjøter er ikke tilfredsstillende.

Påvist flere steder langs Lyngvegen, både helt vest og helt øst, samt på fortau ved fv.511

Aksjon Birkeland

Frist 28.04.2023

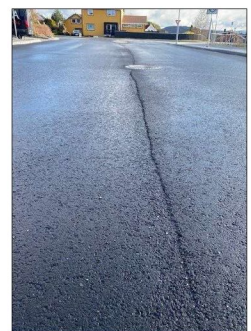

3. **Kumløkk fjernes – samt i såing.**  
Helt vest.

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023



4. **Pukk ved g/s vei stampes/ fjerner asfaltrester.**

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023



5. **Ved x Bårastemvegen/ Lyngvegen må det legges nytt kumløkk med blå pakning samt rengjøre kum/ løkk – og merking av private stikk.**

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023



6. **Bårastemvegen østre vegkant fylles mer vegggrus – samt fjerne forurensing/ granulat på bakken**

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023

7. **Sjekk asfaltfylling langs kummer, påvist flere steder.**

Eksempel kum 30767, 30766 og 30780.

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023



8. **Innmåling av vegmerking fv.511 ikke oversendt.**  
FDV er følgelig ikke godkjent av Rogaland Fylkeskommune

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023

---

9. **Asfalt kvalitet x Gulatjødnvegen – Lyngvegen må utbedres.**

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023



10. **Vannkum Bårastemvegen mangler blå pakning samt plugges 2 stk serviceventiler.**

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023

---

11. **Asfaltklumper kryss og veibane ved kryss Lyngvegen/o\_KV04 må fjernes.**  
Asfaltleverandør kan komme med forslag til tiltak.

Aksjon Birkeland  
Frist 28.04.2023
