

20.01.2023

Beliggenhetskontroll av: Gnr: 12 Bnr: 78 Kommune: Karmøy

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta


UTSTYR / PROGRAMVARE

- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING

Innmålt, As-built

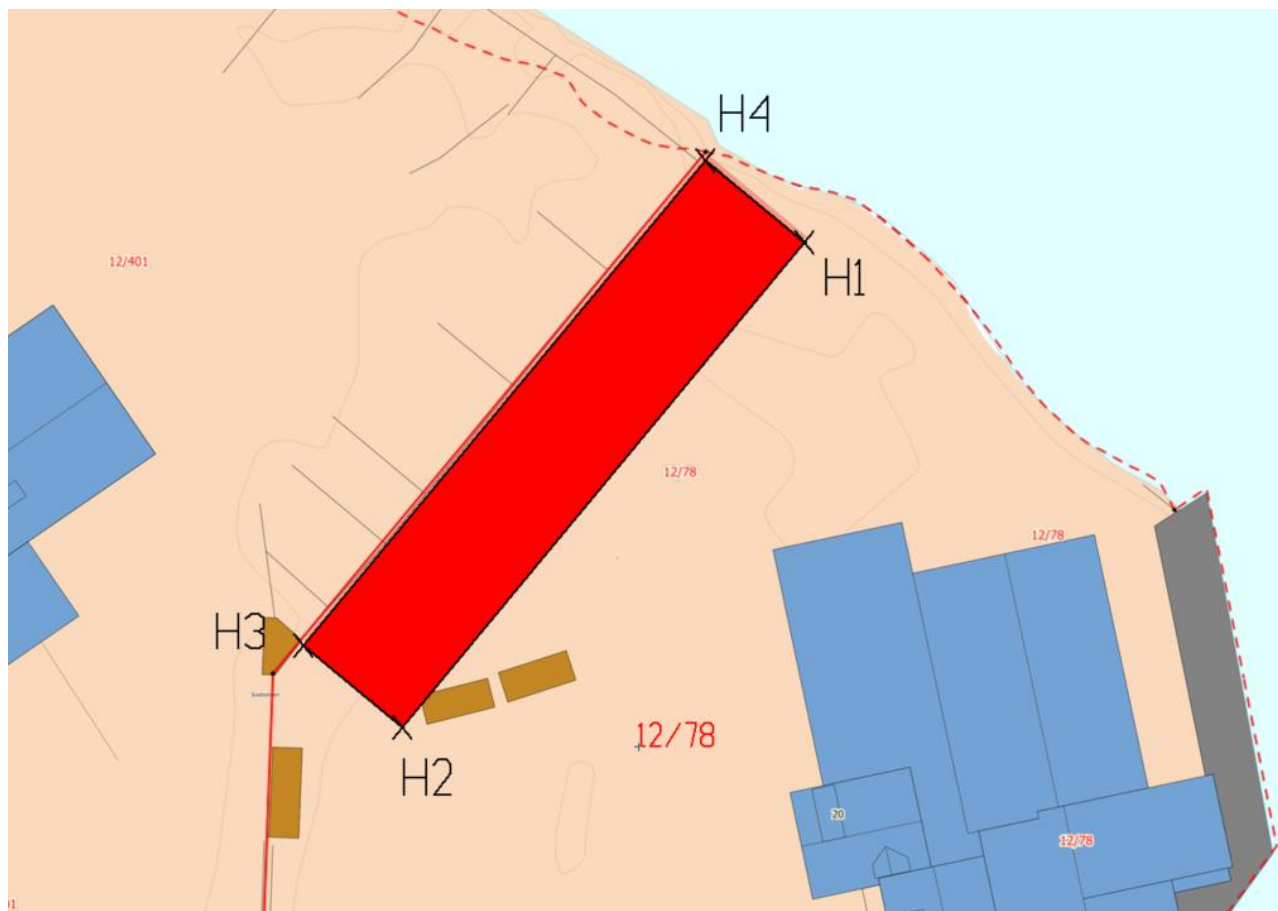

Id	Øst	Nord	Høyde	OBJTYPE
H1	283089,234	6576434,870	1,90	Grunnmur
H2	283054,737	6576393,282	1,90	Grunnmur
H3	283046,270	6576400,305	1,90	Grunnmur
H4	283080,766	6576441,891	1,90	Grunnmur
