

# Opptaksprotokoll

Dato 02.09.2022  
Opptak 110mm medstrøms grøft

Foto 001

Video 00.00.04

Fjerning 0,00 m

Start



Foto 002

Video 00.00.46

Fjerning 7,00 m

Deformasjon



# Opptaksprotokoll

Dato 02.09.2022  
Opptak 110mm medstrøms grøft

Foto 003

Video 00.01.31  
Fjerning 11,40 m

Kum?

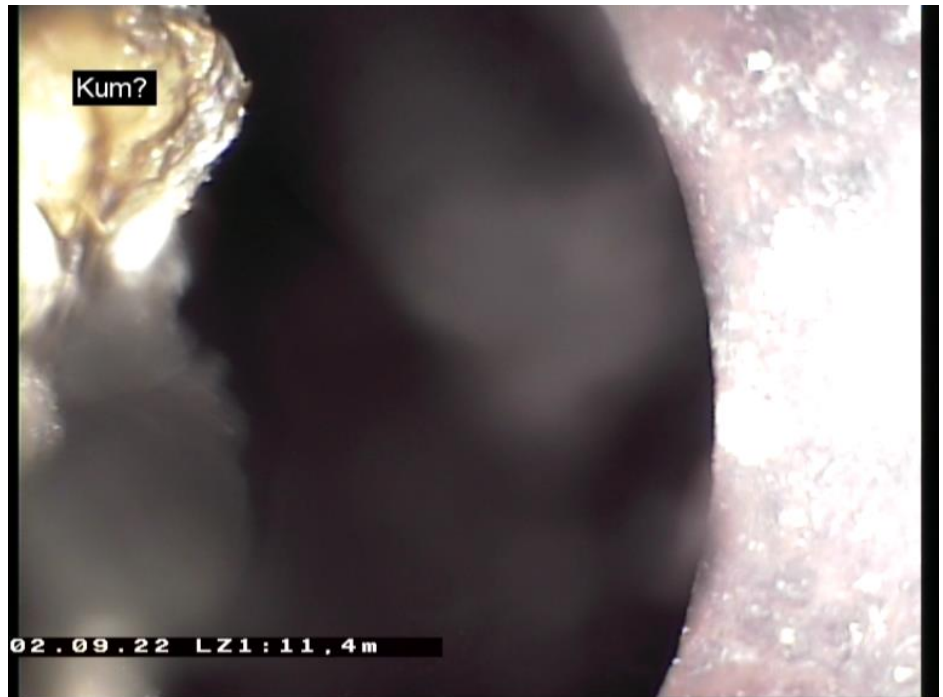


Foto 004

Video 00.02.08  
Fjerning 11,40 m

Avbrutt kommer ikke lengre pga renne forskjøvet i kum

