


# Privat spillvannsstikk – 64/258



## Stikkledning 1

Betongrør. Dårlig stand med røtter i skjøter og mye opphopning. Tyder på lekkasjer i på rør.

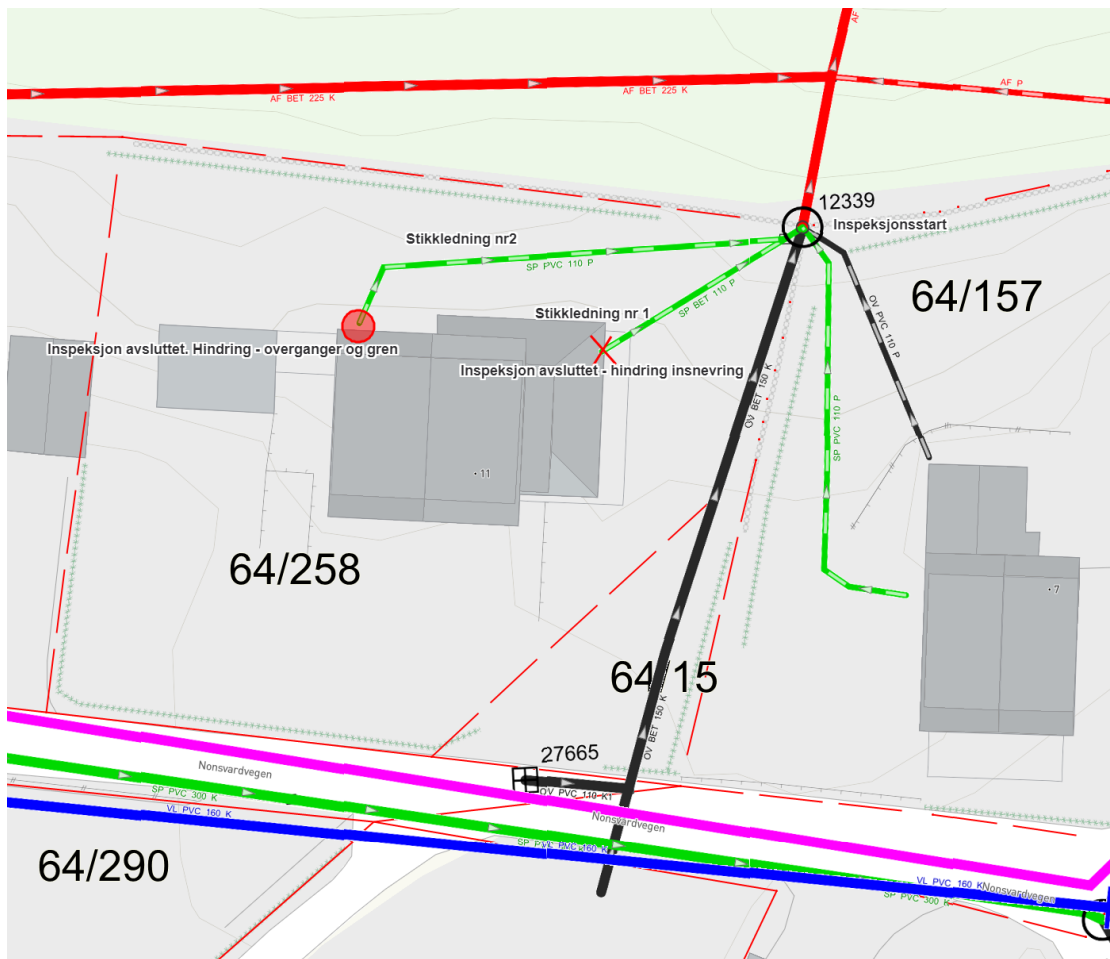

Bilde fra tidligere rørinspeksjon: PVC innstukket 14, 5m fra kum - under garasjeggulv.



## Stikkledning 2

Innstukket PVC på «stikkledning 1» rett ved kum. Ingen feil på rør. Påstikk og grenrør under hus - alt i PVC.

