






Karmøy kommune





Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: KTBG0155 Saksnummer: 2022/10299

Foretak

-  VEDAVÅGEN RØR AS
Org.nr: 985207844
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN
-  **Kontakt**
Glenn Helge Thomsen
-  **Telefon**
52 81 57 33
-  **Mobil**
52 81 57 33
-  **Epost**
post@vedavagenror.no

Kontaktperson

-  Vedøy Sverre
-  **Telefon**
95931132
-  **Telefon**
95931132
-  **Epost**
sverre@vedavagenror.no





Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Bleikmyrvegen 42
-  **Gårds- og bruksnummer**
5/546
-  **Bygningsnummer**
300038112
-  **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

-  Vedøy Invest As
Postboks 35
4295 Veavågen
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Mobil**
-
-  **Epost**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
-  **Bygningstype**
Industribygg
-  **Beskrivelse av tiltaket**
Utvidelse av bygget-og asfaltering av deler av utearealet på tomt 5/69
-  **Type arbeid**
Overvann, utvendig

Beskrivelse av stikkledninger



Overvann

Utskifting av ledning

Tilkobling

Gren (GRN)

Kobles til ledning av type OV BET på 400 mm

Utvendig utstyr

● Drenskum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Drensledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,
Eier: Privat (bygningseier)



Drensledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,
Eier: Privat (bygningseier)



Kommentar

Tekst: ov kumme



Konstruksjon

Beskrivelse: fordrøyningsmagasin




Stikk overvann

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2008

Skisse



Generert skisse

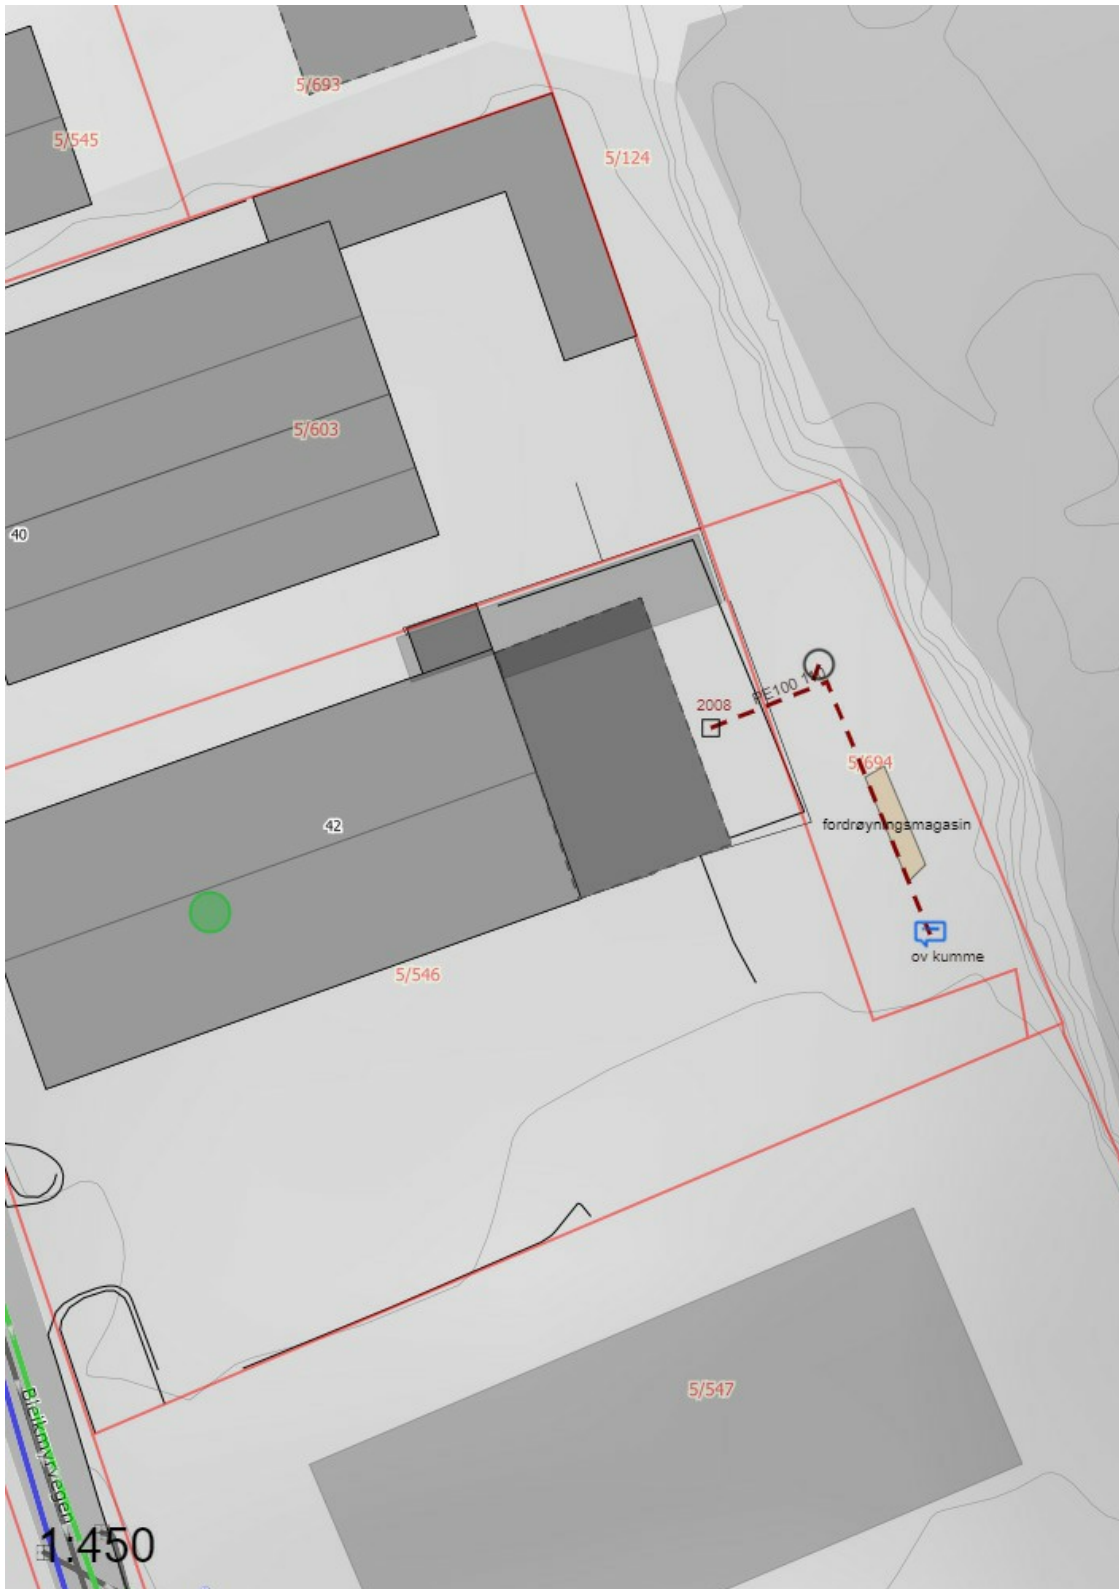

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.




SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding


 Filer (0)


-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Det er gjort endringer i tilkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato overvann
09.03.2023

 Tilleggsopplysninger

-
