






# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: GFBX8607 Saksnummer: 2023/6787

### Foretak

-  RØRMESTER KOMPANIET AS  
Org.nr: 924655429  
Kari Trestakkvegen 4  
5538 HAUGESUND
-  **Kontakt**  
Hans audun Aase
-  **Telefon**  
51211770
-  **Mobil**  
51211770
-  **Epost**  
Service@rormesterkompaniet.no

### Kontaktperson

-  Aase Hans audun
-  **Telefon**  
96625900
-  **Telefon**  
96625900
-  **Epost**  
hans.audun@rormesterkompaniet.no

### Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**  
Fosnavegen 171
-  **Gårds- og bruksnummer**  
108/10
-  **Bygningsnummer**  
0
-  **Bolignummer**




### Eier/tiltakshaver

-  **Navn**  
Tollaksen Kjersti
-  **Adresse**  
Øvrebøvågen 19, 5561 Bokn  
NORGE

### Nytt bygg

-  Fritidsbolig

### Arbeid utført

-  **Type tiltak**  
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
-  **Bygningstype**  
Fritidseiendom
-  **Beskrivelse av tiltaket**  
Ny pumpestasjon fra fritidsbolig tilkobles eksisterende pumpe ledning som ligger fram til tomt. 40 mm PE
-  **Type arbeid**  
Spillvann, utvendig

## Påkoblinger

---



### Spillvann

Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)

Påkoblingspunkt på ledning

Påkobling:

connectionPointType\_KJERN (KJERN) #44049

Kommunal ledning:

Spillvann pumpeledning (SPP) PE 75mm #37214

## Utvendig utstyr

---

### ● Pumpestasjon (o)

Material: PP polypropylen, Beregnet kapasitet: 4l/s, Løftehøyde: 2m, Kumbredde: 710mm,

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm , Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvann pumpeledning


Dimensjon: 40mm, Materiale: Polyet. uspes , Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm , Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse

Kartskisse med tegnforklaring - 108/10 Fosnavegen 171

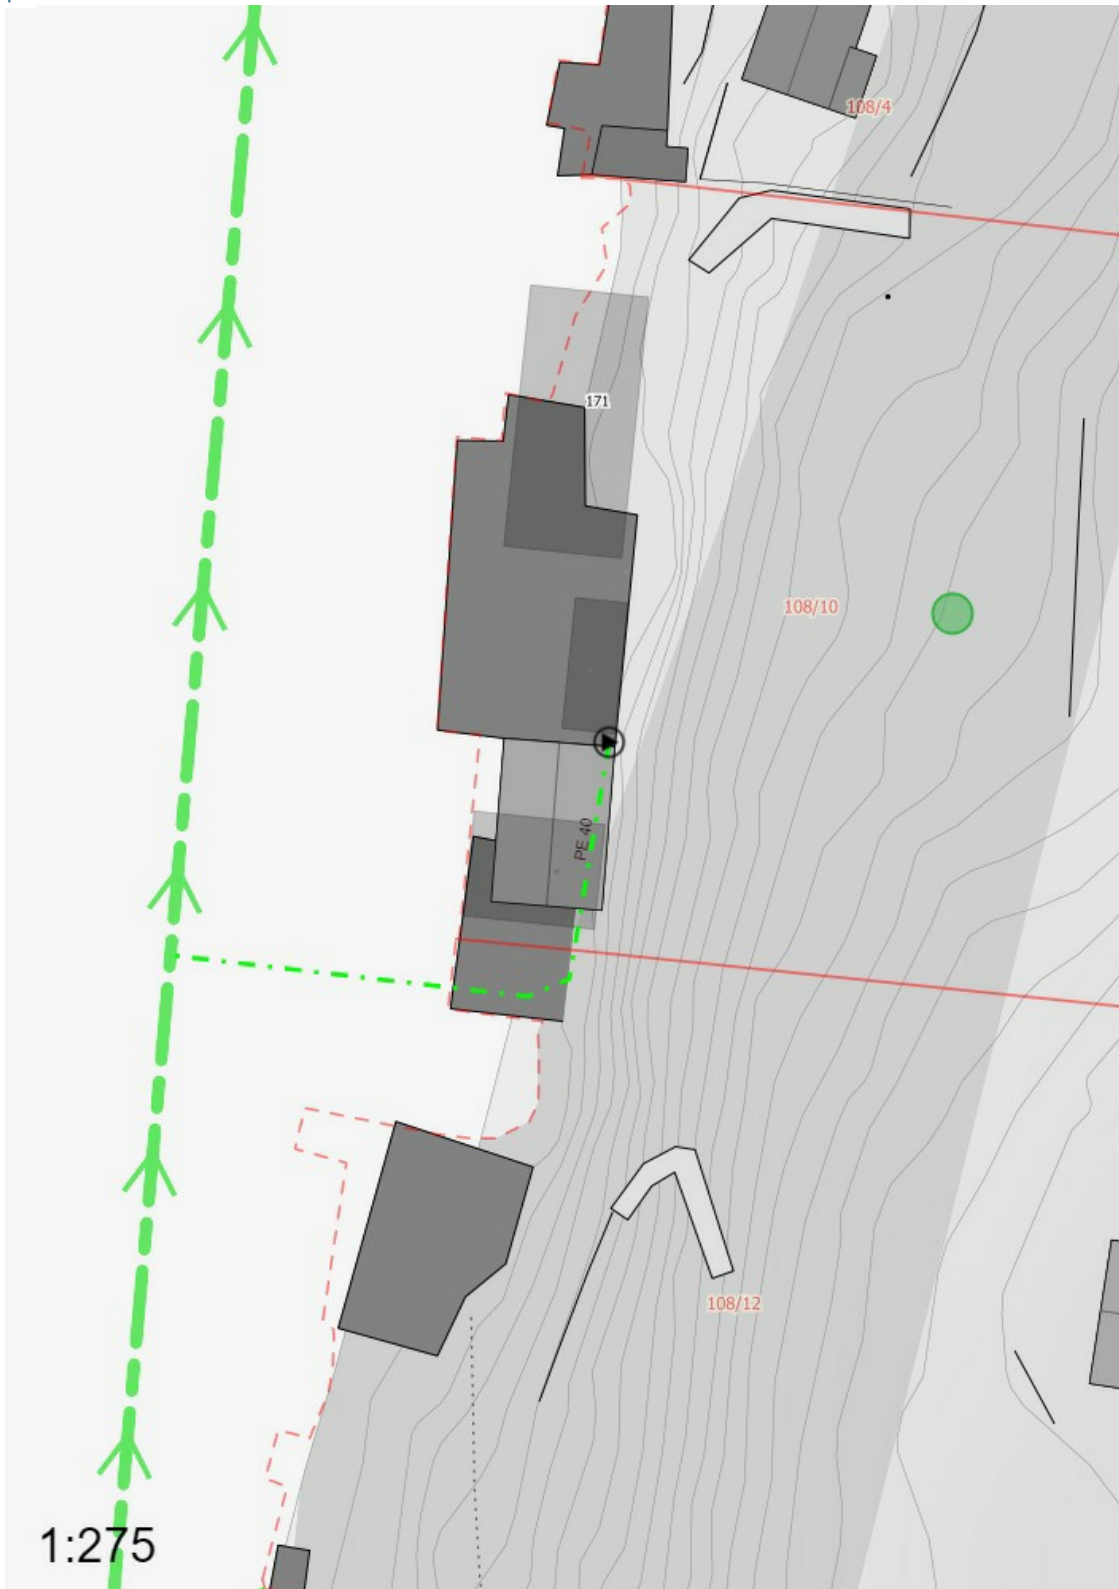

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Sluttdokumentasjon - 108/10 Fosnavegen 171

## Vedlegg til ferdigmelding

---



Filer (1)

Kjersti tollaksen.pdf



Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---



Ferdigstillingsdato spillvann

01.05.2023



Tilleggsopplysninger

-
