

# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: CLTQ3798 Saksnummer: 2023/1196


### Foretak

 HERVIK RØR AS  
Org.nr: 987487283  
Hervikneset 45  
5566 HERVIK

 **Kontakt**  
Lars Ove Løkken

 **Telefon**  
52774790

 **Mobil**  
52774790

 **Epost**  
post@hervik.no

### Kontaktperson

 Hervik Erik

 **Telefon**  
48017960

 **Telefon**  
48017960

 **Epost**  
erik@hervik.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Årabrotvegen 32


 **Gårds- og bruksnummer**  
13/318

 **Bygningsnummer**  
0

 **Bolignummer**

 **Andre opplysninger**  
Tett tank 4m3 på avløp. Vannledning fra nærliggende kum, delvis oppe i dagen med varmekabel


### Tiltakshaver

 **Organisasjonsnummer**  
979729332

 **Foretaksnavn**  
GL PROSJEKTSERVICE AS

 **Adresse**  
Fotvegen 12, 4250 KOPERVIK

### Midlertidig/ingen bygning

 Brakkerigg ifb med bygging av nytt avløpsrenseanlegg

 Tett tank 4m3 på avløp. Vannledning fra nærliggende kum, delvis oppe i dagen med varmekabel

## Arbeid utført



### Type tiltak

Midlertidig påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg



### Bygningstype

Brakkerigg



### Beskrivelse av tiltaket

Brakkerigg ifb med nytt kloakkrenseanlegg.  
Tett tank 4m3 på avløp.



### Type arbeid

Vann, utvendig



### Tiltakets planlagte varighet

Oppstartsdato  
07.02.2023

Ferdigdato  
29.02.2024

## Påkoblinger



### Vann

Nytt påkoblingspunkt (kommunalt nett)

#### Påkobling:

connectionPointType\_MRI (MRI)

#### Kommunal ledning:

Vannledning (VL) PE 180mm #36913

## Utvendig utstyr



### Kommentar

Tekst: tett 4m3 tank



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning


Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens (PE100), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse

Kartskisse med tegnforklaring - 13/318 Årabrotvegen 32

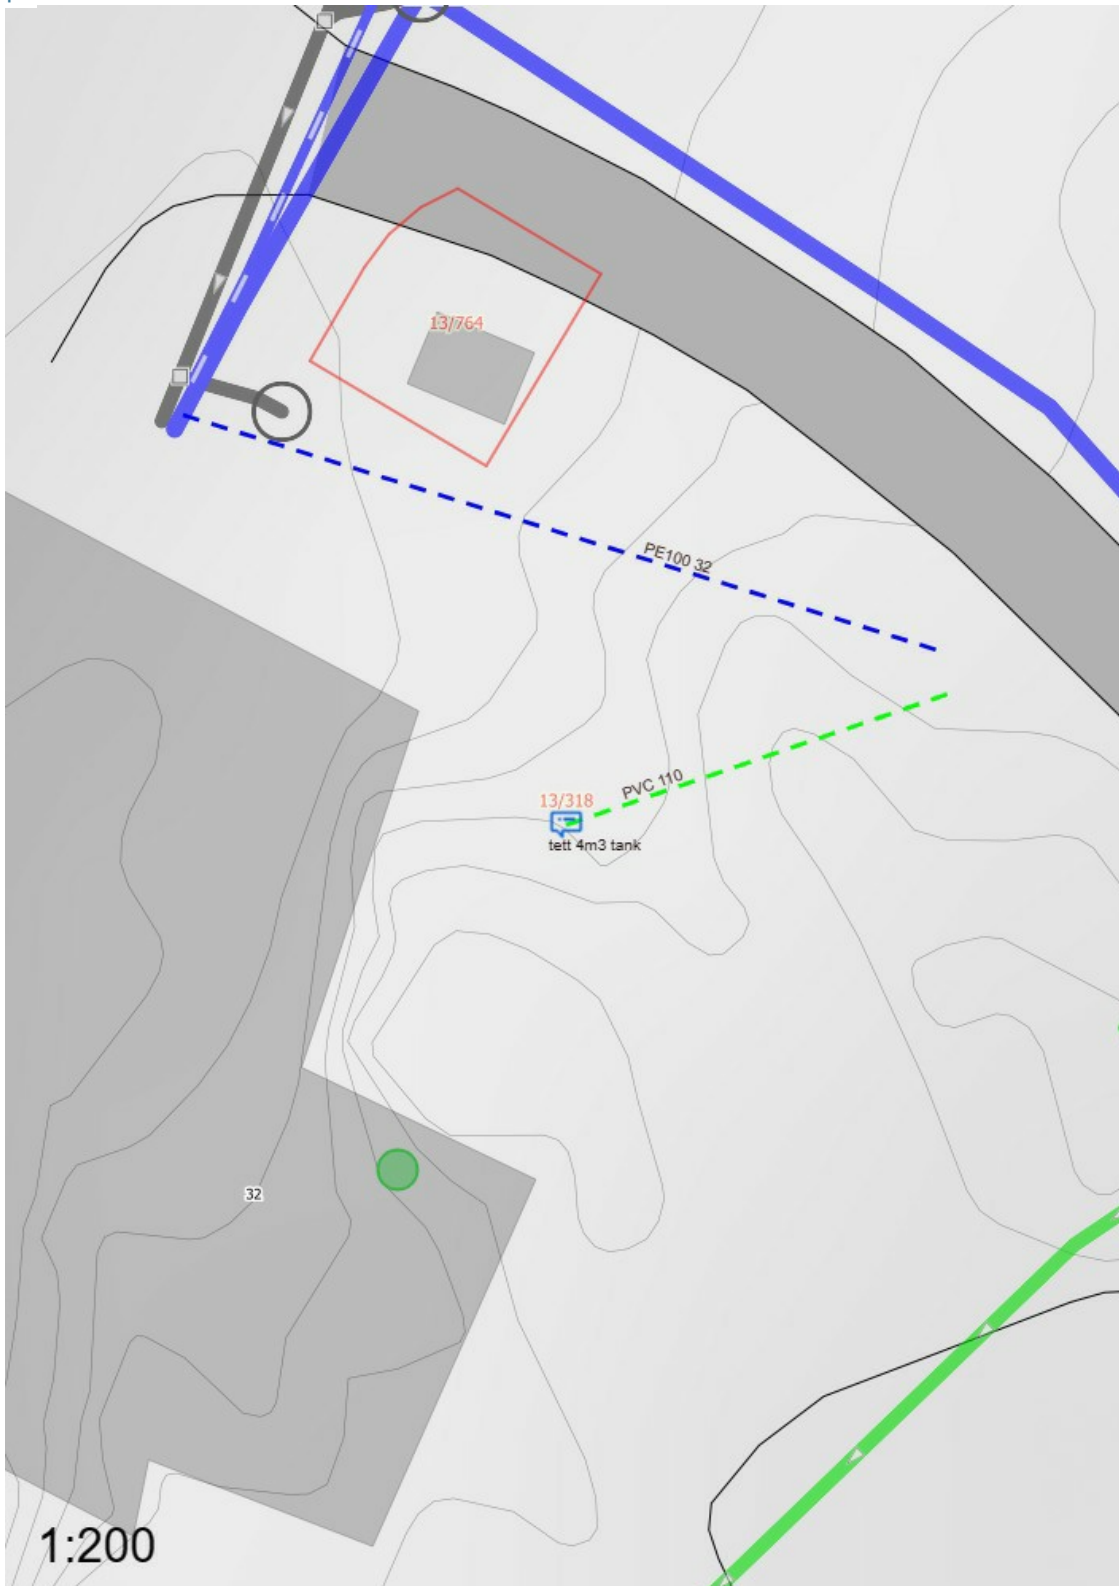

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Sluttdokumentasjon - 13/318 Årabrotvegen 32

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---

 Ferdigstillingsdato vann  
22.12.2023

 Tilleggsopplysninger

-
