

Ole Bjørn Lindland

Fra: Torbjørn Jektnes <torbjorn.jektnes@rogfk.no>
Sendt: onsdag 9. november 2022 12:44
Til: Sondre Veum; Ingrid Tau Strand Oanes
Kopi: Mads Nedersee
Emne: SV: Prosjekttert underlag for støttemur

Støttemuren er ok. Godkjenner den

Trenger ikke å endre mur tegningen for min del.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Jektnes

Prosjektleder samferdsel,
Drift og vedlikehold nord Rogaland

M + 47 476 85 964

www.rogfk.no



Rogaland
fylkeskommune

Fra: Sondre Veum <sondre@akgranheim.no>
Sendt: onsdag 9. november 2022 11:16
Til: Torbjørn Jektnes <torbjorn.jektnes@rogfk.no>; Ingrid Tau Strand Oanes <ingrid.tau.strand.oanes@rogfk.no>
Kopi: Mads Nedersee <man@washworld.dk>
Emne: SV: Prosjekttert underlag for støttemur

Hei og takk for tilbakemelding.

Jeg har videresendt tilbakemeldingen din til B-Consult som tegner for oss.

Så de er i gang med og tegne om plasseringen av rekkverket.

Det helt riktig at muren blir i betong. Stablestein er kun i ark tegning. (men jeg kan få fjernet dette om du ønsker).?

Spørsmål:

Er det en mulighet for og få godkjent støttemuren mens vi tegner om autovern? Slik at vi kan få begynt på denne?

Med vennlig hilsen



Sondre Veum

Prosjektleder

Brosjyre: [LINK](#)

Tlf: + 47 67 97 80 90
Mob: + 47 46 42 38 22
Faks + 47 67 97 80 91
E-mail: sondre@akgranheim.no

Fra: Torbjørn Jektnes <torbjorn.jektnes@rogfk.no>
Sendt: onsdag 9. november 2022 09:15
Til: Ingrid Tau Strand Oanes <ingrid.tau.strand.oanes@rogfk.no>
Kopi: Sondre Veum <sondre@akgranheim.no>
Emne: SV: Prosjektert underlag for støttemur

Hei


Har sett på tegningene nå. Har noen kommentarer:

- Jeg ser at det er en misforståelse mtp plassering av rekkverk. Rekkverk skal plasseres inntil veg, så kreves det 400mm skulder/innfestingsbredde for å støtte rekkverket, deretter kan grave skråning starte.
- Tekst i A411 er feil. Rekkverk skal følge veg frem til knekk så føres ut, og støttemuren er 1600mm fra rekkverk hele vegen slik jeg leser tegningen B-102 støttemur. Mtp på punktet ovenfor så er det feil med 1600mm fra rekkverk. Skal være 2000mm fra rekkverk/veg.
- Regner med det er feil i samme tekst som beskriver støttemur i granitt (tegning A411)?? Forstår det slik at støttemur skal støpes i betong mtp. tegning B201 og B102.
- Tegning A119 er misvisende med inntegnet blokker hvis støttemuren skal støpes.
- Er det beskrevet hvordan rekkverk skal avsluttes i hver ende?
- B-201 henviser til en tegning B-101 den er ikke vedlagt.

Skisse som viser plassering av rekkverk fra håndbok N101:


Krav 4.2.2—4 **SKAL**

Rekkverket skal ha en innfestingsbredde på $\geq 0,4$ meter innenfor rekkverk 1. Ved utskiftning av rekkverk eller montering av nye rekkverk på eksisterende ekspl. som ikke endres, kan krav til innfestingsbredde avvikes etter en trafiksikkerhets- og sikkerhetsavbøtende tiltak skal vurderes.

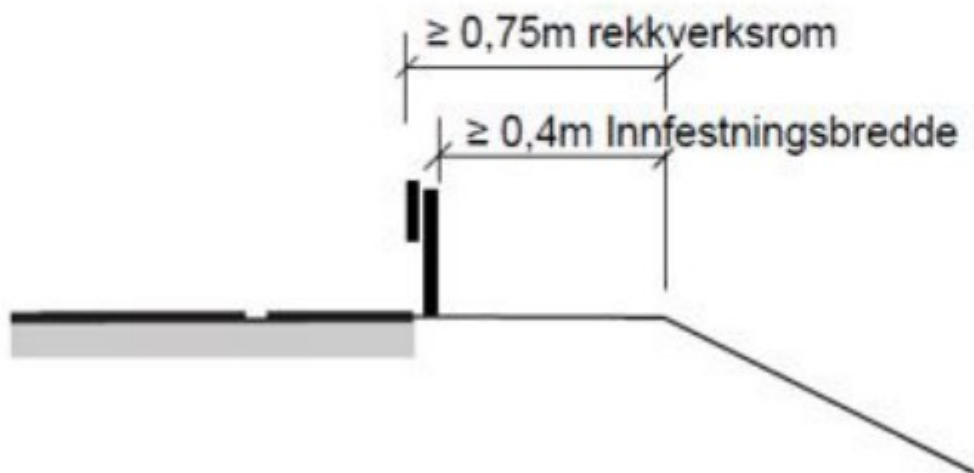

Figur 4.2.2—1 — Krav til plassering av rekkverk i rekkverk

Deres skisse med rekkverket feil plassert:

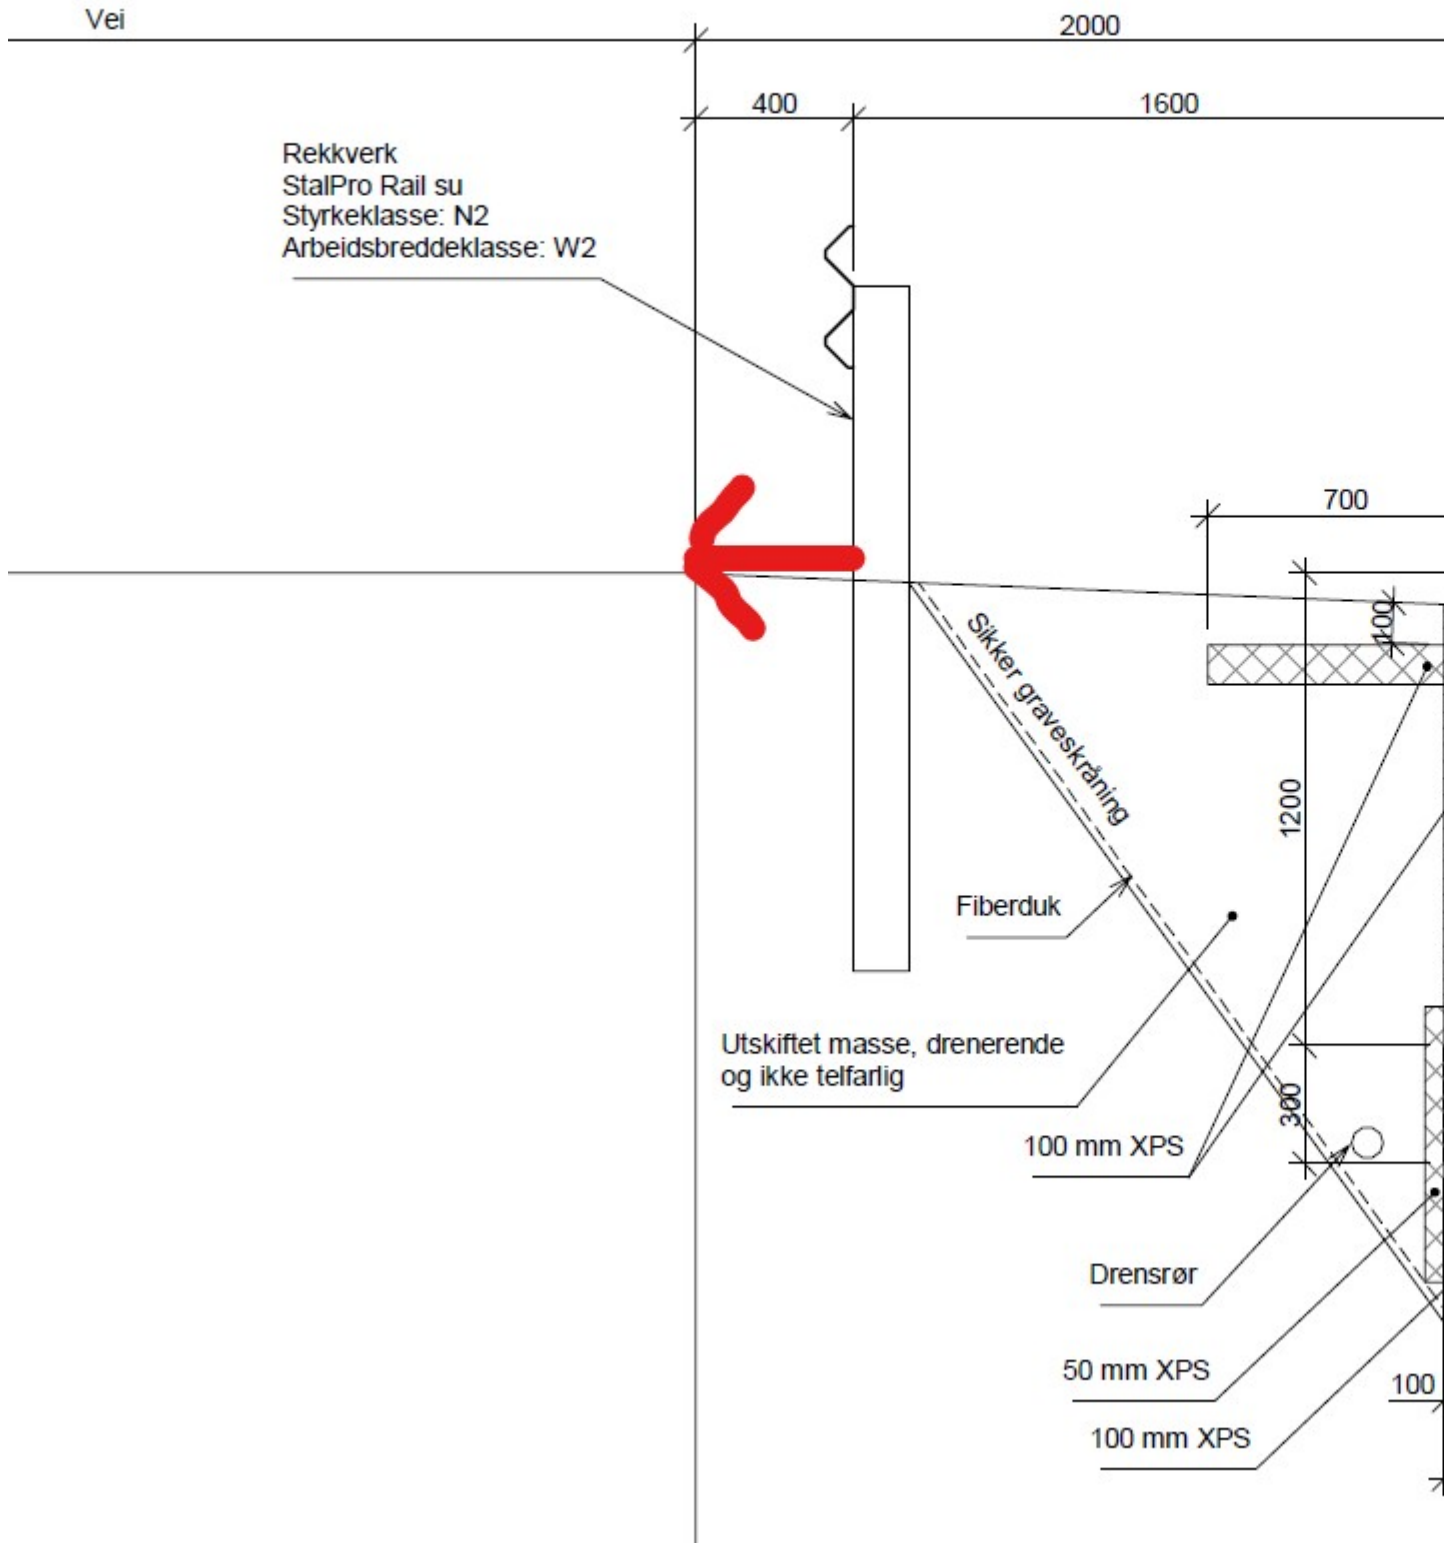

Med vennlig hilsen

Torbjørn Jektnes

Prosjektleder samferdsel,
Drift og vedlikehold nord Rogaland

M + 47 476 85 964

www.rogfk.no



Rogaland
fylkeskommune

Fra: Ingrid Tau Strand Oanes <ingrid.tau.strand.oanes@rogfk.no>

Sendt: fredag 4. november 2022 09:58

Til: Torbjørn Jektnes <torbjorn.jektnes@rogfk.no>

Kopi: Sondre Veum <sondre@akgranheim.no>

Emne: VS: Prosjektert underlag for støttemur

Torbjørn. Kan du se på dette så fort du har anledning?

Fra: Sondre Veum <sondre@akgranheim.no>

Sendt: onsdag 2. november 2022 18:06

Til: Ingrid Tau Strand Oanes <ingrid.tau.strand.oanes@rogfk.no>

Kopi: Gjertrud Eskevik Hestvik <gjertrud.eskevik.hestvik@rogfk.no>; Mads Nedersee <man@washworld.dk>; Michael Rask <mra@washworld.no>

Emne: Prosjektert underlag for støttemur

Denne e-posten kommer fra en ekstern avsender. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner avsenderen og vet at innholdet er sikkert.

Hei.

Sender her over prosjekter underlag for støttemur og autovern.

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål angående underlag 😊

Har et sterkt ønske om at dette kan godkjennes denne uken slik at vi kan bestiller materialer og påbegynne arbeidet så fort som mulig.

Anlegget skal åpne om 4 uker om alt går etter planen.

Med vennlig hilsen



Sondre Veum

Prosjektleder

Brosjyre: [LINK](#)

Tlf: + 47 67 97 80 90

Mob: + 47 46 42 38 22
Faks + 47 67 97 80 91
E-mail: sondre@akgranheim.no

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.
