



OPPDRAG ID #KAH8053

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-03-24

Lokasjon Fredheimvegen 23, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/285afb18-3734-4e0f-9e7e-61a044847046/zipedImages\)](https://admin.zapit.no/report/285afb18-3734-4e0f-9e7e-61a044847046/zipedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.

Innhold:

[Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23](#)

[Fra stikk i rør mot fredheimvegen 23](#)



Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 23, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Står vann enkelte plasser langs strekket. Punktdeformasjon på 21,3 meter

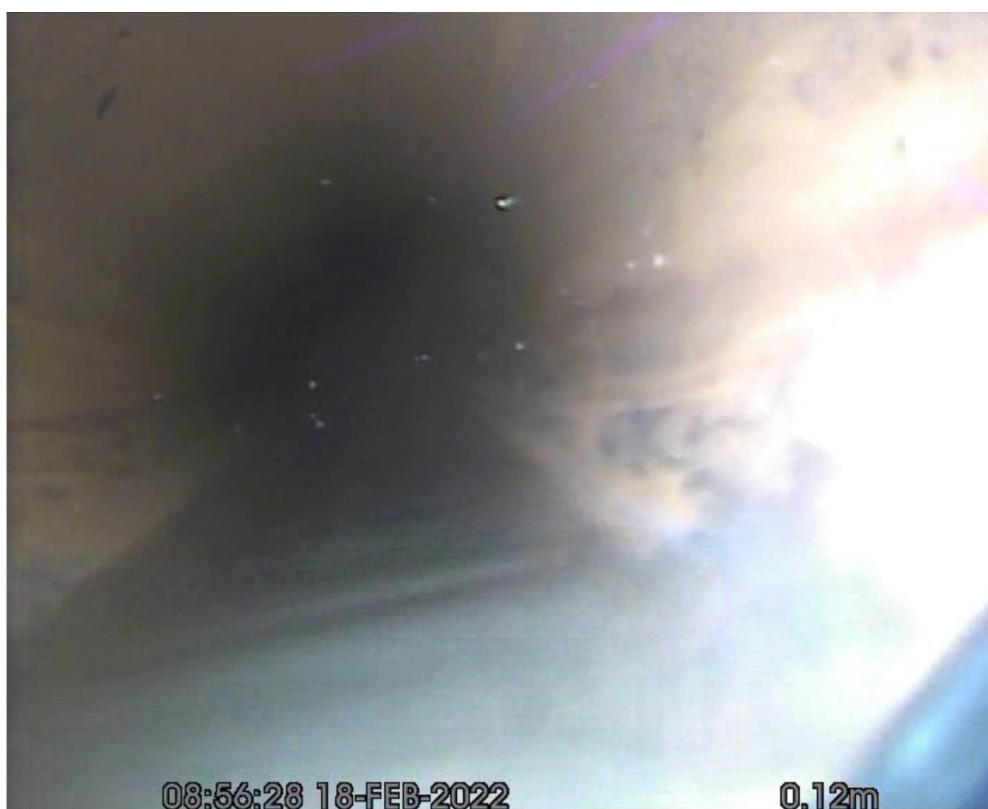
1:828	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23		
	0,10m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 9		
	0,20m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	16,90m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 12		
	21,30m	DF2-P	Deformasjon, Gradering 2, Type: Punkt, Kl 10-1	2	
	24,50m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
30,00m	IA	Inspeksjon avbrutt klarte ikke stake lenger			

Konklusjon

Foto fra Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23



SI 0,00m Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23



08:56:28 18-FEB-2022

0.12m

VN 0,20m Vannivå, Gradering 2



08:57:50 18-FEB-2022

21.35m

DF 21,30m Deformasjon, Gradering 2, Type: Punkt, KI 10-1



08:58:01 18-FEB-2022

24.48m

VN 24,50m Vannivå, Gradering 2



Sjekkliste ved kontroll av private kloakkledninger.

Gjelder: _____
 Eiendoms: gnr. 10 bnr. 42
 Adresse: Fresheimvegen 23

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Resultat påført i rapport	
				Ja	Nei
1	Er det ført dialog med eier.				
2	Er septiktanken lokalisert og klargjort	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Er ledning mot huset spylt	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Er ledning nedstrøms sept tank spylt	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Er ledning grovt - septiktank spylt	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Er dykker på sept tank satt på igjen	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Er det undersøkt hvor takvannet er ført	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Er det drenering rundt huset (snakk med eier)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Er det undersøkt hvor dreneringsnett er ført	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Er det undersøkt hvor avløp fra utv. sluker er ført	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset				
11	Dersom ja: Er det undersøkt hvilket vann påkobl. fører				
12	Er det helt klart hvilken dimensjon det er på ledningen				
13	Er det helt klart hvilket materiale ledningen er av	<input checked="" type="checkbox"/>			
14	Er alle feil, skader, forskyvninger etc. funnet	<input checked="" type="checkbox"/>			
15	Er det sandfang med vannlås på eiendommen				
16	Er det tatt fargeprøve fra takvann	<input checked="" type="checkbox"/>			
17	Er det tatt fargeprøve fra slukvann	<input checked="" type="checkbox"/>			
18	Er det tatt fargeprøve fra dreneringsnett	<input checked="" type="checkbox"/>			



Andre merknader:

Dato: 24/3-2022
KEVIN ANDRE HALVÅG
 Underskrift operatør

Fra stikk i rør mot fredheimvegen 23

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 23, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

1:686	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra stikk i rør mot fredheimvegen 23		
	17,80m	IF	Inspeksjon fullført ved ters		

Konklusjon

Foto fra Fra stikk i rør mot fredheimvegen 23



SI 0,00m Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23 ov stik

SI 0,00m Fra stikk i rør mot fredheimvegen 23
