



Nonsvarden stikkledninger 64/157

Katalog:

TV-Inspeksjons rapport

Kunde:

Kontakt person:

Vei:

Post nr./By:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Epost:

Notat:

Prosjekt leder:

Kontakt person:

Vei:

Post nr./By:

Telefon::

Fax:

Mobil:

Epost:

Notat:

Kunde:

Anders Kristiansen

Kontakt person:

Vei:

Post nr./By:

Telefon::

Fax:

Mobil:

Epost:

Notat:



Nonsvarden stikkledninger 64/157

Katalog:

Protokoll overblikk

Nr.	Avsnitt		Adresse		Ø	Materiell	
	Fra	Til	Sted		Total lengde	Inspisert	Dato
1	Stikkledning 64/157				DN	PVC	24.01.2023
			Kum 12339			18,45 m	
2	Overvann stikkledning 64/157				DN	Drensledning	24.01.2023
			12339			12,44 m	

Total					30,89 m	
Fra der	DN	Drensledning		12,44 m		
		PVC		18,45 m		



Nonsvarden stikkledninger 64/157

Katalog:

Protokoll data

Core data

Inspeksjonsnavn	Stikkledning 64/157
Start punkt navn	Kum 12339
Canal type	SP - stikk
Rørbredde	110,00 mm
Rørmateriale	PVC

Section data

Inspeksjonsretning	Motstrøm
Inspektør	Thbi/Aust
Inspeksjons dato	24.01.2023



Nonsvarden stikkledninger 64/157

Katalog:

Profilhøyde: DN

Materiell: PVC

Strømretning: Motstrøm

Kanal:

Sted:

Observasjon merkand

Avstand	Kode	Tekst	Video	Bilde
8,15 m		Deformasjon - liten. Stein som stikker inn i rørvegg	00:01:09	
13,69 m		Retningsendring venstre mot 64/157	00:01:45	
15,51 m		Retningsendring venstre	00:01:57	
17,64 m		Hindring - inspeksjon avsluttes	00:03:35	
18,24 m		Stein og grus i påstikk. Blendet?	00:02:50	
18,45 m		Under grunnmur. PVC videre.	00:02:22	



Nonsvarden stikkledninger 64/157

Katalog:

Profilhøyde: DN


Materiell: PVC

Strømretning: Motstrøm

Kanal:

Sted:

Observasjons grafikk

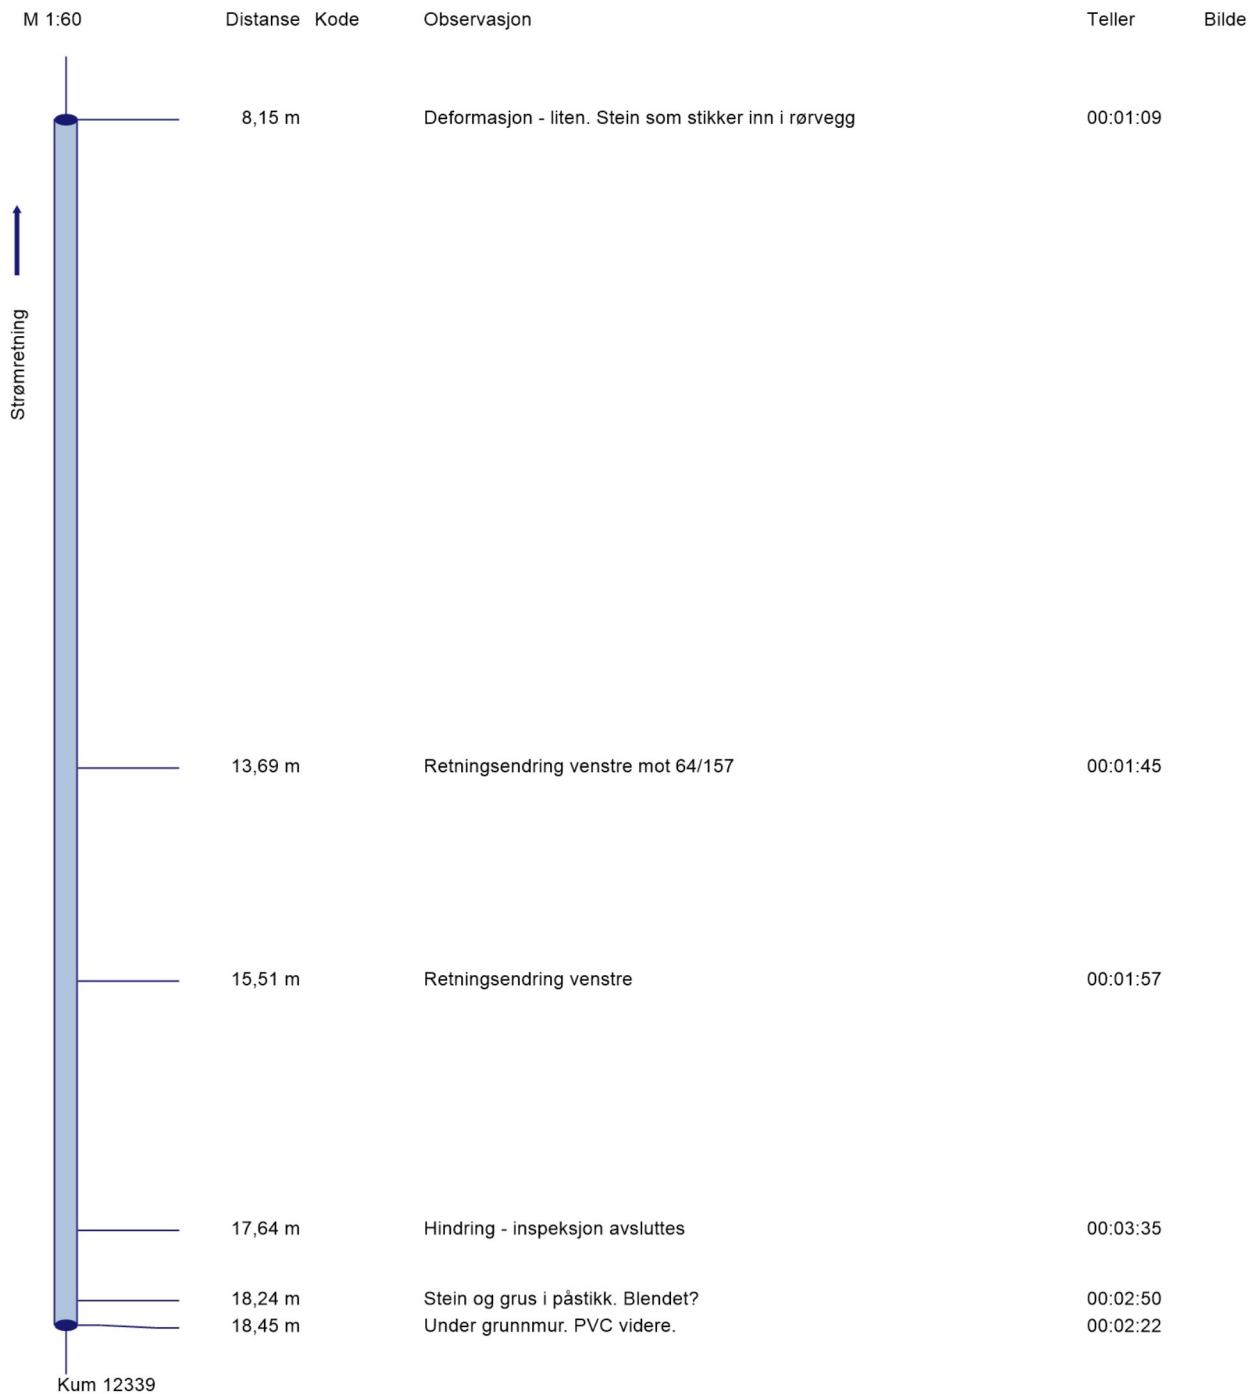



Nonsvarden stikkledninger 64/157

Katalog:

Protokoll data

Core data

Inspeksjonsnavn	Overvann stikkledning 64/157
Start punkt navn	12339
Canal type	OV
Rørbredde	110,00 mm
Rørmateriale	Drensledning

Section data

Inspektør	Thbi/Aust
Inspeksjons dato	24.01.2023
