






# Karmøy kommune





## Søknad om vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: YBXX0256

### Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS  
Org.nr: 926561693  
Valbergvegen 14  
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**  
Ståle Ytreland
-  **Telefon**  
95919078
-  **Mobil**  
95919078
-  **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no

### Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**  
95919078
-  **Telefon**  
95919078
-  **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no

### Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**  
Sundvegen 340a
-  **Gårds- og bruksnummer**  
73/40
-  **Bygningsnummer**  
-
-  **Bolignummer**  
-

### Eier/tiltakshaver

-  Sund Jan Reidar  
Midgardtunet 4  
4028 Stavanger  
NORGE
-  **Telefon**  
-
-  **Mobil**  
-
-  **Epost**  
-

### Arbeid som skal utføres

-  **Type tiltak**  
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
-  **Bygningstype**  
Fritidseiendom
-  **Beskrivelse av tiltaket**  
Flytte stikk og vannledning, samt legge inn nytt stikk til aneks
-  **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig
  - Overvann til terreng  
Innfiltrasjonskum
-  **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
01.03.2023
- Ferdigdato**  
31.03.2023

## Beskrivelse av stikkledninger



### Vann

Utskifting av ledning

Tilkobling

Anboring (ANB)

Kobles til ledning av type VL SJK på 100 mm



### Spillvann

Utskifting av ledning

Tilkobling

Stikk avløp (STK)

Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm

## Utvendig utstyr

### ● Drenskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 600mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



### Overvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 110mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning

Dimensjon: 40mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning

Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning


Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse

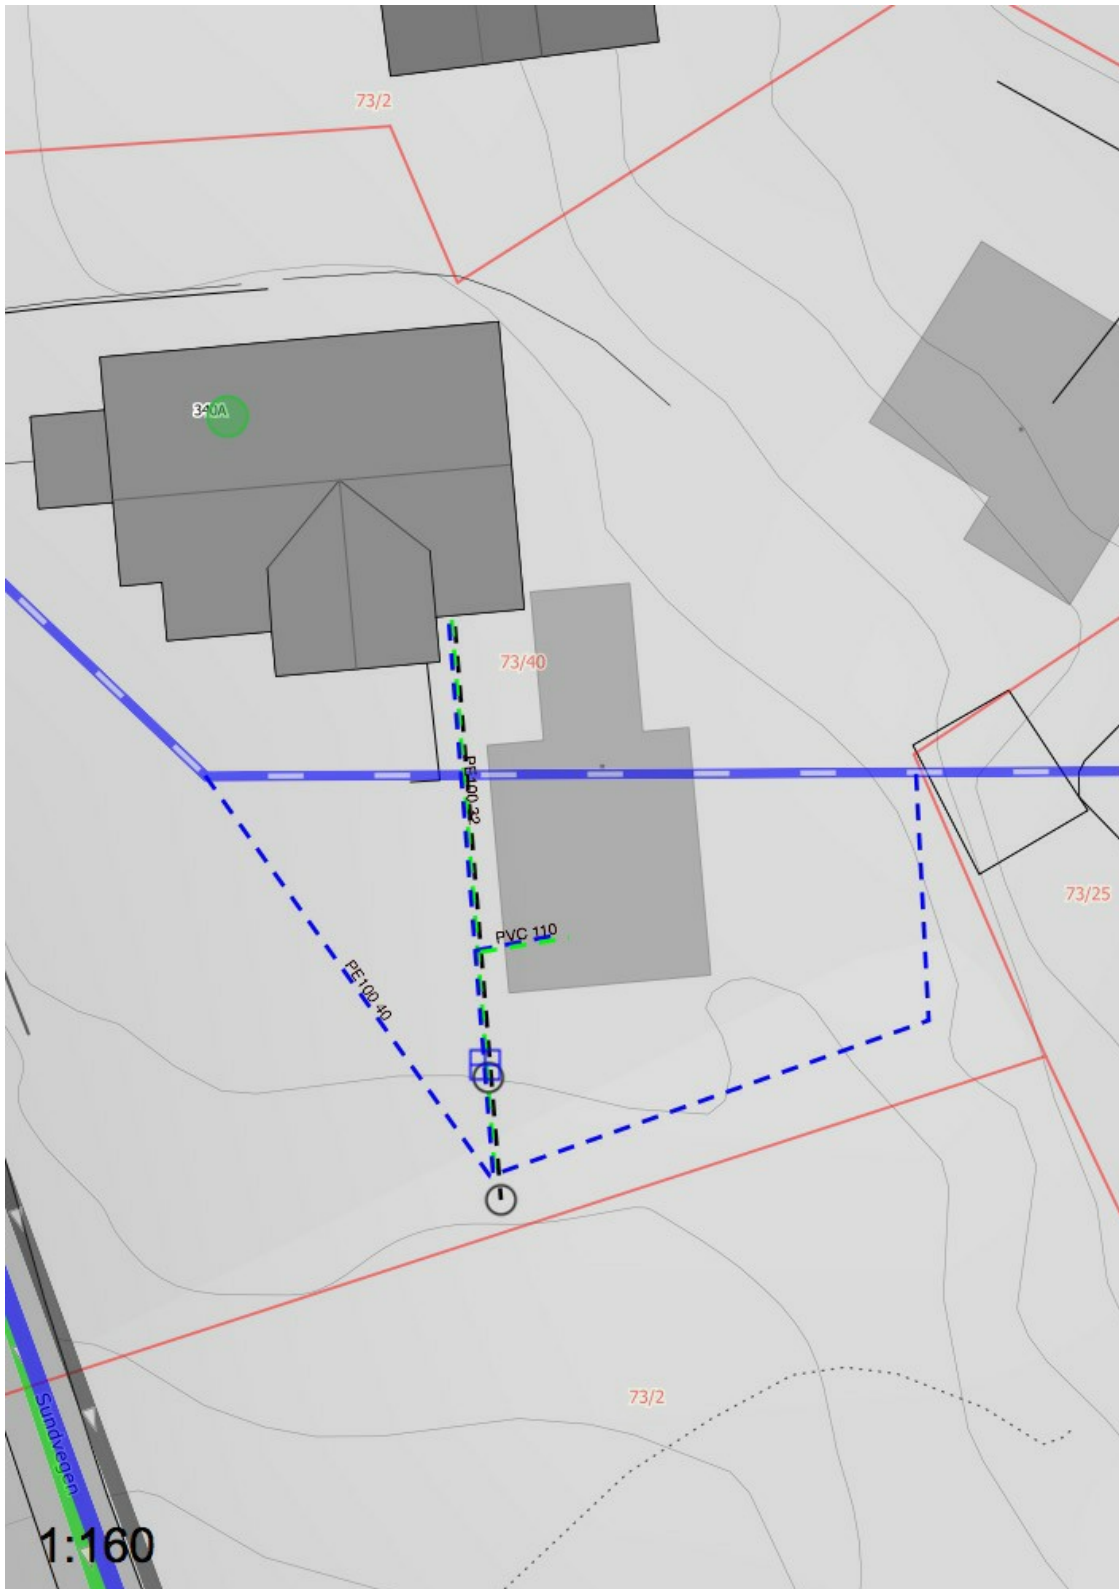

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

## Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-

