

Karmøy kommune


Melding om utført vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: WEGP9067

Foretak

 GTA AS
Org.nr: 997194748
Vestre Karmøyveg 221
4275 SÆVELANDSVIK

 **Kontakt**
Geir Tangjerd


 **Telefon**
99288640


 **Mobil**
99288640

 **Epost**
geir@geirtangjerd.no

Kontaktperson

 Tangjerd Geir

 **Telefon**
99288640

 **Telefon**
99288640

 **Epost**
geir@geirtangjerd.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Austre Karmøyveg 346

 **Gårds- og bruksnummer**
61/128

 **Bygningsnummer**

-

 **Bolignummer**

-

Eier/tiltakshaver

 Daumann Kirsten Marie B
Austre Karmøyveg 346
4250 Kopervik
NORGE

 **Epost**

-

 **Telefon**


-


 **Mobil**


-

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**
Tilkobling av vann og avløp til nybygg etter tidligere brannskadet bolig. Eksisterende vanntilkobling er gjenbrukt, overvann infiltreres i grunn, avløpsvann fra ny slamavskiller tilkoblet privat avløpsledning hos nabo.

 **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig

- Privat rensanlegg

Overvann, utvendig

- Overvann til terreng**
Overvann infiltrert i grunnen på egen tomt.

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Reparasjon av ledning

Type reparasjon: Utskifting av deler av ledning

Beskrivelse av reparasjon:

Rør som gikk fra eksisterende stoppekran er erstattet med ny PE32 rør frem til bolig. Eksisterende stoppekran var av nyere dato og derfor ikke byttet

Utvendig utstyr

● Slamavskiller

Material: Prefabr. GRP (GUP), Kjegle: Rett kjegle, Dimensjon: 2300 mm,

Legg ved FDV-dokumentasjon for utstyret: VPI slamavskiller - FDV.pdf, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Volum: 4000l



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 315 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2020




Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse

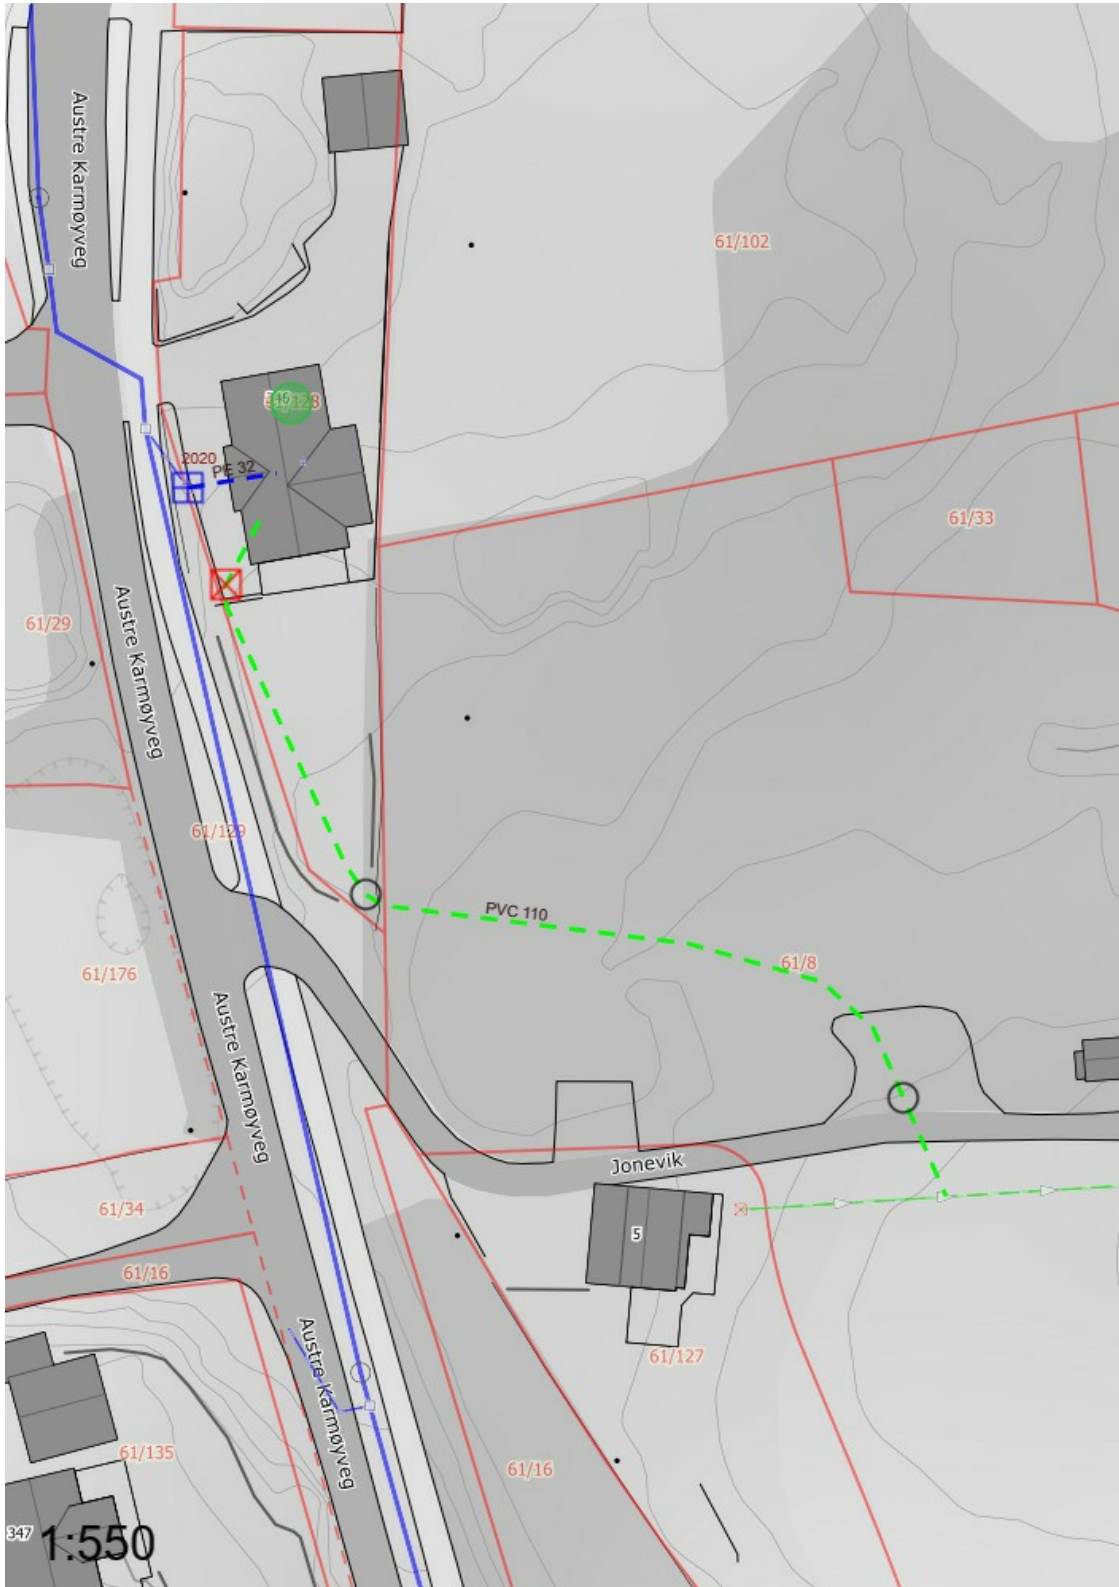

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

01.07.2021



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-
