


Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: <b>PROTEUS</b>	Meter start: <b>0.02</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	

Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	<b>Fredheimvegen</b>  <b>Spillvann</b>	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	<b>Septiktank</b> <b>Ned mot ny grøft</b> <b>Medstrøms</b>
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale: Anmerkning:	<b>Rengjort</b> <b>Stikkprøve Undersøkelse</b>	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	<b>CCTV</b>  <b>110mm / 110mm</b> <b>Polyvinylklorid</b>	

## 0.02m (Septiktank)




Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.02m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:01	(1)
0.34m		RE	Retningsending av;på 6 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:04	(2)
2.26m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:20	(3)
3.07m		RE	Retningsending av;på 3 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:23	(4)
8.88m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:39	(5)
14.65m		RE	Retningsending av;på 3 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:53	(6)

14.65m

Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.02</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	

14.65m



Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
20.98m		RE	Retningsendring av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:01:08	(7)
22.15m		RE	Retningsendring av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:01:14	(8)
24.40m		IA	Inspeksjon avbrutt Andre For mange bend	0%	00:01:44	(9)
24.40m		IA	Inspeksjon avbrutt Andre For mye motstand på fjæret	0%	00:01:45	(10)

24.40m (Ned mot ny grøft)

Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.02</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	




(1)




(2)




(3)

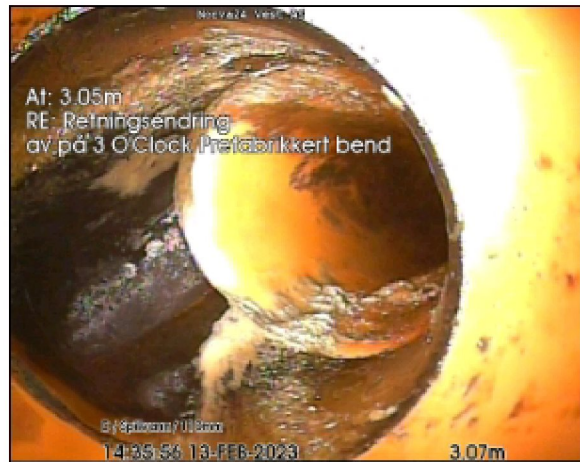

(4)

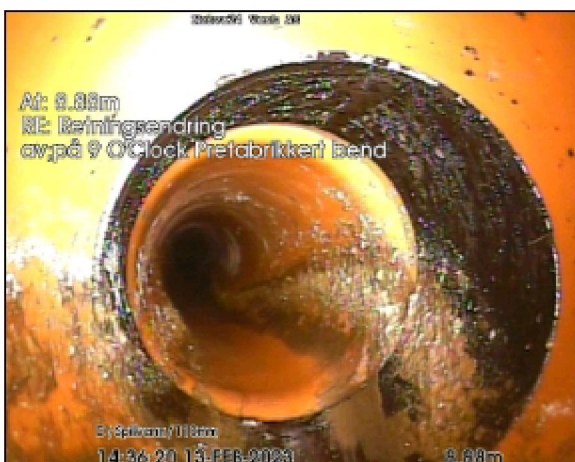

(5)

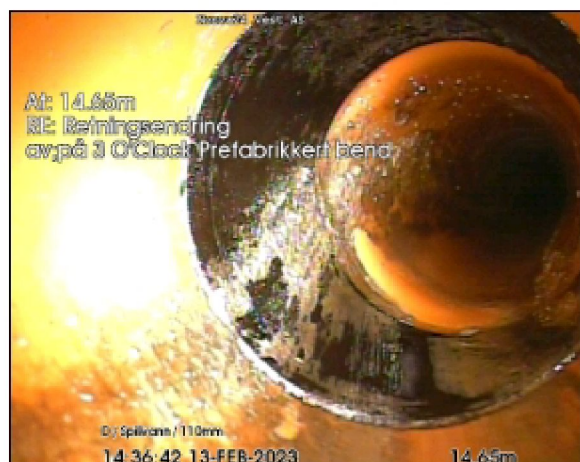

(6)


Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.02</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	



(7)



(8)

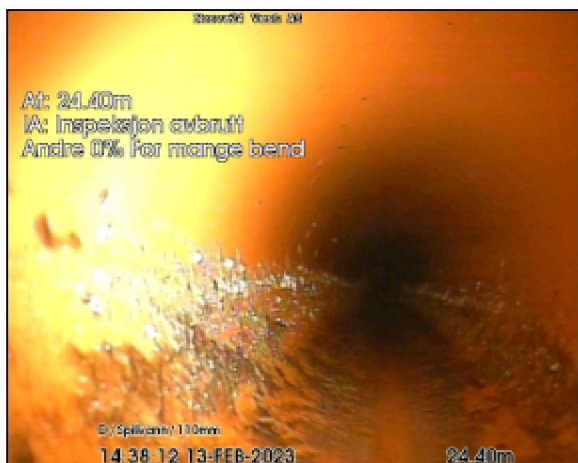

(9)



(10)
