


# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: AIGS9693 Saksnummer: 2022/3699

### Foretak

 Kristoffer Sirevåg AS  
Org.nr: 928746208  
Solvigvegen 11  
4280 SKUDENESHAVN

 **Kontakt**  
Kristoffer Sirevåg

 **Telefon**  
97674545


 **Mobil**  
97674545

 **Epost**  
post@kristoffersirevaag.no

### Kontaktperson

 Sirevåg Kristoffer


 **Telefon**  
97674545


 **Telefon**  
97674545


 **Epost**  
post@kristoffersirevaag.no

### Eiendomsdetaljer


 **Adresse**  
Postvegen 47

 **Gårds- og bruksnummer**  
47/106

 **Bygningsnummer**  
11839088

 **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver


 Torsheim Matias  
Postvegen 47  
4280 Skudeneshavn  
NORGE

 **Telefon**  
-

 **Mobil**  
-

 **Epost**  
-

### Eiendom

 **Gårds- og bruksnummer**  
47/106

 **Adresse**  
Postvegen 47

 **Eier**  
Nornes Loyd Arve, Solvigvegen 33, 4280 Skudeneshavn

## Arbeid utført

---



### Type tiltak

Annet



### Bygningstype

Annen



### Beskrivelse av tiltaket

Legge inn ny pvc klokkledning opp til eksisterende septikktank. Sette ned sanfangkum



### Type arbeid

Spillvann, utvendig

Overvann, utvendig

## Utvendig utstyr

---

### ● Drengskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



### Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Etenplast [GSE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stake og spylekum

Material: PP Polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)




### Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse

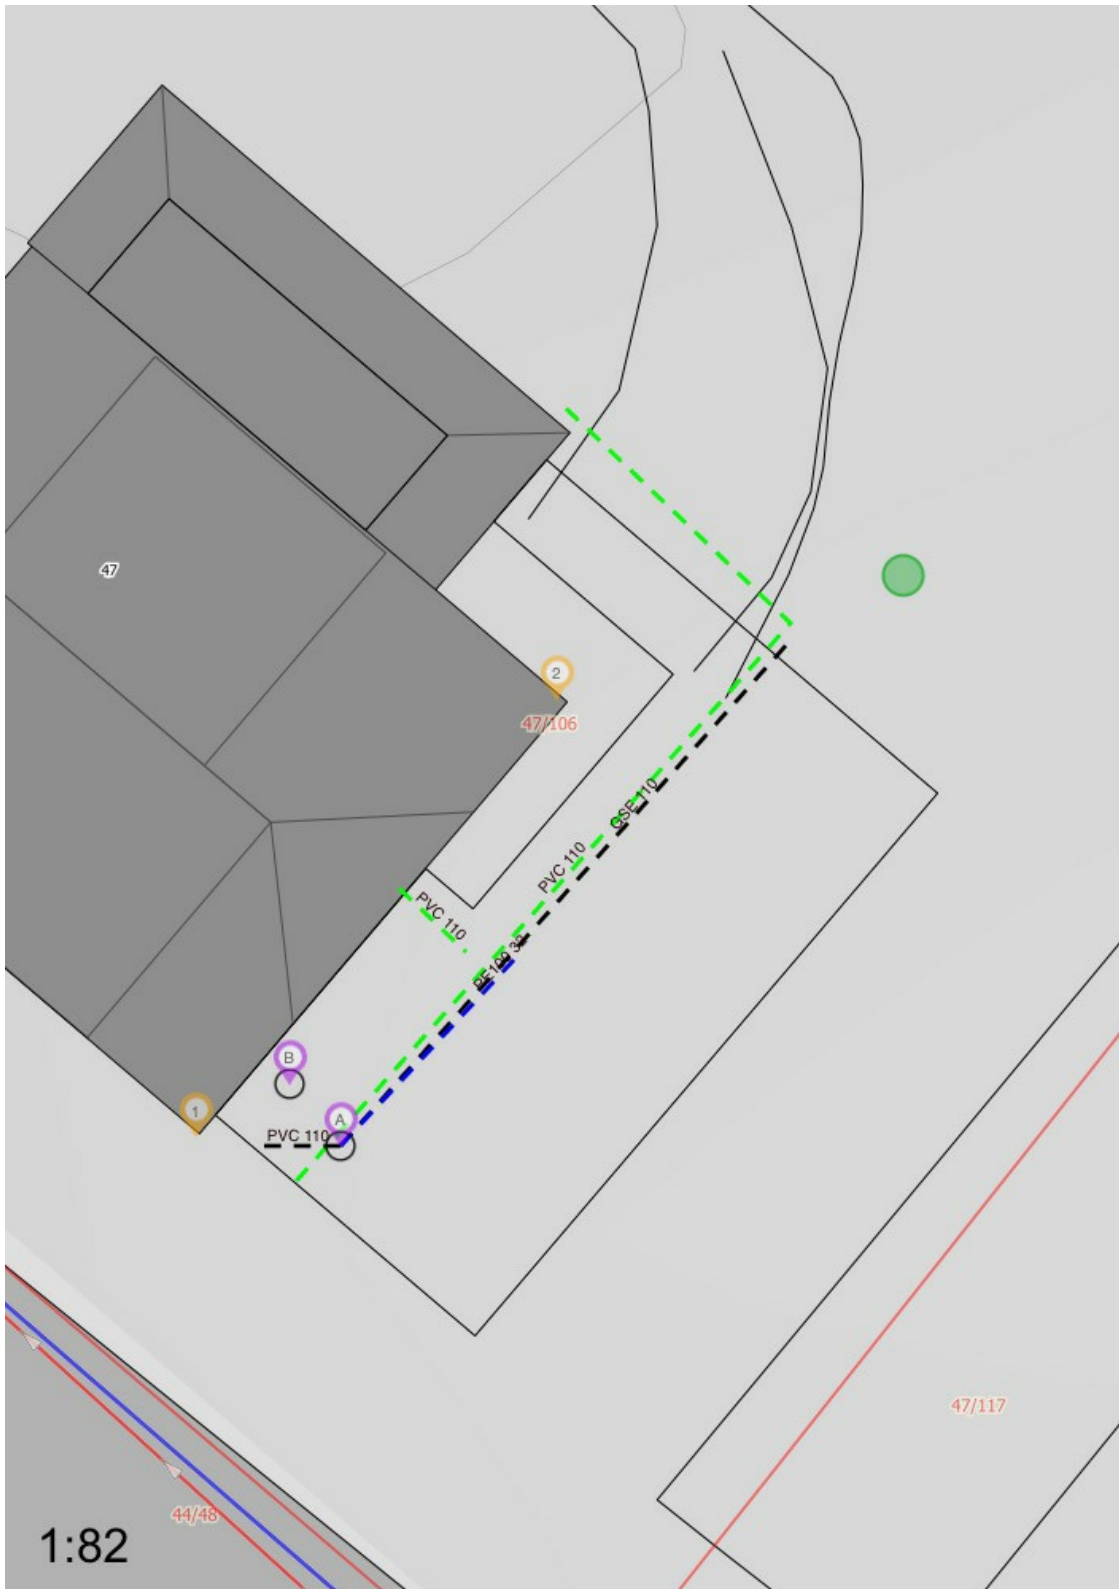

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

## Vedlegg til ferdigmelding

---



Filer (3)

3310FE9E-C76D-4EAD-A74F-263E8E41D73E.jpeg

FA52455A-E979-48F1-8A11-631B31445016.jpeg

9C8B7B78-2E7B-40B0-9F2B-8B31E196B654.jpeg



Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---



Ferdigstillingsdato spillvann

30.03.2023



Ferdigstillingsdato overvann

30.03.2023



Tilleggsopplysninger

-
