

# Karmøy kommune

## Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: BCXC0040

### Foretak

 BIRKELAND AS  
Org.nr: 996662292  
Førresdalen 131  
5563 FØRRESFJORDEN

 **Kontakt**  
Helge Mundal

 **Telefon**  
90796109

 **Mobil**  
90796109

 **Epost**  
post@birkelandmaskin.no

### Kontaktperson

 Huus Kjell

 **Telefon**  
91194601

 **Telefon**  
91194601

 **Epost**  
ks.huus@birkeland.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Vestre Karmøyveg 213a

 **Gårds- og bruksnummer**  
8/37

 **Bygningsnummer**  
300141308

 **Bolignummer**  
H0101

 **Andre opplysninger**  
Gjelder tilkobling eksisterende stikkledninger for VA i forbindelse med ny VA grøft i fortau oppover Heiå.  
Vestre Karmøyveg 213 B(enebolig) er også koblet til, men denne boligen var det ikke mulighet til å velge i kart.

### Tiltakshaver

 **Organisasjonsnummer**  
940791901

 **Foretaksnavn**  
KARMØY KOMMUNE

 **Adresse**  
Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK

### Flere eiendommer

 **Vestre Karmøyveg 213c**  
8/79  
Eier: Tangen Helge

### Eksisterende bygg

 **Enebolig**  
Bygnings-ID: 300141308



Enebolig

Bygnings-ID: 9371648



Gjelder tilkobling eksisterende stikkledninger for VA i forbindelse med ny VA grøft i fortau oppover Heiå. Vestre Karmøyveg 213 B(enebolig) er også koblet til, men denne boligen var det ikke mulighet til å velge i kart.

## Arbeid utført



Type tiltak

Annet



Bygningstype

Bolig



Beskrivelse av tiltaket

Tilkobling eks. stikkledninger for VA med nye ledninger.

Vannledning til Vestre Karmøyveg 213B ligger på eiendom til 213A.

Vannledning til 213A kommer fra 215B.



Type arbeid

Vann, utvendig

Spillvann, utvendig

Overvann, utvendig

## Utvendig utstyr



Anboring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Gren

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Kommentar

Tekst: Vannledning til Vestre Karmøyveg 213B



Kum

Material: Prefabr. betong, Kjegle: Skjev kjegle, Dimensjon: 2000 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Kum

Material: Prefabr. betong, Kjegle: Skjev kjegle, Dimensjon: 1000 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 125 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning


Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse

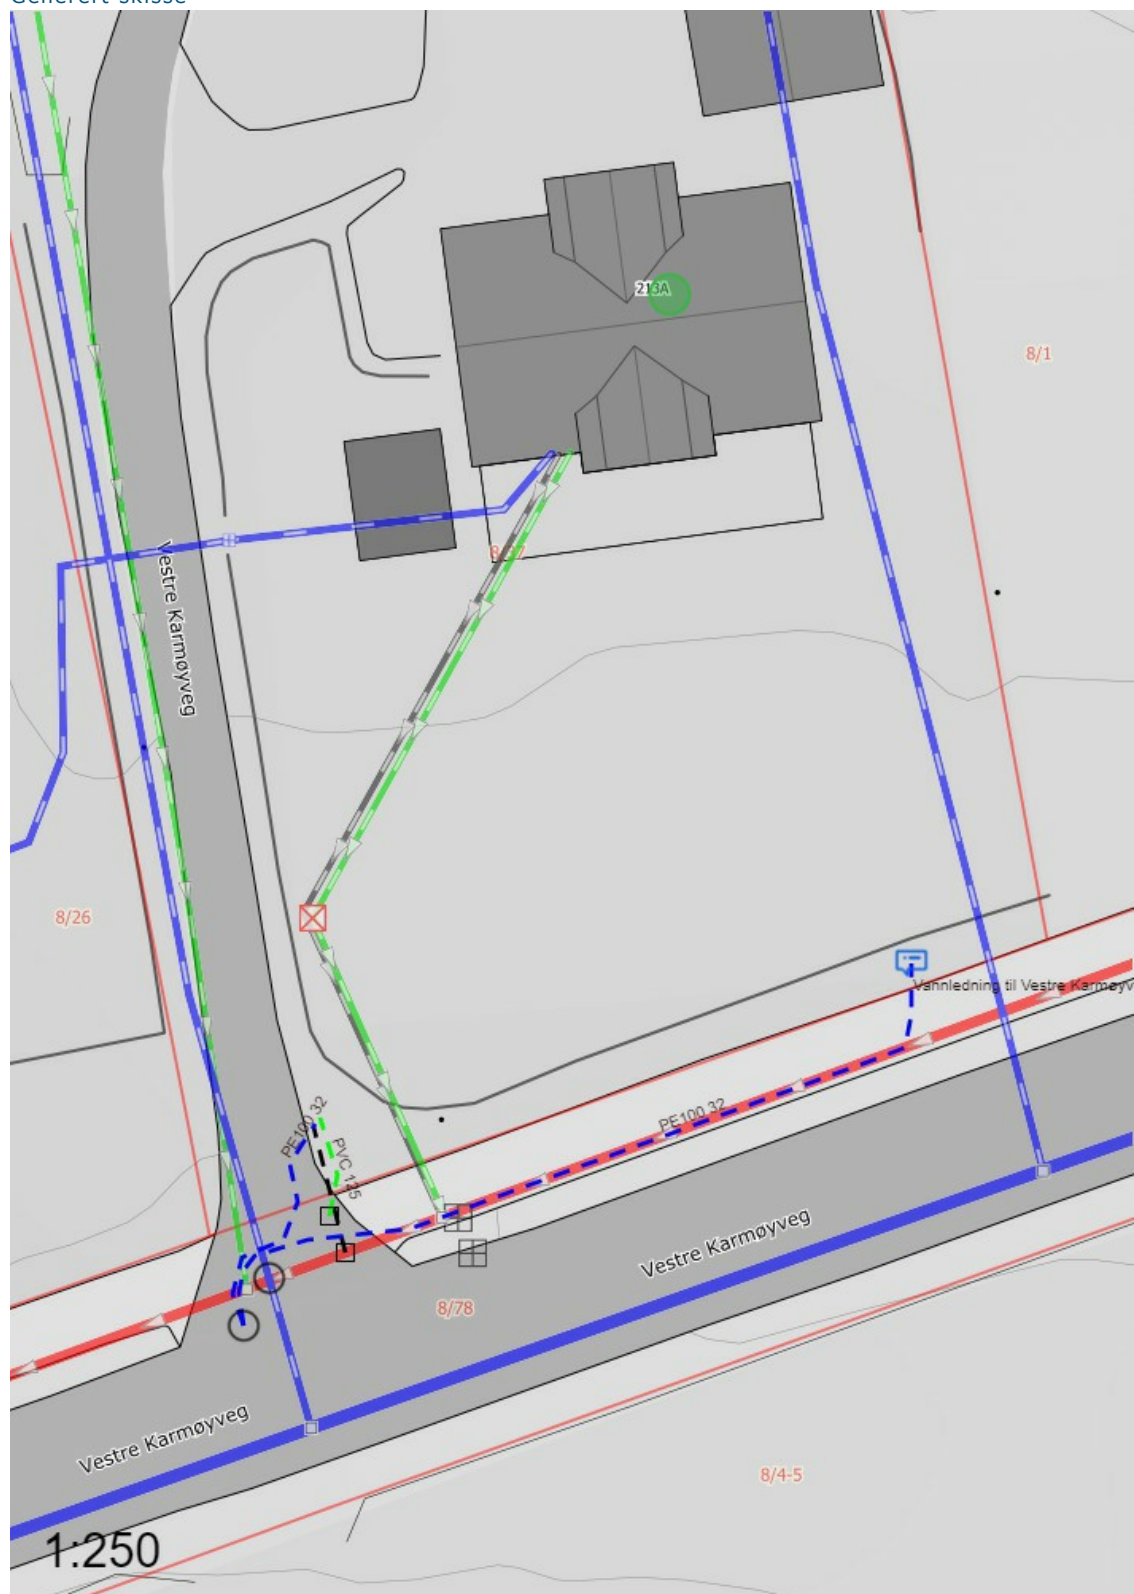

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

## Ferdigstilling

---



Ferdigstillingsdato

20.03.2023



Tilleggsopplysninger

-

## Vedlegg

---



Filer (1)

Presentasjonstegning AB VA Stikk Kg9-Kg10.pdf



Andre opplysninger

-
