

# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: KQNJ6120 Saksnummer: 2021/7446


### Foretak

 SIG HALVORSEN AS  
Org.nr: 976700376  
Bedriftsveien 14  
4313 SANDNES

 **Kontakt**  
Ståle Hetland

 **Telefon**  
52830928

 **Mobil**  
52830928

 **Epost**  
stale.hetland@sig-halvorsen.no

### Kontaktperson

 hetland ståle

 **Telefon**  
98256461

 **Telefon**  
98256461


 **Epost**  
stale.hetland@sig-halvorsen.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Fosnavegen 284


 **Gårds- og bruksnummer**  
109/7

 **Bygningsnummer**  
13191670

 **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver

 **Navn**  
Munck Bjørn Valand


 **Adresse**  
Fosnavegen 282, 5546 Røyksund  
NORGE

### Arbeid utført

 **Type tiltak**  
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**  
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**  
-

 **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
• Ledninger i sjø/vann

 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
09.10.2021

**Ferdigdato**  
13.10.2021

## Beskrivelse av stikkledninger

---



### Vann

#### Utskifting av ledning

Ny ledning PE på 32 mm

Eksisterende ledning på 32 mm

Kobles til ledning av type Privat PE på 32 mm med tilkoblingstype TRO



### Spillvann

#### Utskifting av ledning

Ny ledning PVC på 110 mm

Eksisterende ledning PVC på 110 mm

Kobles til ledning av type Privat PVC på 110 mm med tilkoblingstype KUM

## Utstyr

---



### Slamavskiller (1)

bokn plast, volum: 6 m<sup>3</sup>




### Stoppekran (1)

Antall: 1

# Skisse

Generert skisse

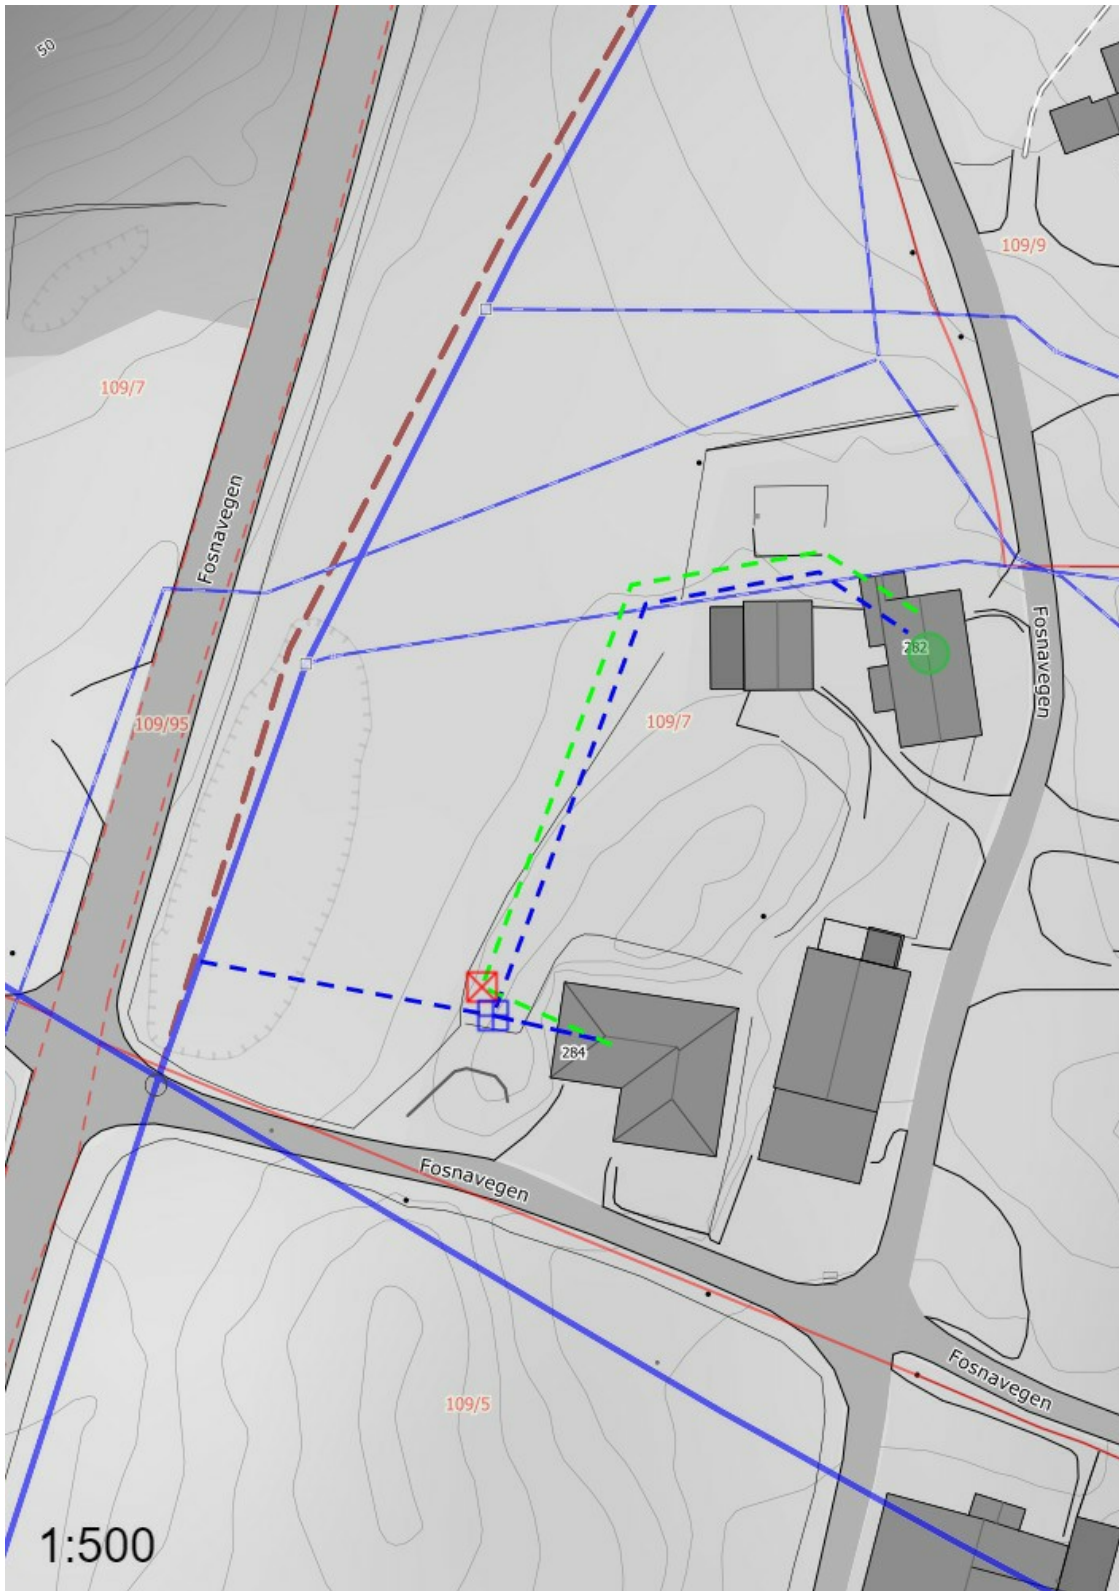

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil  
Skisse.sos

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger


-

## Ferdigstilling

---

 Det er gjort endringer i tilkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato vann  
07.01.2022

 Ferdigstillingsdato spillvann  
07.01.2022

 Tilleggsopplysninger

-
