


Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: SFJY8868


Foretak

 J HØINES AS
Org.nr: 930384836
Naravegen 71
4275 SÆVELANDSVIK

 **Kontakt**
Jøran Høines


 **Telefon**
94858244

 **Mobil**
94858244


 **Epost**
post@hoines.as

Kontaktperson

 Høines Jøran

 **Telefon**
94858244

 **Telefon**
94858244

 **Epost**
post@hoines.as

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Naravegen 42a

 **Gårds- og bruksnummer**
11/145

 **Bygningsnummer**
0

 **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Tveit Runar

 **Adresse**
Vestre Veaveg 56, 4275 Sævelandsvik
NORGE

Nytt bygg

 Ny erstatnings bolig

Arbeid utført



Type tiltak

Annet



Bygningstype

Bolig



Beskrivelse av tiltaket

Nye stikkledninger til erstatningsbolig



Type arbeid

Vann, utvendig

Spillvann, utvendig

Overvann, utvendig

Utvendig utstyr

● Drengeskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Slamavskiller

Material: Prefabr. GRP (GUP), Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 2200 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Volum: 4 l



Spillvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)




Vannledning

Dimensjon: 50 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse

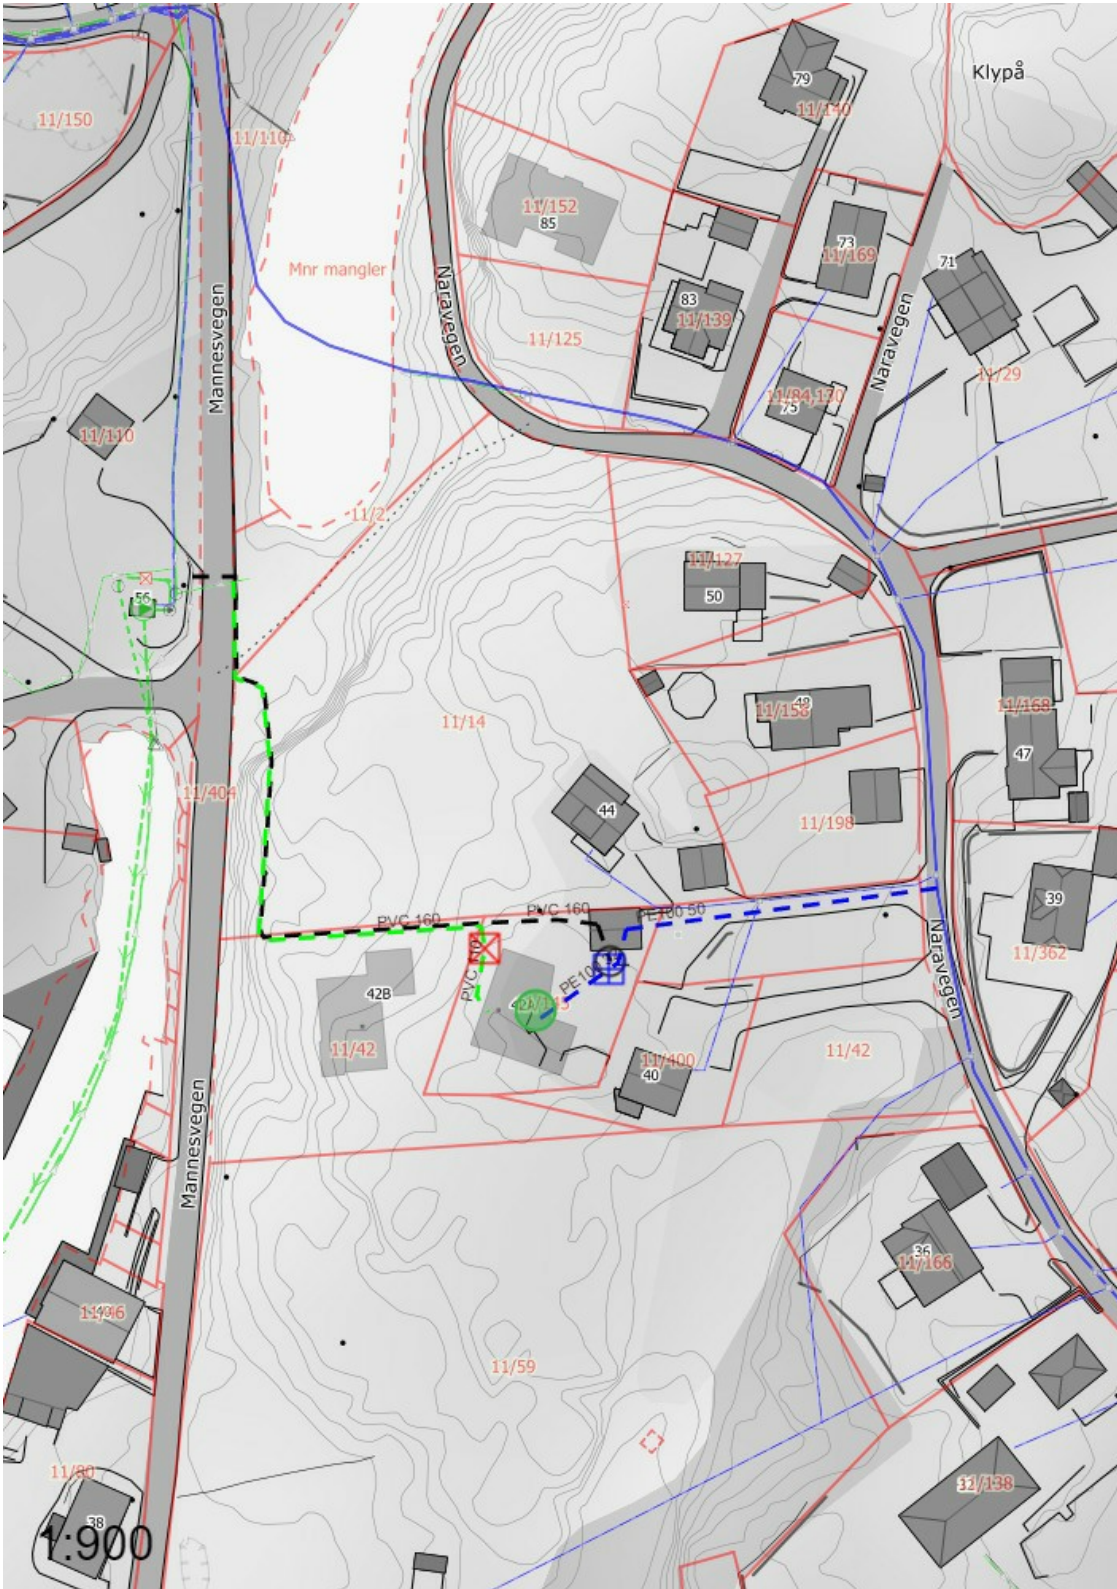

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

13.04.2023



Ferdigstillingsdato spillvann

04.05.2023



Ferdigstillingsdato overvann

04.05.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-
