

26.05.2023

Beliggenhetskontroll av: Gnr: 120 Bnr: 172 Kommune: Karmøy

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering

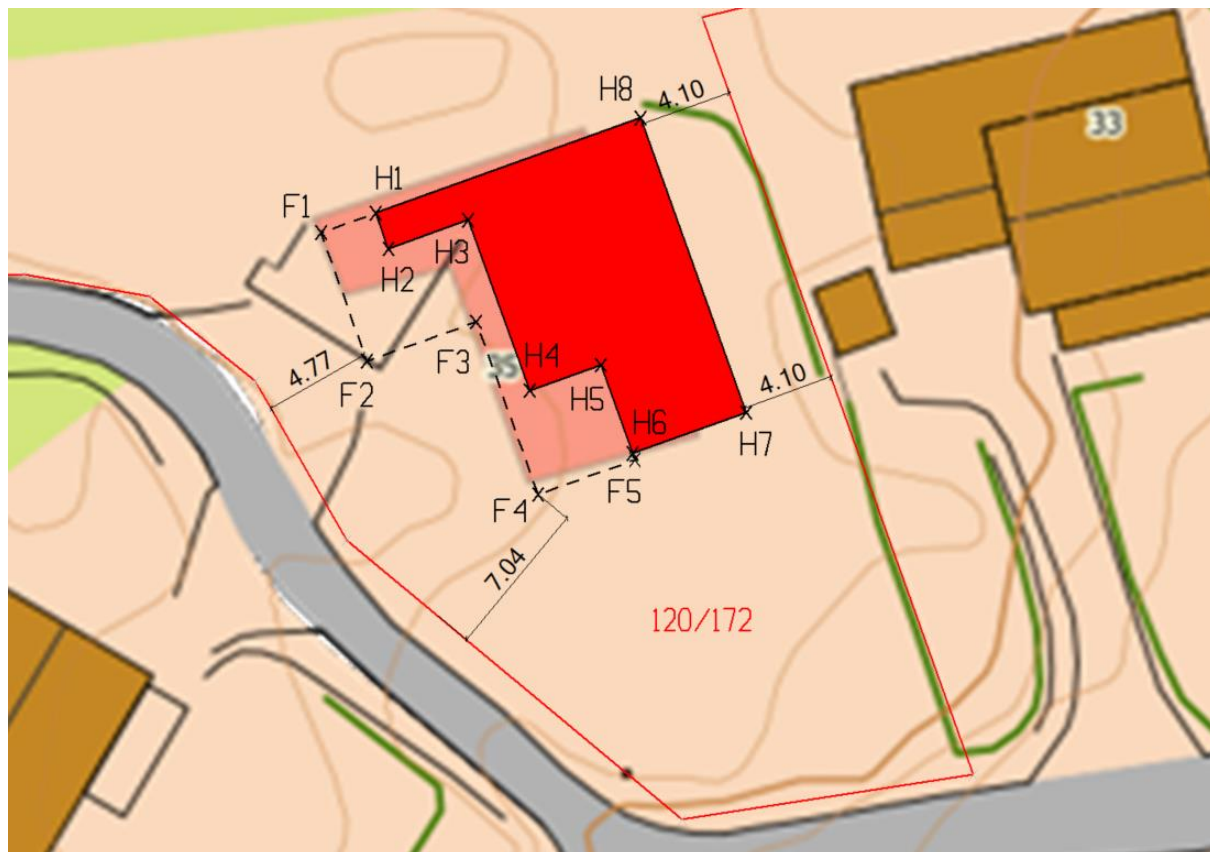

Id	Øst	Nord	S_OBJID	OBJTYPE
1	292782,422	6582860,565	H1	Grunnmur
2	292782,995	6582858,964	H2	Grunnmur
3	292786,572	6582860,247	H3	Grunnmur
4	292789,306	6582852,622	H4	Grunnmur
5	292792,507	6582853,769	H5	Grunnmur
6	292793,924	6582849,816	H6	Grunnmur
7	292799,007	6582851,638	H7	Grunnmur
8	292794,283	6582864,817	H8	Grunnmur
9	292779,974	6582859,687	F1	Fasadeliv
10	292782,033	6582853,945	F2	Fasadeliv
11	292786,928	6582855,700	F3	Fasadeliv
12	292789,695	6582847,981	F4	Fasadeliv
13	292794,025	6582849,533	F5	Fasadeliv

Innmålt, As-built

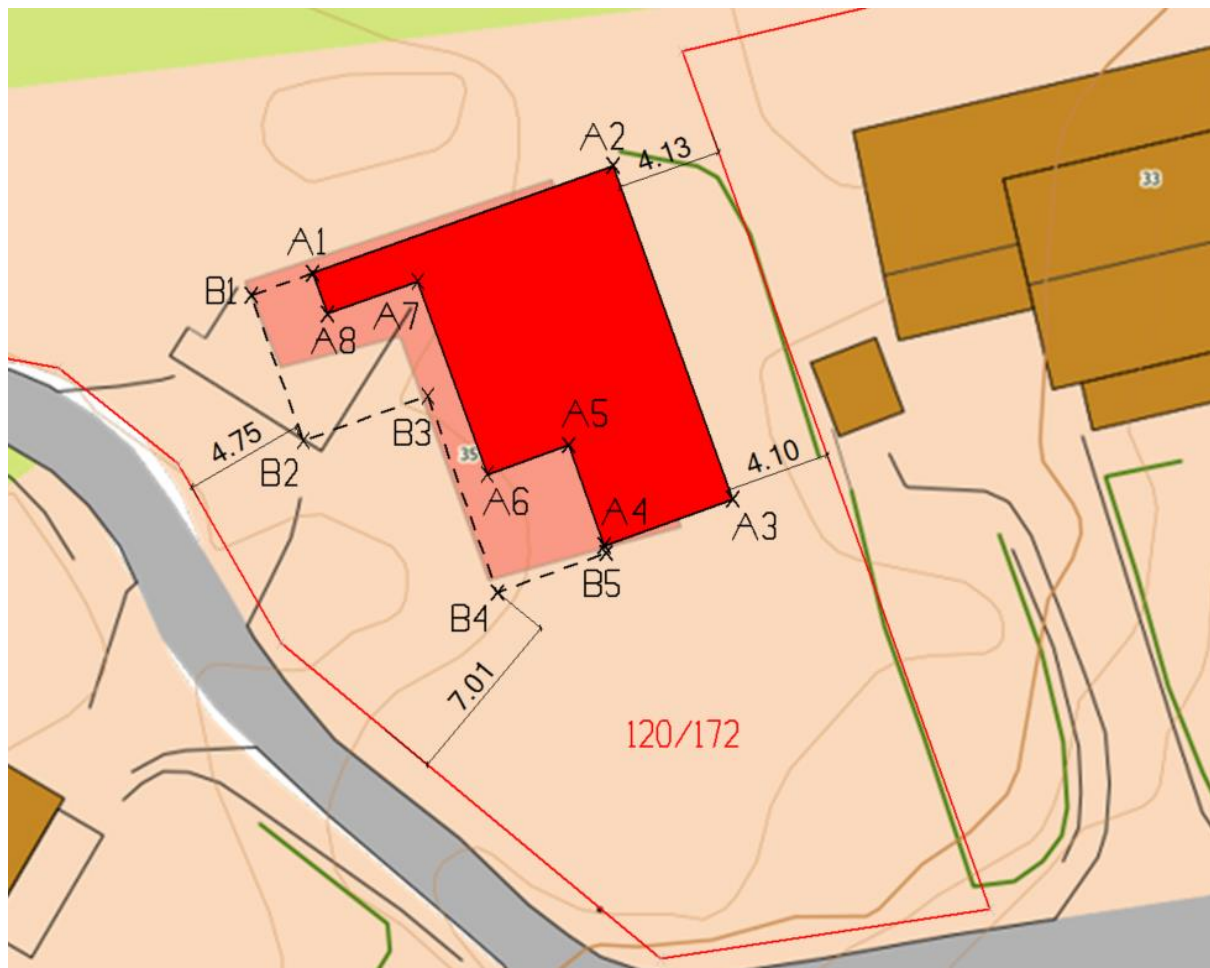

Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	292782,388	6582860,560	28,150	A1	Grunnmur
2	292794,255	6582864,803	28,150	A2	Grunnmur
3	292799,008	6582851,636	28,150	A3	Grunnmur
4	292793,908	6582849,793	28,150	A4	Grunnmur
5	292792,501	6582853,769	28,150	A5	Grunnmur
6	292789,286	6582852,613	28,150	A6	Grunnmur
7	292786,545	6582860,237	28,150	A7	Grunnmur
8	292782,966	6582858,959	28,150	A8	Grunnmur
9	292779,942	6582859,686	28,150	B1	Fasadeliv
10	292782,013	6582853,948	28,150	B2	Fasadeliv
11	292786,935	6582855,708	28,150	B3	Fasadeliv
12	292789,684	6582847,950	28,150	B4	Fasadeliv
13	292794,008	6582849,510	28,150	B5	Fasadeliv

PunktID	Prosjekterte data			DIFFERANSE			
	Nord	Øst	Høyde	Nord	Øst	2D	Retning Høyde
	Kontrollerte data						
	Nord	Øst	Høyde				
H1	6 582 860,564	292 782,422					
A1	6 582 860,560	292 782,388		-0,004	-0,034	0,034	291,8
H8	6 582 864,817	292 794,283					
A2	6 582 864,803	292 794,255		-0,014	-0,028	0,031	270,4
H7	6 582 851,638	292 799,007					
A3	6 582 851,636	292 799,008		-0,002	0,001	0,002	178,1
H6	6 582 849,816	292 793,924					
A4	6 582 849,793	292 793,908		-0,023	-0,016	0,028	239,1
H5	6 582 853,769	292 792,507					
A5	6 582 853,769	292 792,501		-0,000	-0,006	0,006	295,9
H4	6 582 852,622	292 789,306					
A6	6 582 852,613	292 789,286		-0,009	-0,020	0,022	273,4
H3	6 582 860,247	292 786,573					
A7	6 582 860,237	292 786,545		-0,010	-0,028	0,030	278,1
H2	6 582 858,964	292 782,996					
A8	6 582 858,959	292 782,966		-0,005	-0,030	0,030	289,0
F1	6 582 859,687	292 779,974					
B1	6 582 859,686	292 779,942		-0,001	-0,032	0,032	297,3
F2	6 582 853,945	292 782,033					
B2	6 582 853,948	292 782,013		0,003	-0,020	0,020	310,1
F3	6 582 855,700	292 786,927					
B3	6 582 855,708	292 786,935		0,008	0,008	0,011	48,2
F4	6 582 847,981	292 789,695					
B4	6 582 847,950	292 789,684		-0,031	-0,011	0,033	222,2
F5	6 582 849,533	292 794,025					
B5	6 582 849,510	292 794,008		-0,023	-0,017	0,029	240,6
