

# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: UUFF0862 Saksnummer: 2022/6111


### Foretak

 SIG HALVORSEN AS  
Org.nr: 976700376  
Bedriftsveien 14  
4313 SANDNES

 **Kontakt**  
Ståle Hetland

 **Telefon**  
52830928

 **Mobil**  
52830928

 **Epost**  
stale.hetland@sig-halvorsen.no

### Kontaktperson

 hetland ståle

 **Telefon**  
98256461

 **Telefon**  
98256461

 **Epost**  
stale.hetland@sig-halvorsen.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Rindavegen 5a

 **Gårds- og bruksnummer**  
15/384

 **Bygningsnummer**  
300960276

 **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver


 **Navn**  
Bårdsen Robert


 **Adresse**  
Vikavegen 27, 4270 Åkrehamn  
NORGE


### Arbeid utført

 **Type tiltak**  
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**  
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**  
vann og kloakk ,spillvann til ny bolig

 **Type arbeid**  
Vann, innvendig / utvendig  
Spillvann, innvendig / utvendig  
Overvann, innvendig / utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
22.06.2022

**Ferdigdato**  
07.09.2022

## Tilkoblinger

---



### Vann

#### Tilkobling til offentlig nett:

Gren (GRN)

kobles til ledning av type VL SJK  
på 150 mm



### Spillvann

kobles til ledning av type AF BET

på 150 mm med tilkoblingstype GRR



### Overvann

#### Tilkobling til offentlig nett:

Gren (GRN)

kobles til ledning av type AF BET  
på 200 mm

## Utvendig utstyr

---



### Drenskum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



### Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 110mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



### Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)




### Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier),

Anleggsår: 2009

# Skisse

Generert skisse

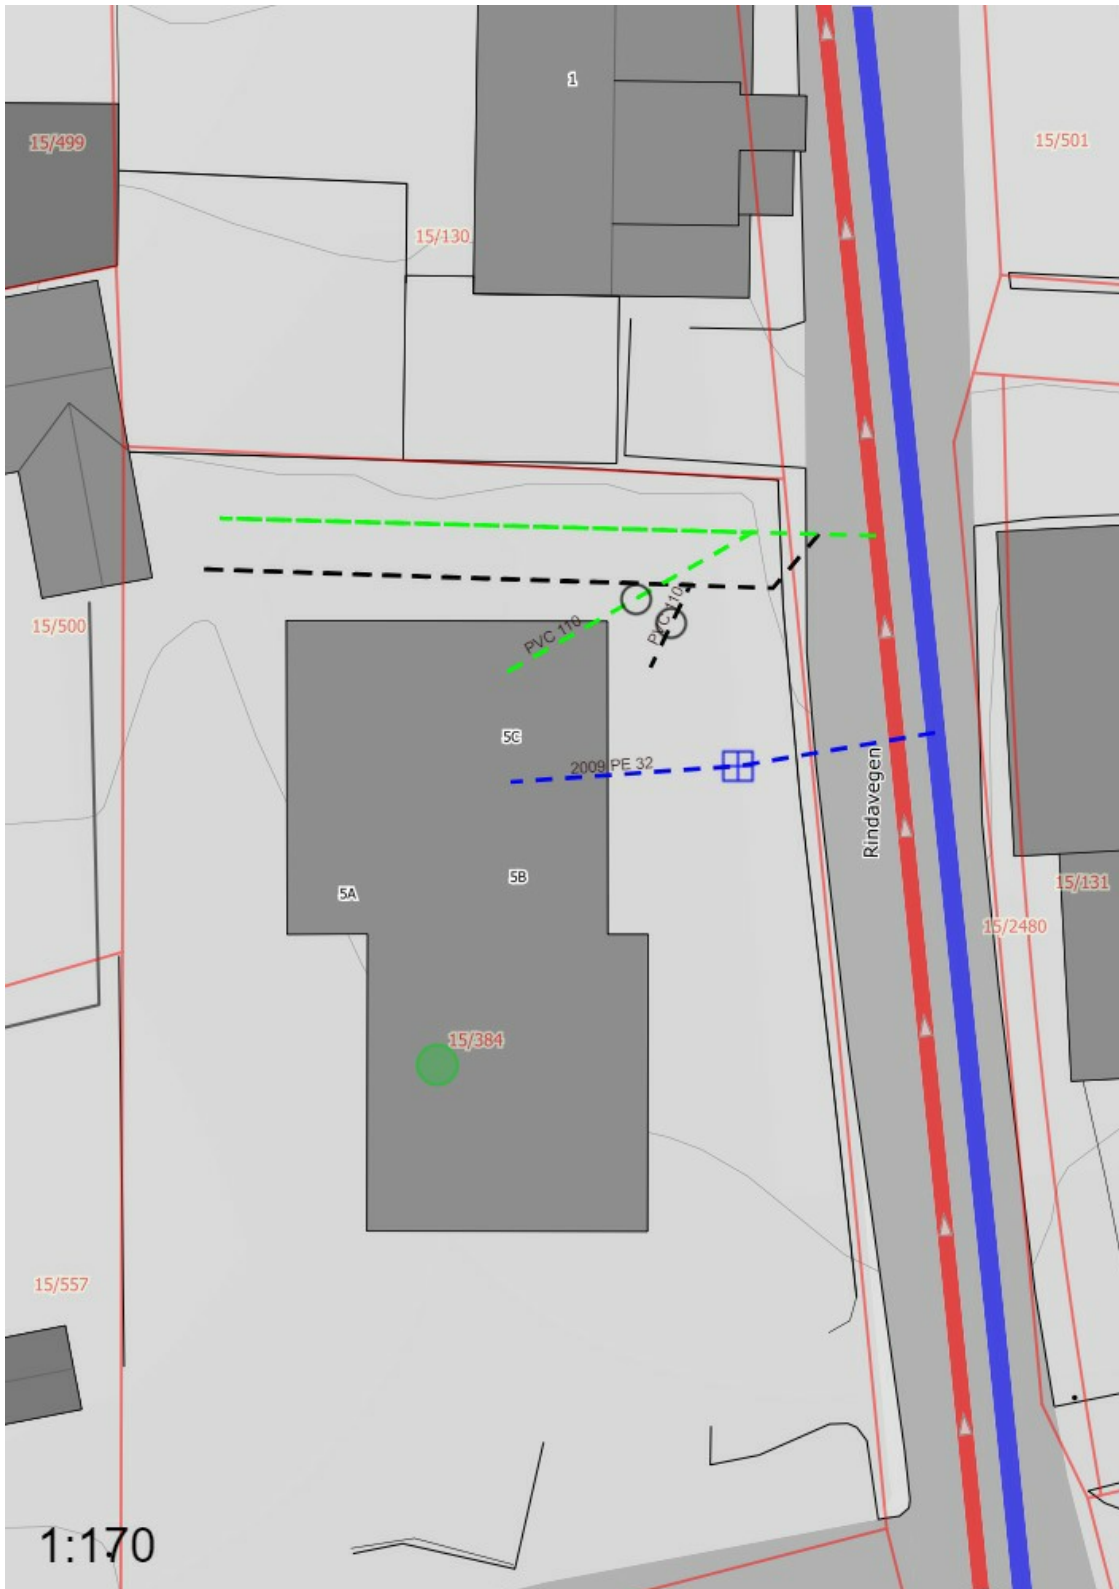

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger


-


## Ferdigstilling

---

 Det er gjort endringer i tilkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato vann  
23.02.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann  
23.02.2023

 Ferdigstillingsdato overvann  
23.02.2023

 Tilleggsopplysninger

-
