

03.07.2023

Beliggenhetskontroll av: Gnr: 63 Bnr: 207 Kommune: Karmøy

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering

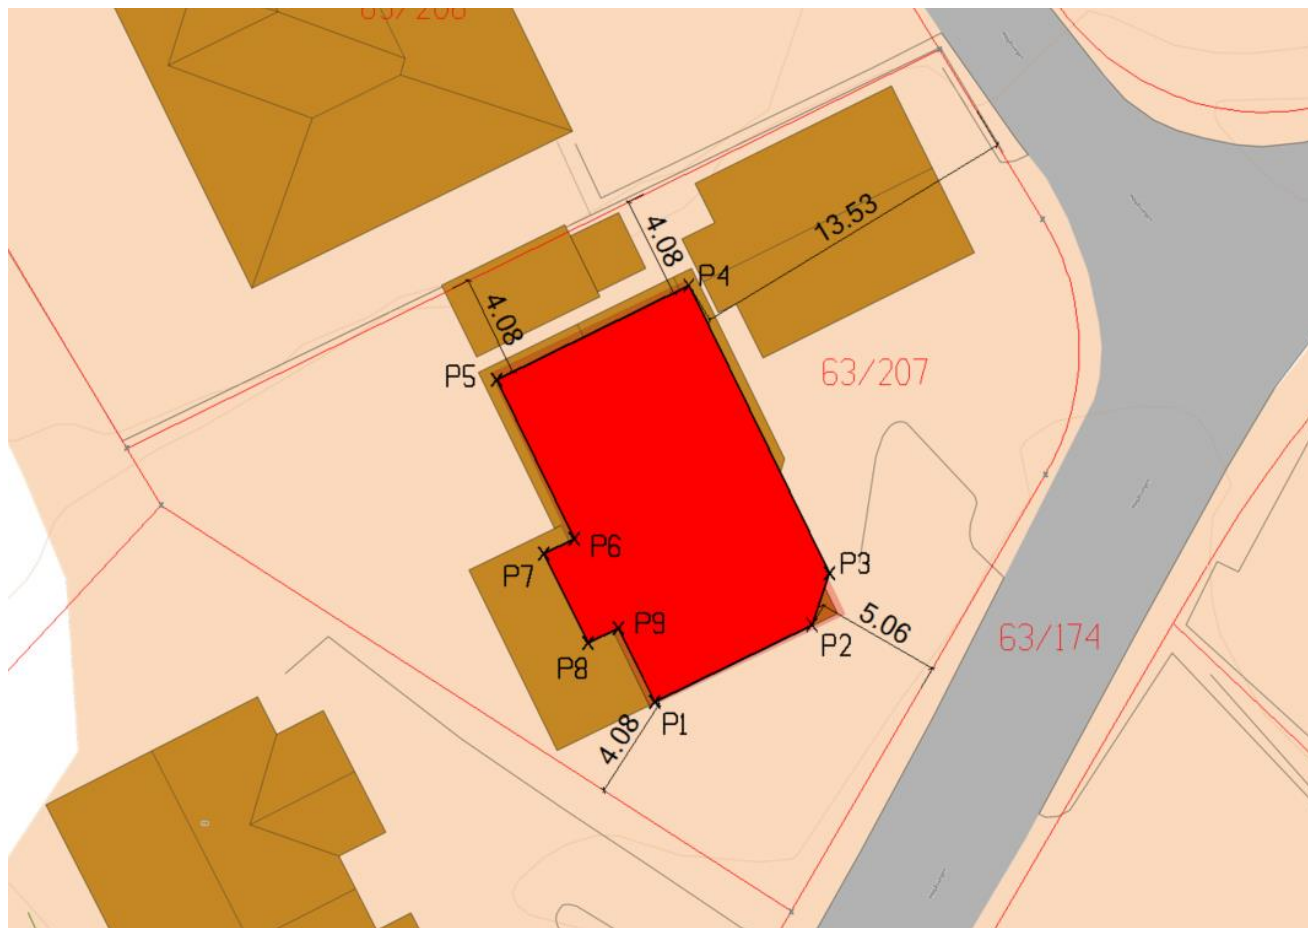

Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	289848,903	6575043,939	42,85	P1	Grunnmur
2	289855,231	6575047,044	42,85	P2	Grunnmur
3	289855,940	6575049,120	42,85	P3	Grunnmur
4	289850,280	6575060,655	42,85	P4	Grunnmur
5	289842,560	6575056,866	42,85	P5	Grunnmur
6	289845,687	6575050,492	42,85	P6	Grunnmur
7	289844,475	6575049,898	42,85	P7	Grunnmur
8	289846,237	6575046,307	42,85	P8	Grunnmur
9	289847,449	6575046,901	42,85	P9	Grunnmur

Innmålt, As-built

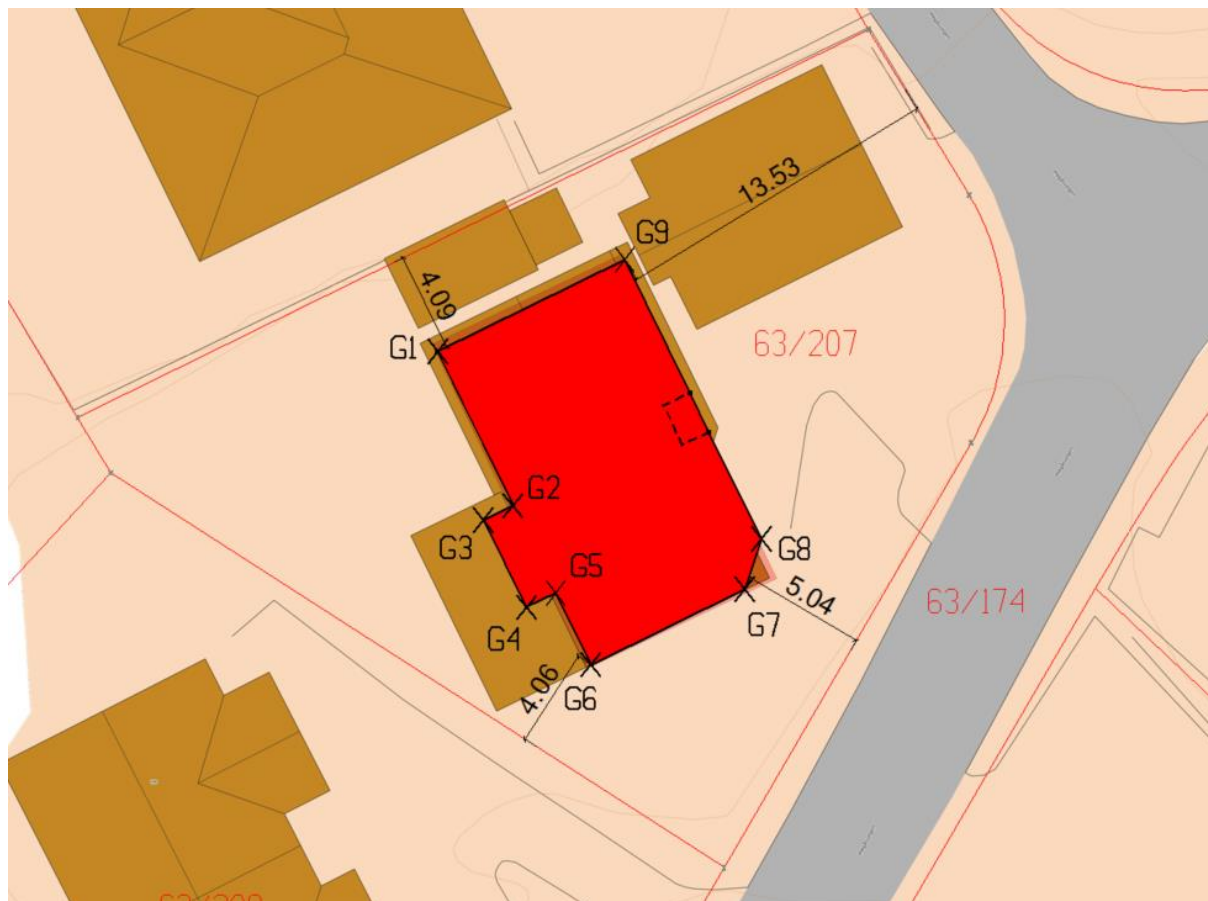

Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	289842,568	6575056,855	42,83	G1	Grunnmur
2	289845,686	6575050,487	42,83	G2	Grunnmur
3	289844,464	6575049,898	42,83	G3	Grunnmur
4	289846,231	6575046,288	42,83	G4	Grunnmur
5	289847,448	6575046,888	42,83	G5	Grunnmur
6	289848,893	6575043,926	42,83	G6	Grunnmur
7	289855,256	6575047,044	42,83	G7	Grunnmur
8	289855,938	6575049,114	42,83	G8	Grunnmur
9	289850,295	6575060,637	42,83	G9	Grunnmur

PunktID	Prosjekterte data			DIFFERANSE					
	Nord	Øst	Høyde	Nord	Øst	2D	Retning	Høyde	
	Kontrollerte data								
	Nord	Øst	Høyde						
P5	6 575 056,866	289 842,560	42,850						
G1	6 575 056,855	289 842,568	42,830	-0,011	0,008	0,014	161,1	-0,020	
P6	6 575 050,492	289 845,687	42,850						
G2	6 575 050,487	289 845,686	42,830	-0,005	-0,001	0,005	213,2	-0,020	
P7	6 575 049,898	289 844,475	42,850						
G3	6 575 049,898	289 844,464	42,830	0,000	-0,011	0,011	302,2	-0,020	
P8	6 575 046,307	289 846,237	42,850						
G4	6 575 046,288	289 846,231	42,830	-0,019	-0,006	0,020	221,1	-0,020	
P9	6 575 046,901	289 847,449	42,850						
G5	6 575 046,888	289 847,448	42,830	-0,013	-0,001	0,013	205,2	-0,020	
P1	6 575 043,939	289 848,902	42,850						
G6	6 575 043,926	289 848,893	42,830	-0,013	-0,009	0,016	240,4	-0,020	
P2	6 575 047,044	289 855,231	42,850						
G7	6 575 047,044	289 855,256	42,830	0,000	0,025	0,025	98,9	-0,020	
P3	6 575 049,120	289 855,940	42,850						
G8	6 575 049,114	289 855,938	42,830	-0,006	-0,002	0,006	222,2	-0,020	
P4	6 575 060,655	289 850,281	42,850						
G9	6 575 060,637	289 850,295	42,830	-0,018	0,014	0,023	156,8	-0,020	
