

# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: GUFB9202 Saksnummer: 2023/4569

### Foretak

 S Y ENTREPRENØR AS  
Org.nr: 926561693  
Valbergvegen 14  
4250 KOPERVIK

 **Kontakt**  
Ståle Ytreland

 **Telefon**  
95919078

 **Mobil**  
95919078

 **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no

### Kontaktperson

 Ytreland Ståle


 **Telefon**  
95919078

 **Telefon**  
95919078

 **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Ingen Adresse


 **Gårds- og bruksnummer**  
149/520

 **Bygningsnummer**  
0

 **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver

 **Navn**  
Vågen Anders

 **Adresse**  
Vågetunet 39, 4262 Avaldsnes  
NORGE

### Nytt bygg

 Oppføring av ny bolig

## Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**  
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
- ★ **Bygningstype**  
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**  
Oppføring av ny bolig
- ★ **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato: 14.06.2023  
Ferdigdato: 15.07.2023

## Påkoblinger

- ★ **Vann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Påkobling:  
Anboring (ANB) #44567  
Kommunal ledning:  
Vannledning (VL) SJK 150mm #38479
- ★ **Spillvann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Påkobling:  
Stikk avløp (STK) #44631  
Kommunal ledning:  
Spillvannsledning (SP) PVC 160mm #38457
- ★ **Overvann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Påkobling:  
Stikk overvann (STO) #44632  
Kommunal ledning:  
Overvannsledning (OV) BET 200mm #38427

## Utvendig utstyr


- **Drenskum**  
Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegele, Kumbredde: 600mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Overvannsledning**  
Dimensjon: 110mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**  
Dimensjon: 110mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stake og spylekum**  
Material: PP Polypropylen, Kjegle: Uten kjegele, Kumbredde: 110mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- **Stoppekran**  
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Vannledning**  
Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



## Generert skisse

pdf Kartskisse med tegnforklaring - 149/520 INGEN ADRESSE

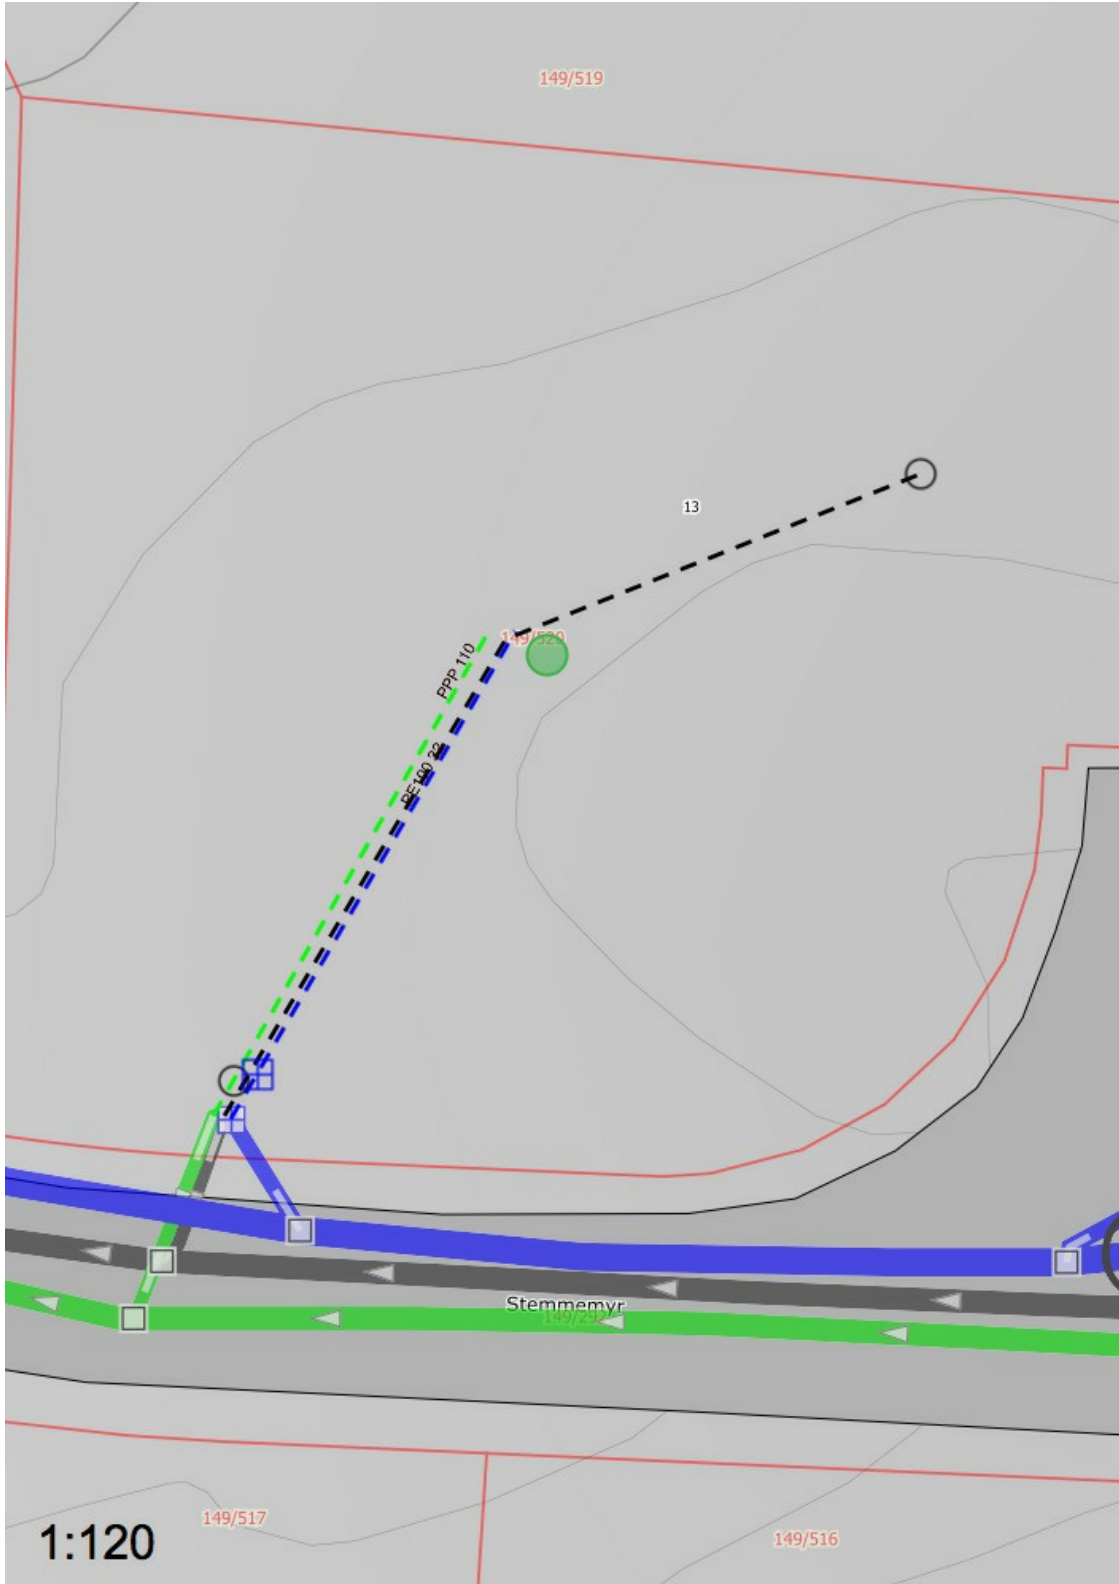

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

soo Sluttdokumentasjon - 149/520 INGEN ADRESSE

## Vedlegg til ferdigmelding

---



Filer (2)

Gemini\_VA\_Vågen.sos  
Oversiktstegning Vågen.pdf



Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---



Ferdigstillingsdato

27.09.2023



Tilleggsopplysninger

-
