


Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: WEPK2635

Foretak

 KARMØY RØRTEKNIKK AS
Org.nr: 993234532
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

 **Kontakt**
Rolf Vea Hansen

 **Telefon**
48082015

 **Mobil**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Kontaktperson

 Hansen Rolf


 **Telefon**
48082015

 **Telefon**
48082015


 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no


Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Torvastadvegen 573


 **Gårds- og bruksnummer**
141/39


 **Bygningsnummer**
300010448

 **Bolignummer**
H0101


 **Andre opplysninger**
Ved søk etter vannlednings brudd ble det satt ned en 600 overvannskum med rist.
Denne er tilkoblet eksisterende overvannsledning.
Vannledning som skulle utbedres ligger på nabo tomt og har privat eier, denne ble ikke utbedret.

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Karmøy Kommune

 **Adresse**
Postboks 167, 4291 Kopervik
NORGE

Eksisterende bygg

 **Rekkehus**
Bygnings-ID: 300010448

 Ved søk etter vannlednings brudd ble det satt ned en 600 overvannskum med rist. Denne er tilkoblet eksisterende overvannsledning. Vannledning som skulle utbedres ligger på nabo tomt og har privat eier, denne ble ikke utbedret.

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Blokk/leilighet
- ☰ **Beskrivelse av tiltaket**
Montert ny overvanns sluk Ø-600 som er tilkoblet eksisterende overvannsledning.
- ★ **Type arbeid**
Overvann, utvendig

Påkoblinger

- ★ **Overvann**
Reparasjon av ledning
Type reparasjon: Annen reparasjon

Utvendig utstyr


- **Drenskum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Kumbredde: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse

pdf Kartskisse med tegnforklaring - 141/39 Torvastadvegen 573

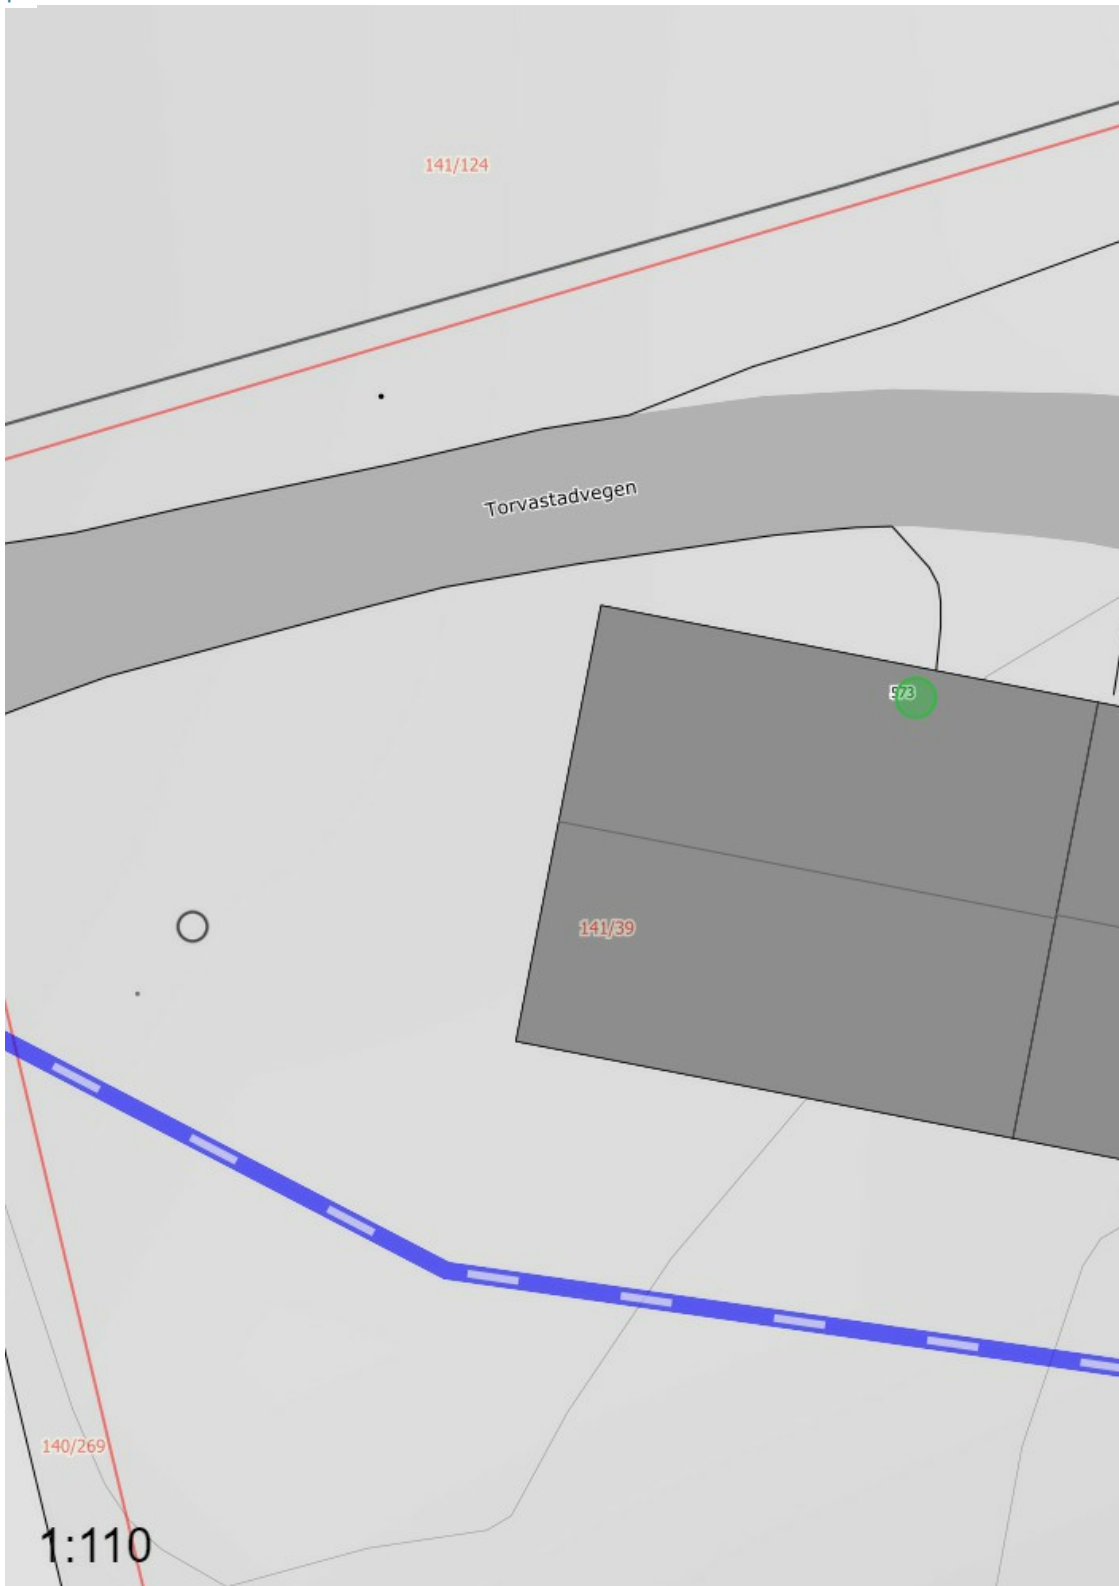

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



Sluttdokumentasjon - 141/39 Torvastadvegen 573

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato overvann

06.10.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-
