






Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: SPFJ3759 Saksnummer: 2022/6741

Foretak

-  **KLW AS**
Org.nr: 989477927
Munkajordvegen 13
4276 VEAVÅGEN
-  **Kontakt**
Kjell Lorentz Walland
-  **Telefon**
46626631
-  **Mobil**
46626631
-  **Epost**
Post@hageogmaskin.com



Kontaktperson

-  Walland Kjell
-  **Telefon**
46626631
-  **Telefon**
46626631
-  **Epost**
post@hageogmaskin.com


Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Porsholmen 12
-  **Gårds- og bruksnummer**
1/14
-  **Bygningsnummer**
0
-  **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Porsholmen Utbygging As
-  **Adresse**
Postboks 533, 4291 Kopervik
NORGE

Nytt bygg

-  Tilkobling av nybygg

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
- ★ **Bygningstype**
Fritidseiendom
- ☰ **Beskrivelse av tiltaket**
Tilkobling til nybygg. Gjelder bygning 24-27 ihht. vedlegg.
Kobles til ledninger stikkledninger lagt av annen entreprenør.
- ★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig

Påkoblinger

- ★ **Vann**
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkobling:
Stikk vann (STV)
- ★ **Spillvann**
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkobling:
Stikk avløp (STK)

Utvendig utstyr

● Anboring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Anboring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Anboring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Spillvannsledning

Dimensjon: 125 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stake og spylekum

Material: PP Polypropylen, Kjegle: Uten kjege, Kumbredde: 315 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Vannledning

Dimensjon: 50 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Vannledning


Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse

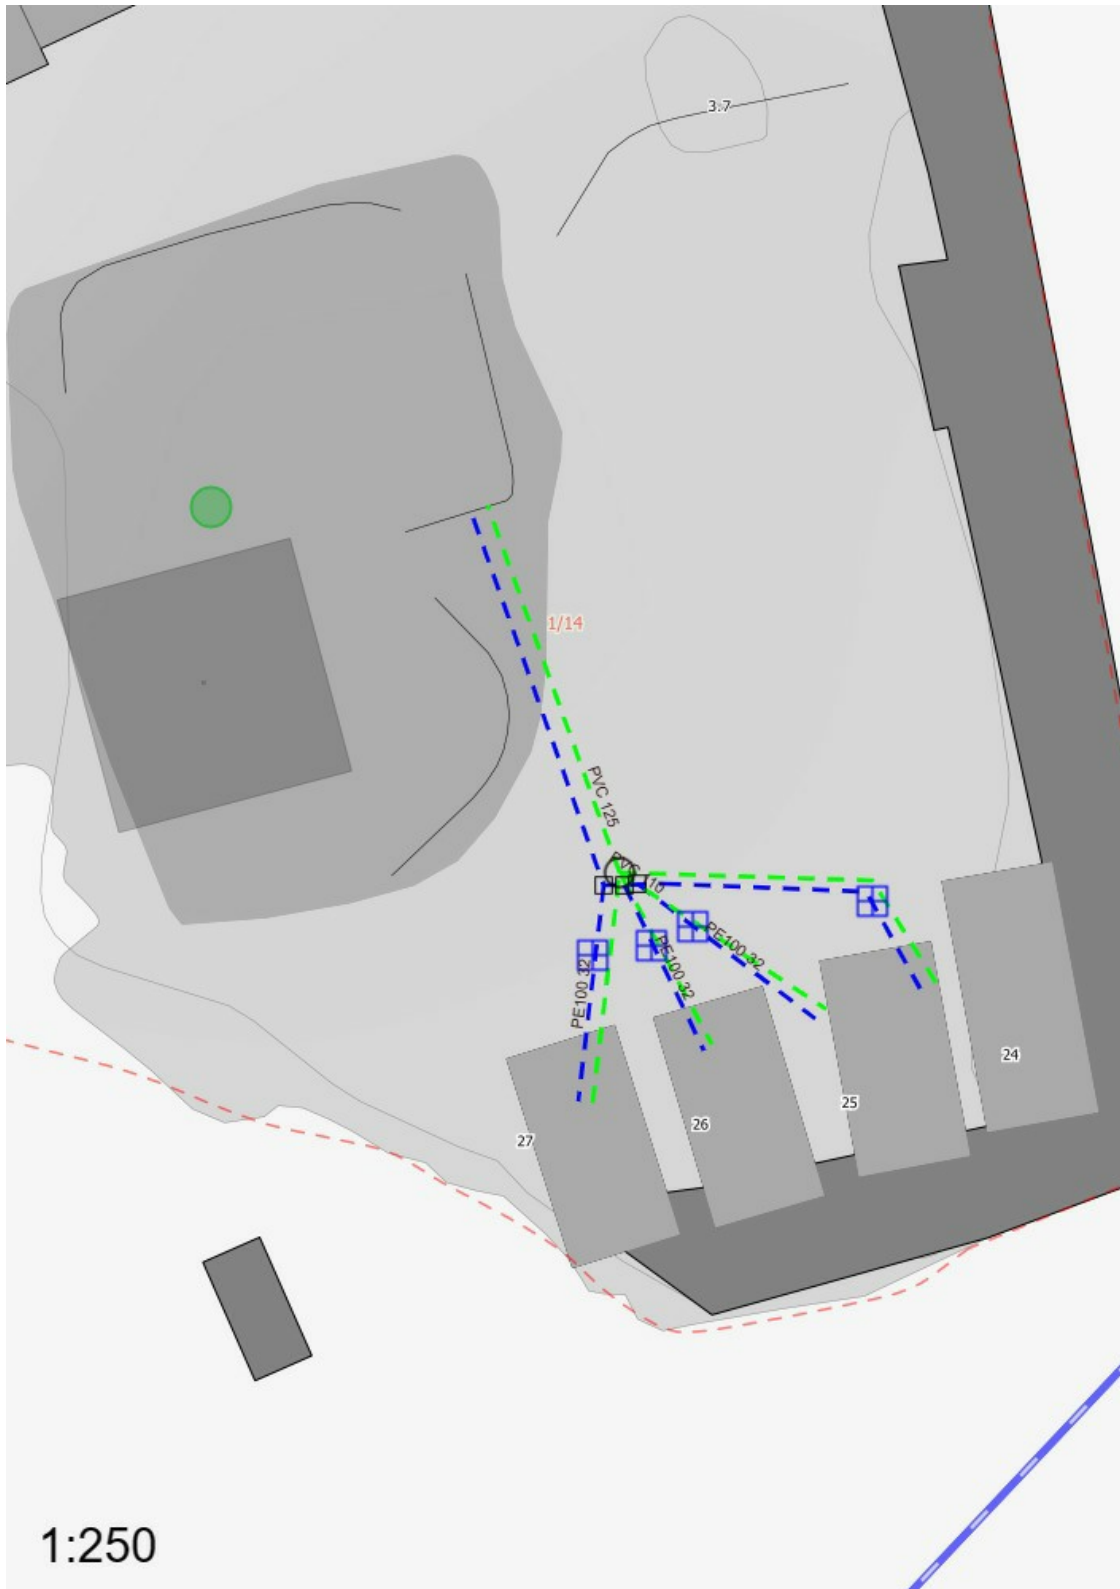

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

 Sluttdokumentasjon - 1/14 Porsholmen 12

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)


-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato vann
04.08.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann
04.08.2023

 Tilleggsopplysninger

-
