






# Karmøy kommune

## Søknad om vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: UEPK7673

### Foretak

-  **KLW AS**  
Org.nr: 989477927  
Munkajordvegen 13  
4276 VEAUVÅGEN
-  **Kontakt**  
Kjell Lorentz Walland
-  **Telefon**  
46626631
-  **Mobil**  
46626631
-  **Epost**  
Post@hageogmaskin.com



### Kontaktperson

-  Walland Kjell
-  **Telefon**  
46626631
-  **Telefon**  
46626631
-  **Epost**  
post@hageogmaskin.com

### Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**  
Kvednahaugvegen 16
-  **Gårds- og bruksnummer**  
140/209
-  **Bygningsnummer**  
0
-  **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver

-  **Navn**  
Bentsen Aud
-  **Adresse**  
Kvednahaugvegen 16, 4260 Torvastad  
NORGE

### Nytt bygg

-  ny bolig

## Arbeid som skal utføres

---

★ **Type tiltak**  
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

★ **Bygningstype**  
Bolig

📄 **Beskrivelse av tiltaket**  
ny bolig , med fordrøyning\septiktank,

★ **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig

- Overvann til terreng fordrøyning

🕒 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
25.12.2023

**Ferdigdato**  
06.03.2024

## Påkoblinger

---

★ **Vann**  
Nytt påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Ny påkobling på kommunal ledning

**Påkobling:**  
connectionPointType\_TRO (TRO)

**Kommunal ledning:**  
Vannledning (VL) SJK 150mm #2001

★ **Spillvann**  
Nytt påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Ny påkobling på kommunal ledning

**Påkobling:**  
connectionPointType\_GRR (GRR)

**Kommunal ledning:**  
Spillvannsledning (SP) PVC 200mm #23495

## Utvendig utstyr

---

### ● Kommentar

Tekst: fordrøyningsmagasin , monterest

### ● Slamavskiller

Material: Prefabr. kompositt, Kjegle: Rett kjegle, Kumbredde: 2mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Volum: 4l



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Kumbredde: 110mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning

Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning


Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



## Generert skisse

pdf Kartskisse med tegnforklaring - 140/209 Kvednahaugvegen 16

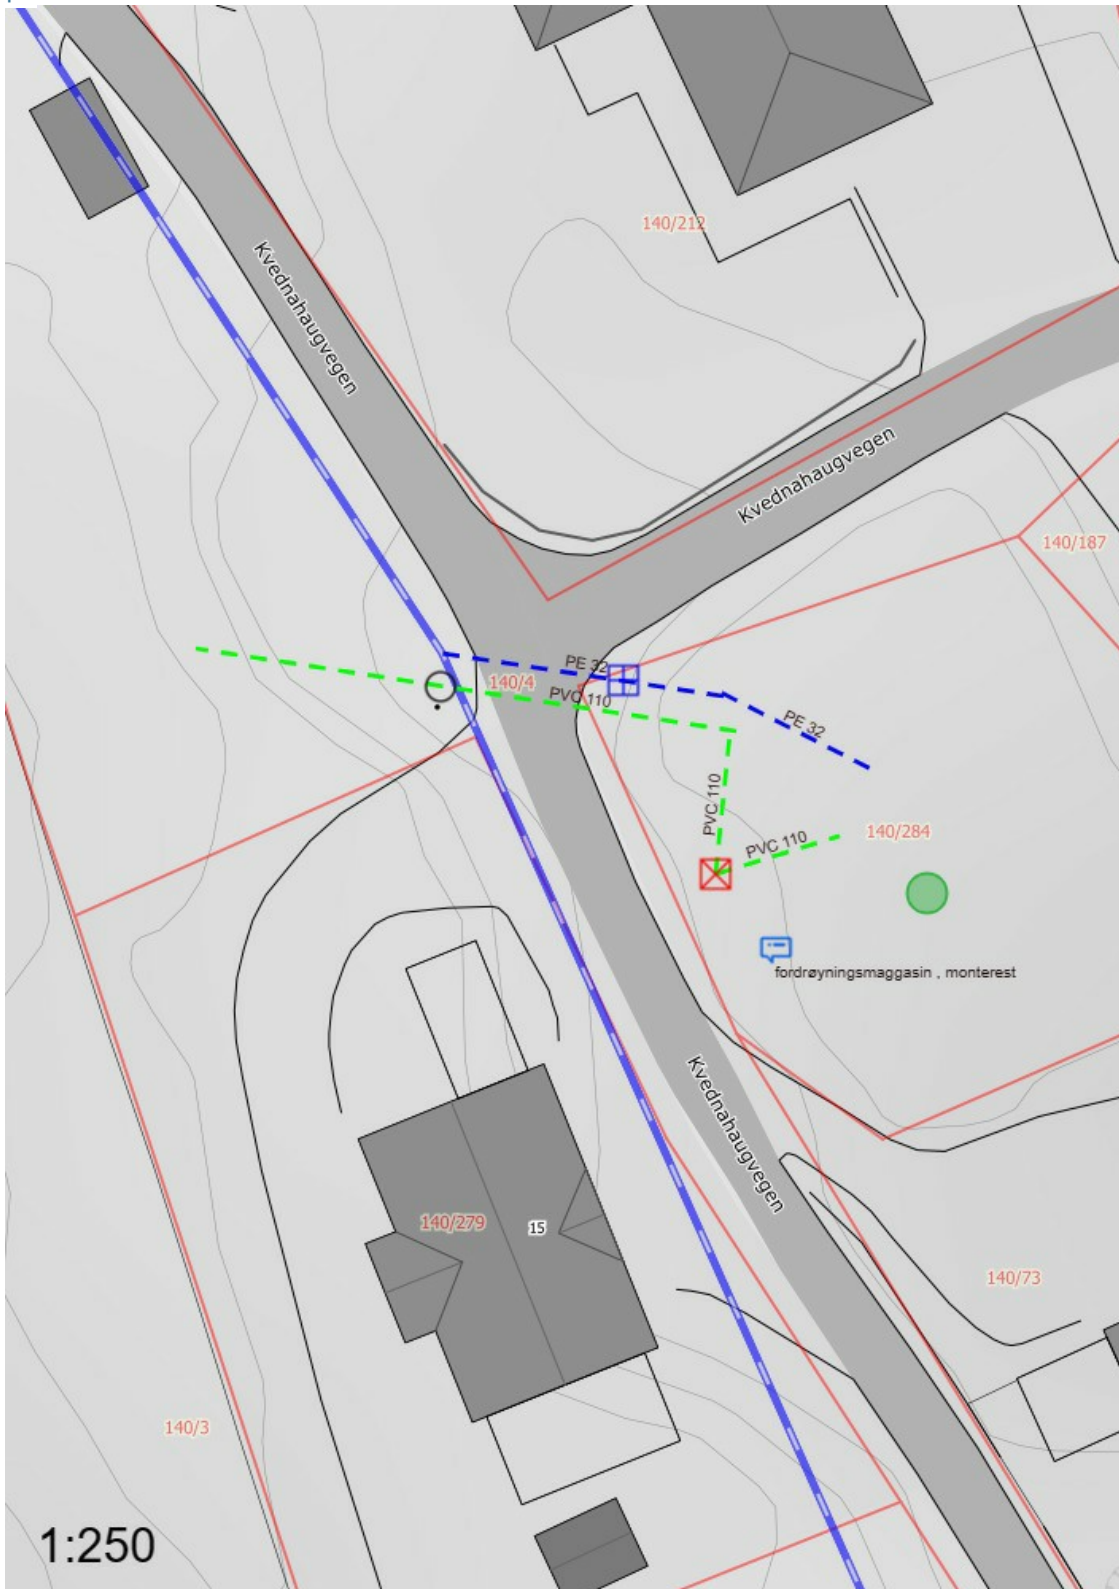

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

## Vedlegg

---

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

4 m3 septiktank monterest , fordrøyningsmagasin
