


## Avklaring av masser A og B

### Utfyllingsmasser

Avklaring tilknyttet innholdet i masseuttak sone A og B består av sprengt fjell. De to markerte områdene vil bli rensket for løsmasse og deretter sprengt ned til søkt nivå, så er det de rene sprengsteinsmassene som skal brukes til fylling. (iht. [geo.ngu.no](http://geo.ngu.no) bestående av Gabbro), eventuelle fremmed elementer som plastrester fra sprengningsarbeidet og annet vil bli samlet opp innenfor siltgardin.

### Tiltakets varighet

Det er ønsket å starte så tidlig som mulig i 2024, siden arbeidet ikke kan strekke seg ut over hekkingsperioden som starter i 15 april og arbeidet er anslått til å ta ca. 3 måneder. Dersom arbeidet ikke er ferdig innen denne dato, må eventuelt resterende arbeid stoppe opp under hekkingsperioden og forsetter etter 15 august.

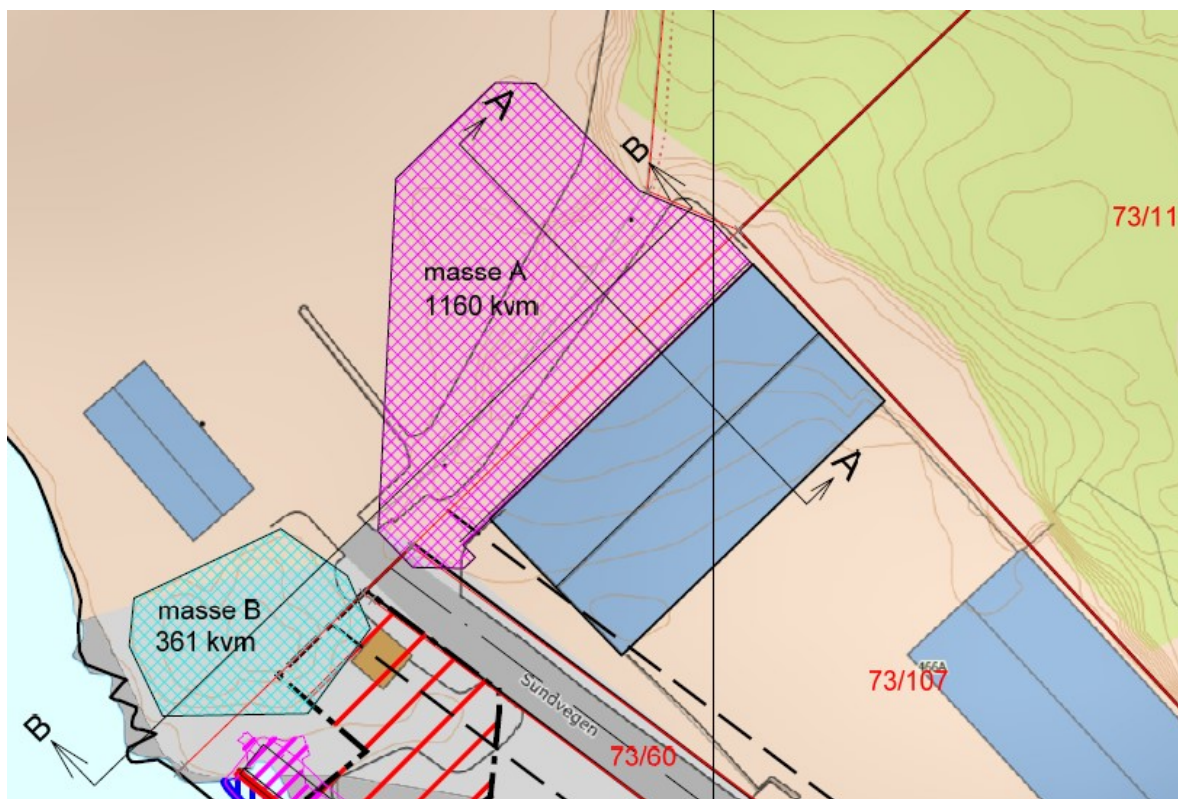

Figur 01 - Strømførende linje 73/106
