

09.03.2023

Beliggenhetskontroll av: Gnr: 86 Bnr: 246 Kommune: Karmøy

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering

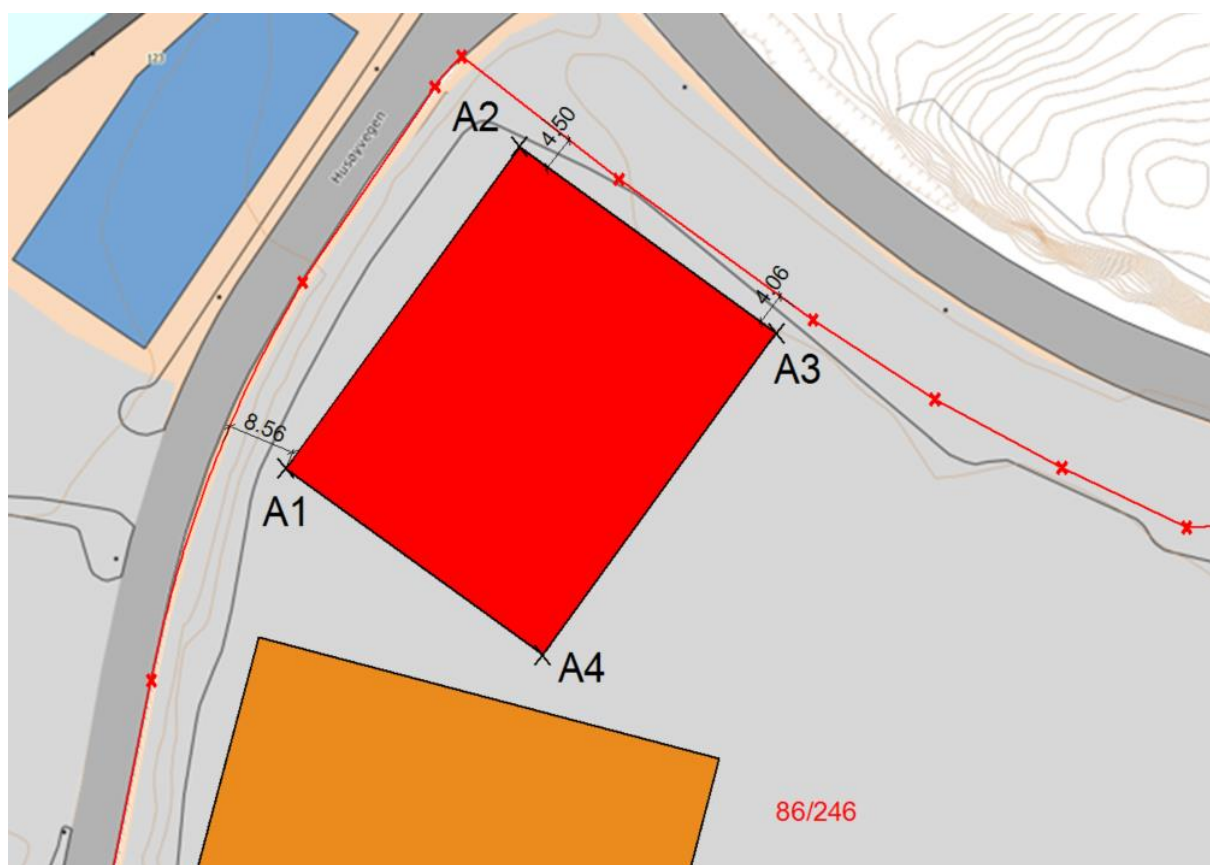

Id	Øst	Nord	S_OBJID	OBJTYPE
1	288970,246	6583956,814	A1	Grunnmur
2	288999,716	6583997,429	A2	Grunnmur
3	289032,131	6583973,908	A3	Grunnmur
4	289002,661	6583933,293	A4	Grunnmur

Innmålt, As-built

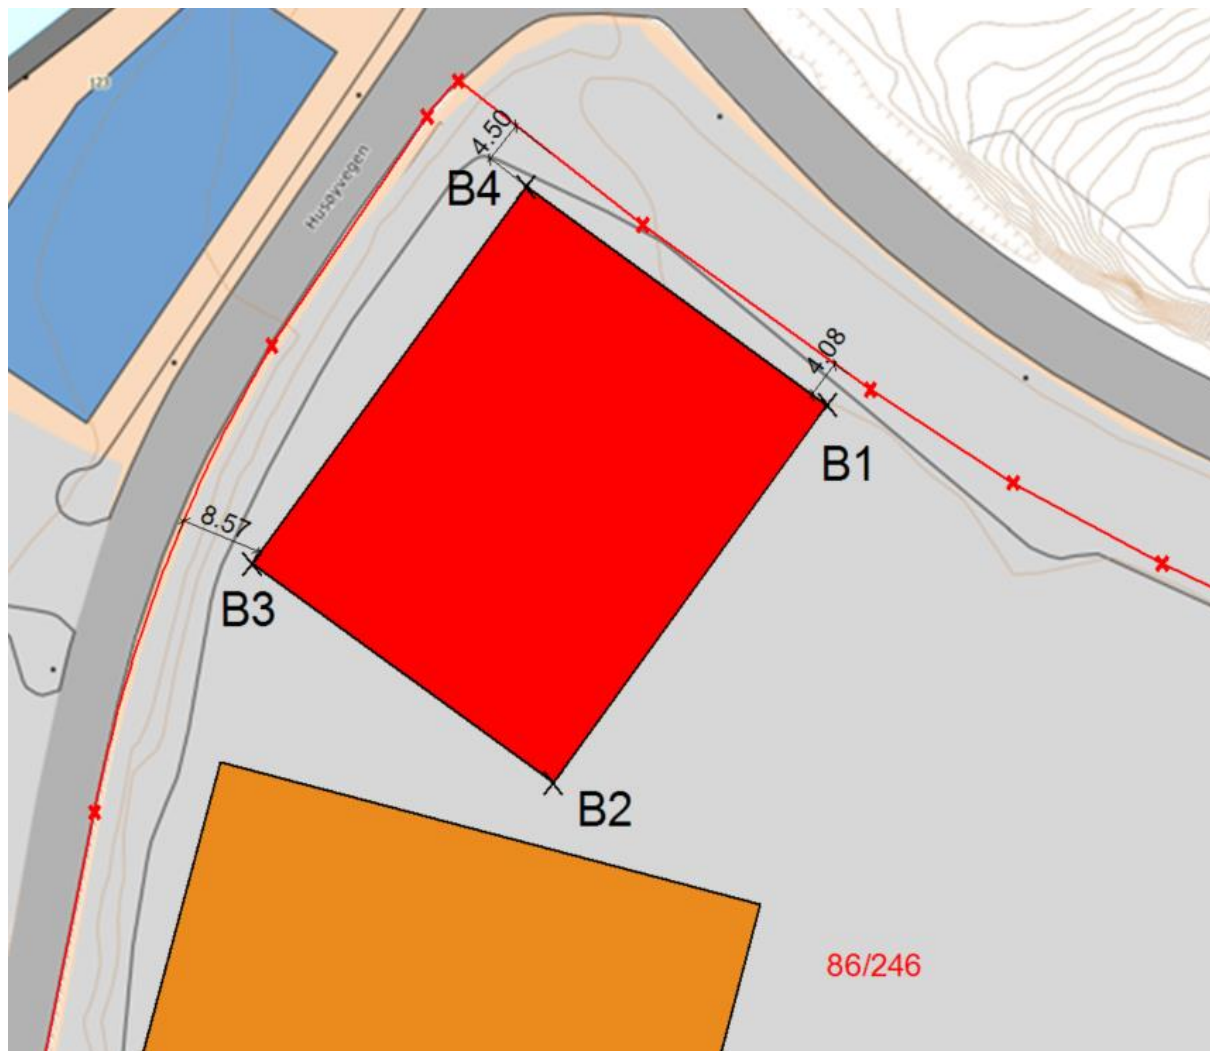

Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	289032,125	6583973,889	5,39	B1	Grunnmur
2	289002,644	6583933,282	5,39	B2	Grunnmur
3	288970,233	6583956,813	5,39	B3	Grunnmur
4	288999,716	6583997,418	5,39	B4	Grunnmur

Koordinatsystem: UTM(EUREF89) - SONE 32

09.03.2023

PunktID	Prosjekterte data							
	Nord	Øst	Høyde					
	Kontrollerte data			DIFFERANSE				
	Nord	Øst	Høyde	Nord	Øst	2D	Retning	Høyde
A3	6 583 973,908	289 032,131						
B1	6 583 973,889	289 032,125		-0,019	-0,006	0,020	219,4	
A4	6 583 933,294	289 002,661						
B2	6 583 933,282	289 002,644		-0,012	-0,017	0,021	261,7	
A1	6 583 956,814	288 970,246						
B3	6 583 956,813	288 970,233		-0,001	-0,013	0,013	293,4	
A2	6 583 997,429	288 999,716						
B4	6 583 997,418	288 999,716		-0,011	0,000	0,011	199,1	
