

02.11.2022

Beliggenhetskontroll av: Gnr:69 Bnr:91 Kommune: Karmøy kommune

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING

BELIGENGETSKONTROLL

Prosjektert plassering

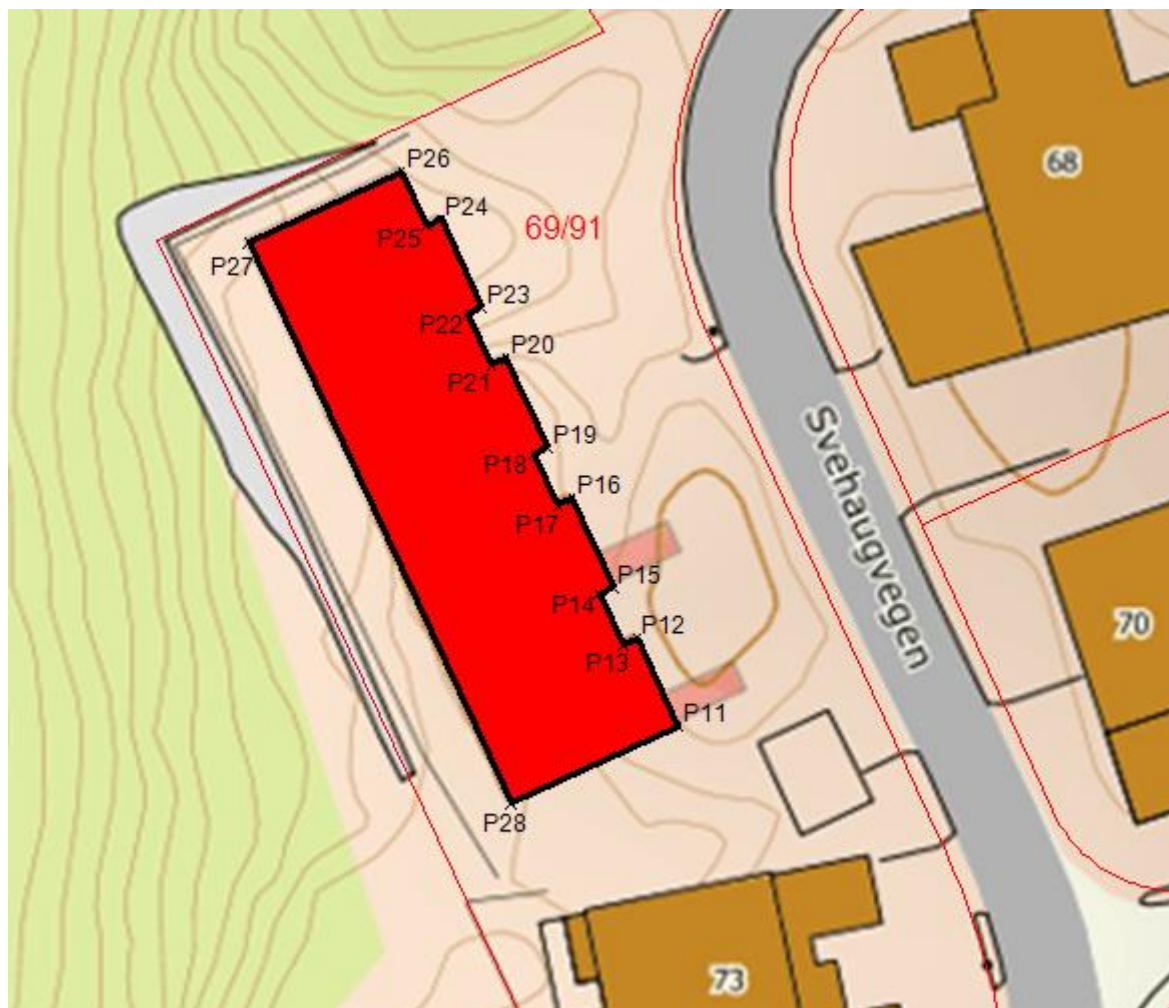

Id	Øst	Nord	S_OBJID	OBJTYPE
19	287936,948	6577924,604	P28	Grunnmur
20	287923,263	6577953,875	P27	Grunnmur
21	287931,231	6577957,6	P26	Grunnmur
22	287932,554	6577954,77	P25	Grunnmur
23	287933,279	6577955,109	P24	Grunnmur
24	287935,432	6577950,505	P23	Grunnmur
25	287934,707	6577950,166	P22	Grunnmur
26	287935,964	6577947,476	P21	Grunnmur
27	287936,689	6577947,815	P20	Grunnmur
28	287938,85	6577943,192	P19	Grunnmur

29	287938,126	6577942,853	P18	Grunnmur
30	287939,383	6577940,164	P17	Grunnmur
31	287940,108	6577940,503	P16	Grunnmur
32	287942,269	6577935,88	P15	Grunnmur
33	287941,544	6577935,541	P14	Grunnmur
34	287942,802	6577932,852	P13	Grunnmur
35	287943,527	6577933,19	P12	Grunnmur
36	287945,641	6577928,668	P11	Grunnmur

Innmålt, As-built



Id	Øst	Nord	Høyde	OBJTYPE	S_OBJID
1	287923,077	6577953,72	23,587	Bygning	A1
2	287931,045	6577957,45	23,587	Bygning	A2
3	287945,454	6577928,51	23,587	Bygning	A3
4	287936,761	6577924,45	23,587	Bygning	A4

5	287932,368	6577954,62	23,587	Bygning	A5
6	287933,092	6577954,96	23,587	Bygning	A6
7	287935,245	6577950,35	23,587	Bygning	A7
8	287934,52	6577950,01	23,587	Bygning	A8
9	287935,778	6577947,32	23,587	Bygning	A9
10	287936,502	6577947,66	23,587	Bygning	A10
11	287938,663	6577943,04	23,587	Bygning	A11
12	287937,939	6577942,7	23,587	Bygning	A12
13	287939,196	6577940,01	23,587	Bygning	A13
14	287939,921	6577940,35	23,587	Bygning	A14
15	287942,082	6577935,73	23,587	Bygning	A15
16	287941,357	6577935,39	23,587	Bygning	A16
17	287942,615	6577932,7	23,587	Bygning	A17
18	287943,339	6577933,04	23,587	Bygning	A18
