

17.02.2023

Beliggenhetskontroll av: Gnr: 149 Bnr: 518 Kommune: Karmøy

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering

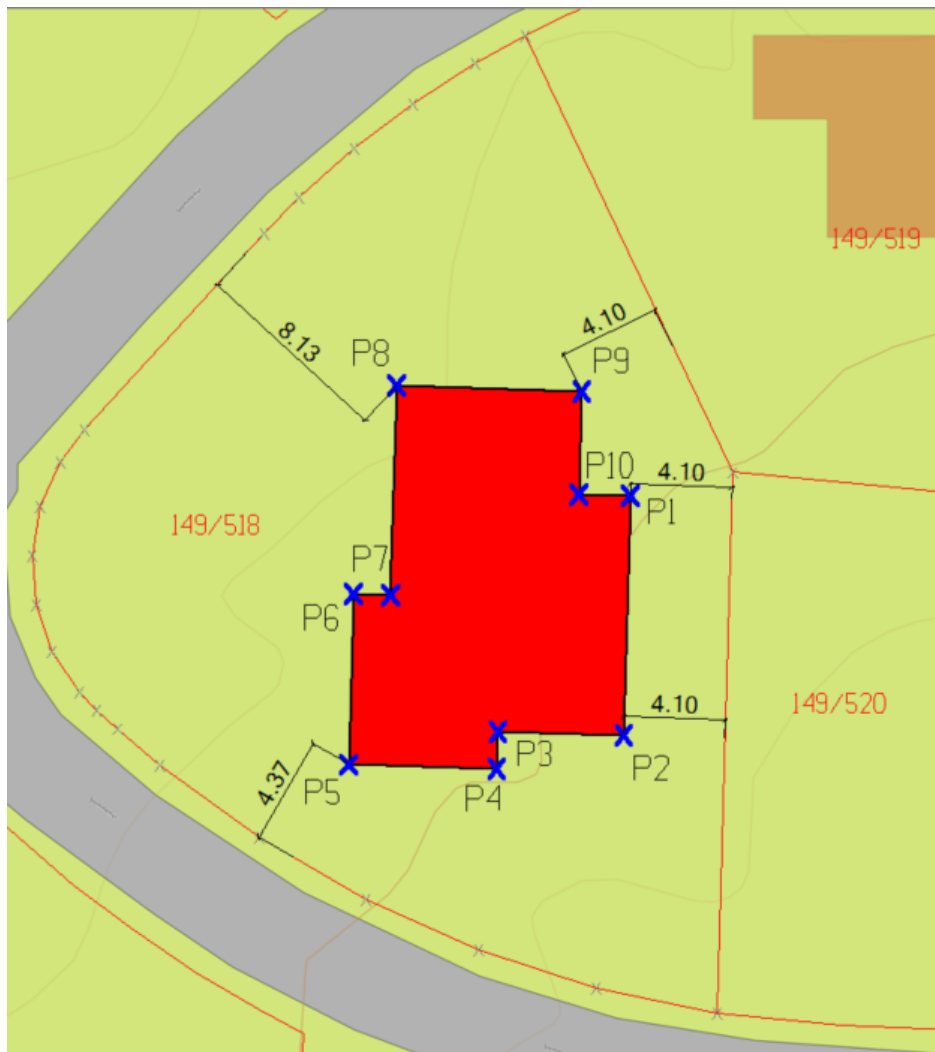

Id	Øst	Nord	S_OBJID	OBJTYPE
1	291809,351	6588553,804	P1	Grunnmur
2	291809,072	6588544,108	P2	Grunnmur
3	291803,974	6588544,255	P3	Grunnmur
4	291803,931	6588542,755	P4	Grunnmur
5	291797,934	6588542,928	P5	Grunnmur
6	291798,132	6588549,825	P6	Grunnmur
7	291799,631	6588549,782	P7	Grunnmur
8	291799,875	6588558,278	P8	Grunnmur
9	291807,372	6588558,063	P9	Grunnmur
10	291807,251	6588553,864	P10	Grunnmur

Innmålt, As-built

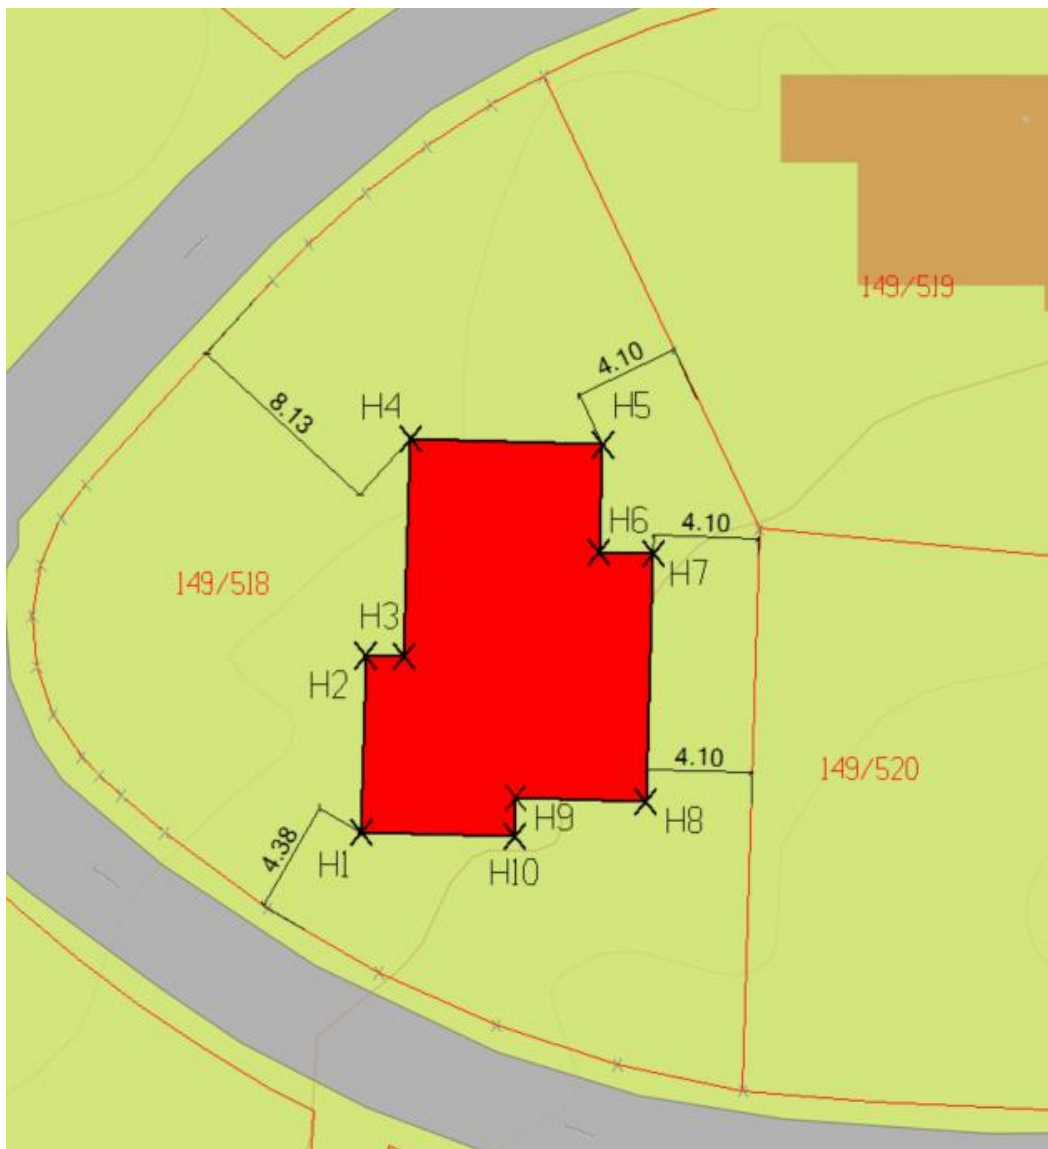

Id	Øst	Nord	Høyde	OBJTYPE
1	291797,962	6588542,920	75,06	Grunnmur
2	291798,123	6588549,818	75,06	Grunnmur
3	291799,625	6588549,786	75,06	Grunnmur
4	291799,881	6588558,277	75,06	Grunnmur
5	291807,378	6588558,051	75,06	Grunnmur
6	291807,244	6588553,858	75,06	Grunnmur
7	291809,347	6588553,797	75,06	Grunnmur
8	291809,071	6588544,118	75,06	Grunnmur
9	291803,973	6588544,264	75,06	Grunnmur
10	291803,960	6588542,764	75,06	Grunnmur

PunktID	Prosjekterte data			DIFFERANSE			
	Nord	Øst	Høyde	Nord	Øst	2D	Retning Høyde
	Kontrollerte data						
	Nord	Øst	Høyde				
P6	6 588 549,825	291 798,131					
H2	6 588 549,818	291 798,123		-0,007	-0,008	0,011	257,5
P7	6 588 549,782	291 799,631					
H3	6 588 549,786	291 799,625		0,004	-0,006	0,007	340,0
P8	6 588 558,278	291 799,875					
H4	6 588 558,277	291 799,881		-0,001	0,006	0,006	112,3
P9	6 588 558,063	291 807,372					
H5	6 588 558,051	291 807,378		-0,012	0,006	0,013	170,1
P10	6 588 553,864	291 807,251					
H6	6 588 553,858	291 807,244		-0,006	-0,007	0,009	254,4
P1	6 588 553,804	291 809,351					
H7	6 588 553,797	291 809,347		-0,007	-0,004	0,008	229,4
P2	6 588 544,108	291 809,072					
H8	6 588 544,118	291 809,071		0,010	-0,001	0,010	392,6
P3	6 588 544,255	291 803,974					
H9	6 588 544,264	291 803,973		0,009	-0,001	0,009	391,6
P5	6 588 542,927	291 797,933					
H1	6 588 542,920	291 797,962		-0,007	0,029	0,030	116,2
P4	6 588 542,756	291 803,931					
H10	6 588 542,764	291 803,960		0,008	0,029	0,030	82,1
