

17.02.2022

## Beliggenhetskontroll av: Gnr: 11 Bnr: 472 Kommune: Karmøy kommune

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

## INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

## PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:  
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

## UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


## BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering

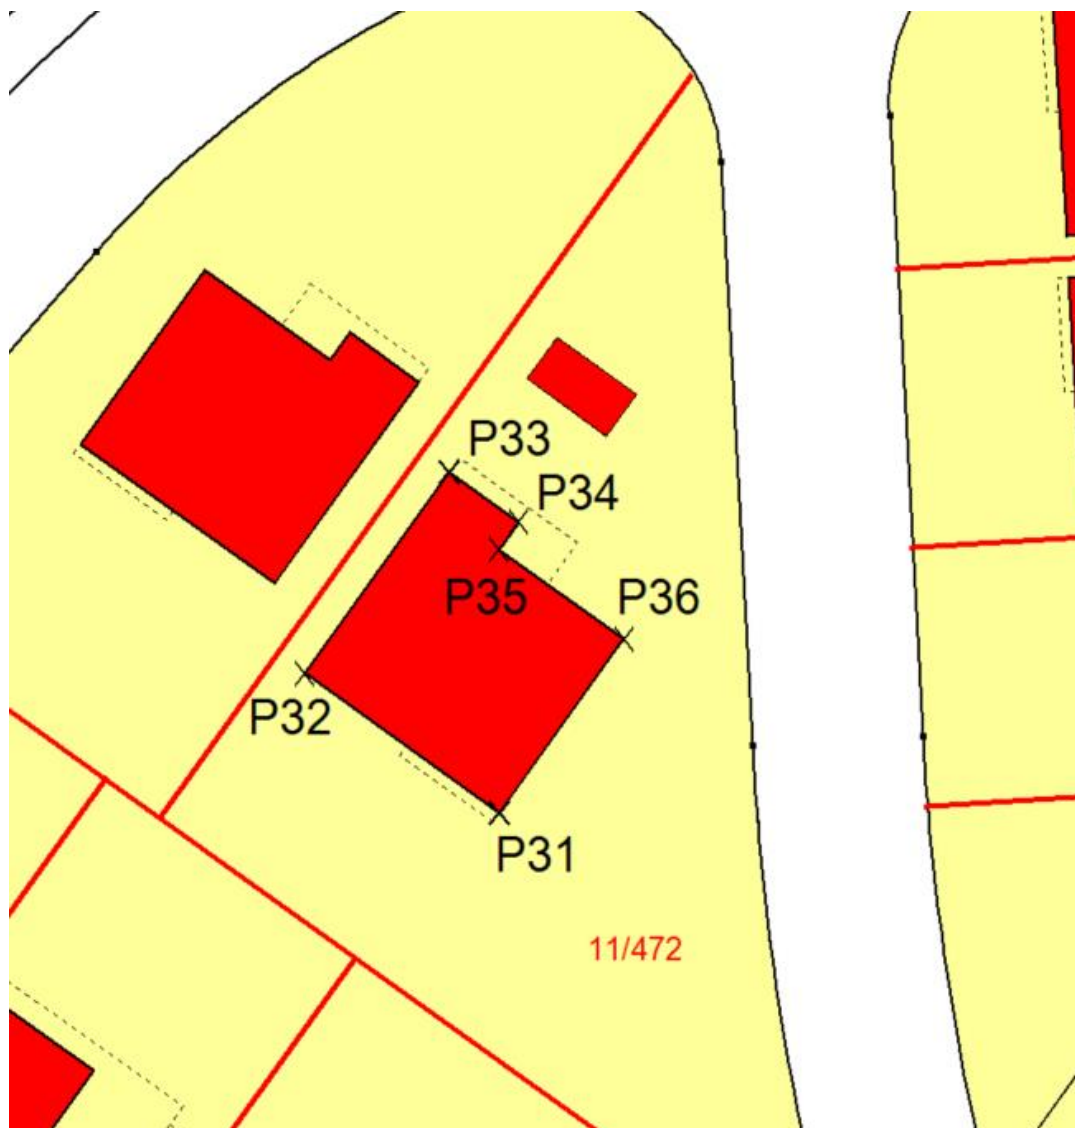

Id	Øst	Nord	S_OBJID	OBJTYPE
31	282932,286	6576898,135	P31	Grunnmur
32	282925,456	6576903,025	P32	Grunnmur
33	282930,521	6576910,099	P33	Grunnmur
34	282932,960	6576908,353	P34	Grunnmur
35	282932,262	6576907,377	P35	Grunnmur
36	282936,652	6576904,233	P36	Grunnmur

Innmålt, As-built

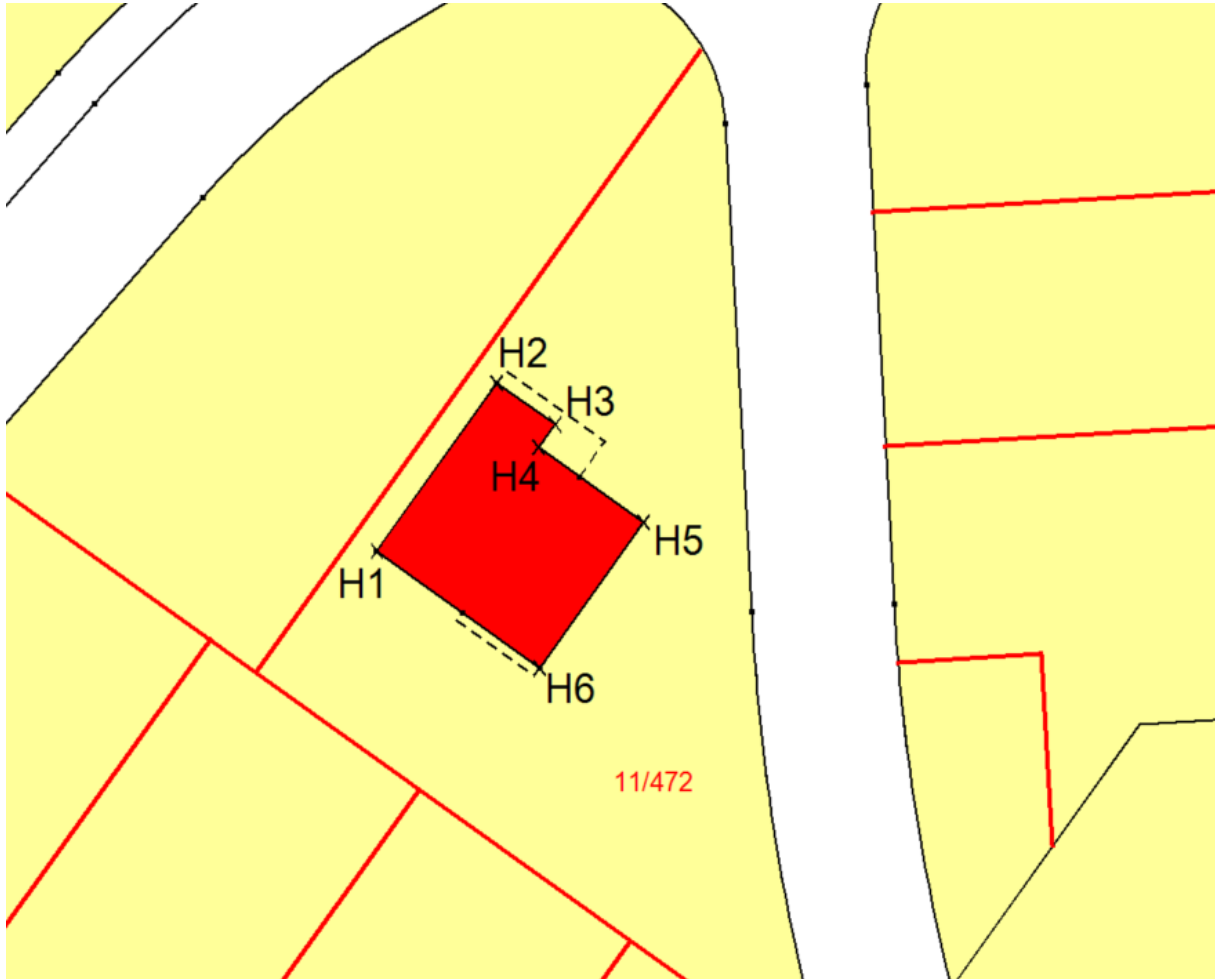

Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	282925,453	6576903,030	8,31	H1	Grunnmur
2	282930,503	6576910,088	8,31	H2	Grunnmur
3	282932,946	6576908,350	8,31	H3	Grunnmur
4	282932,251	6576907,393	8,31	H4	Grunnmur
5	282936,664	6576904,245	8,31	H5	Grunnmur
6	282932,285	6576898,114	8,31	H6	Grunnmur

PunktID	Prosjekterte data			DIFFERANSE			
	Nord	Øst	Høyde	Nord	Øst	2D	Retning Høyde
	Kontrollerte data						
	Nord	Øst	Høyde				
P32	6 576 903,025	282 925,456					
H1	6 576 903,030	282 925,453		0,005	-0,003	0,006	360,7
P34	6 576 908,353	282 932,960					
H3	6 576 908,350	282 932,946		-0,003	-0,014	0,014	288,8
P35	6 576 907,377	282 932,262					
H4	6 576 907,393	282 932,251		0,016	-0,011	0,019	362,5
P36	6 576 904,233	282 936,652					
H5	6 576 904,245	282 936,664		0,012	0,012	0,017	49,6
P31	6 576 898,135	282 932,286					
H6	6 576 898,114	282 932,285		-0,021	-0,001	0,021	203,2
P33	6 576 910,099	282 930,521					
H2	6 576 910,088	282 930,503		-0,011	-0,018	0,021	265,2
