



## Statens vegvesen

RAMUDDEN NORGE AS AVD LINDESNES  
Rødbergsveien 123  
4520 LINDESNES

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:  
23/98931-8

Deres referanse:

Vår dato:  
20.09.2023

### Tillatelse til arbeidsvarsling – PV1295 – Omkjøring – Stengt vei – Fase 1 – RAD – spesiell – KV1295, PV1293 – Rogaland – Karmøy – APV20235567-T3

Vi viser til søknad av: **19. september 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **BERTELSEN & GARPESTAD AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **21. september 2023 – 29. mars 2024** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

### Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Sikring for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Forbud – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkvakt – Gjelder i arbeidstiden

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Rennesøygata 16  
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4710 Torgarden  
7468 Trondheim

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

**Kommentar 1:** – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmaterieell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1 m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Sikring for myke trafikkanter – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Forbud – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

**Kommentar 1:** – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1 m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

### **Spesielle vilkår for arbeidsområdet:**

Avtaler med grunneier legges til grunn

Skilting gjelder privat veg, skilting/varsling på kommunal veg søkes kommunen

### **Informasjon til Vegtrafikksentralen**

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

### **Loggbok**

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til [apvrogaland@vegvesen.no](mailto:apvrogaland@vegvesen.no). Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

### **Dokumentasjon**

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

### **Generelle vilkår**

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

## Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt  
Hindermarkering  
Sikring for myke trafikanter  
Omkjøring stengt veg  
Forbud  
Trafikkvakt

Transport vest – transportforvaltning 2  
Med hilsen

Bjarte Børtveit  
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog  
Saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*


Kopi  
Arnt Helge Helgstad  
BERTELSEN & GARPESTAD AS  
RADOMIR ALEKSANDER DJURASINOVIC  
ROGALAND FYLKESKOMMUNE

# Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggstrafikk – Fase 1

Gjelder hele døgnet

Berørte beboere varsles av  
entreprenør om omkjørings tilgang

— Omkjøring til/fra eiendom —

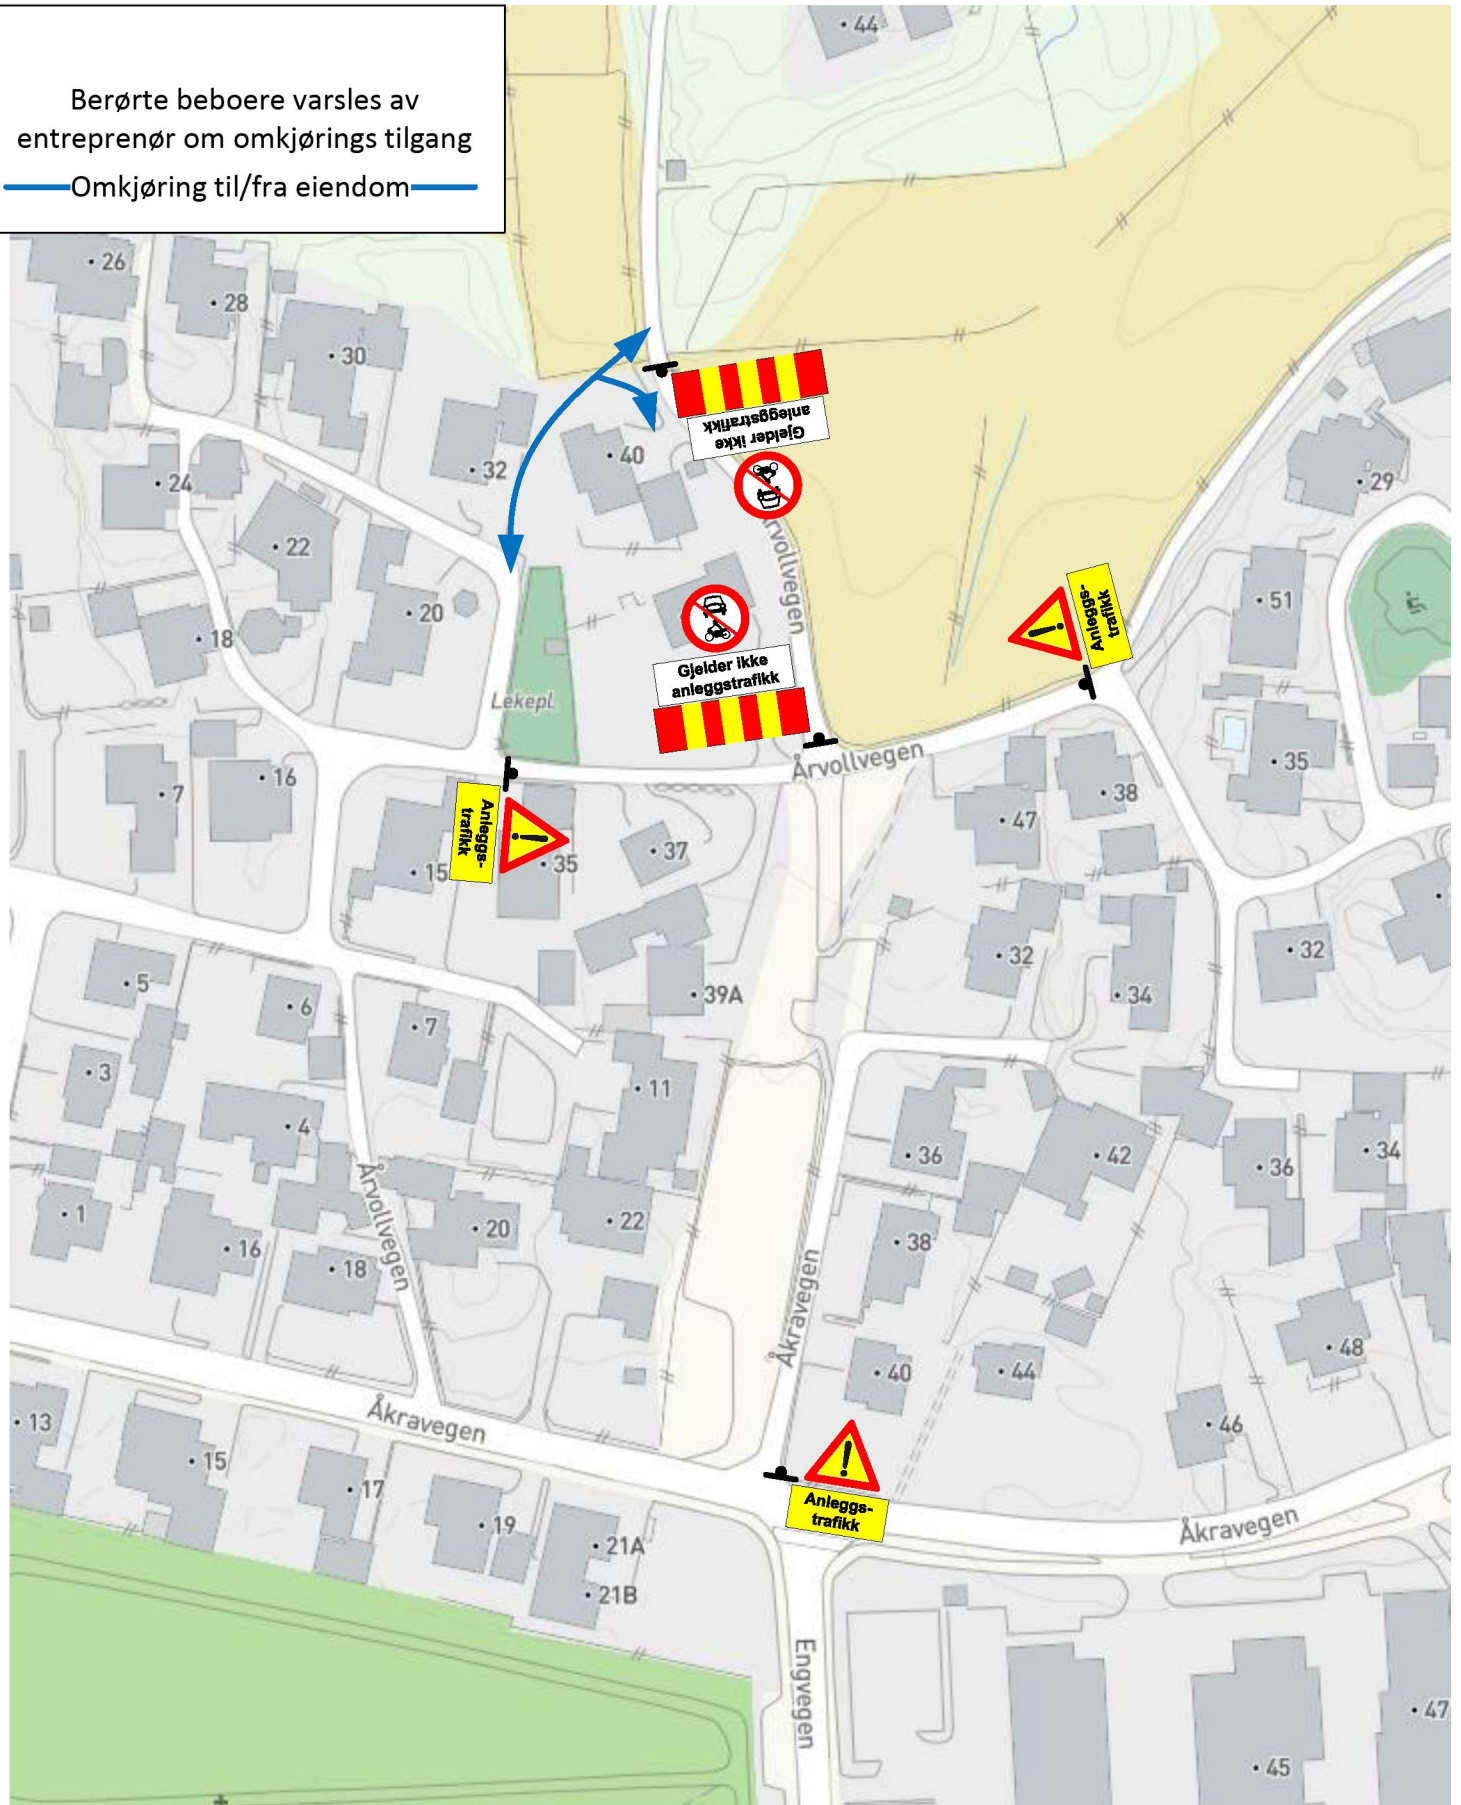




# Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggstrafikk – Fase 1

Gjelder hele døgnet

Berørte beboere varsles av  
entreprenør om omkjørings tilgang

— Omkjøring til/fra eiendom —

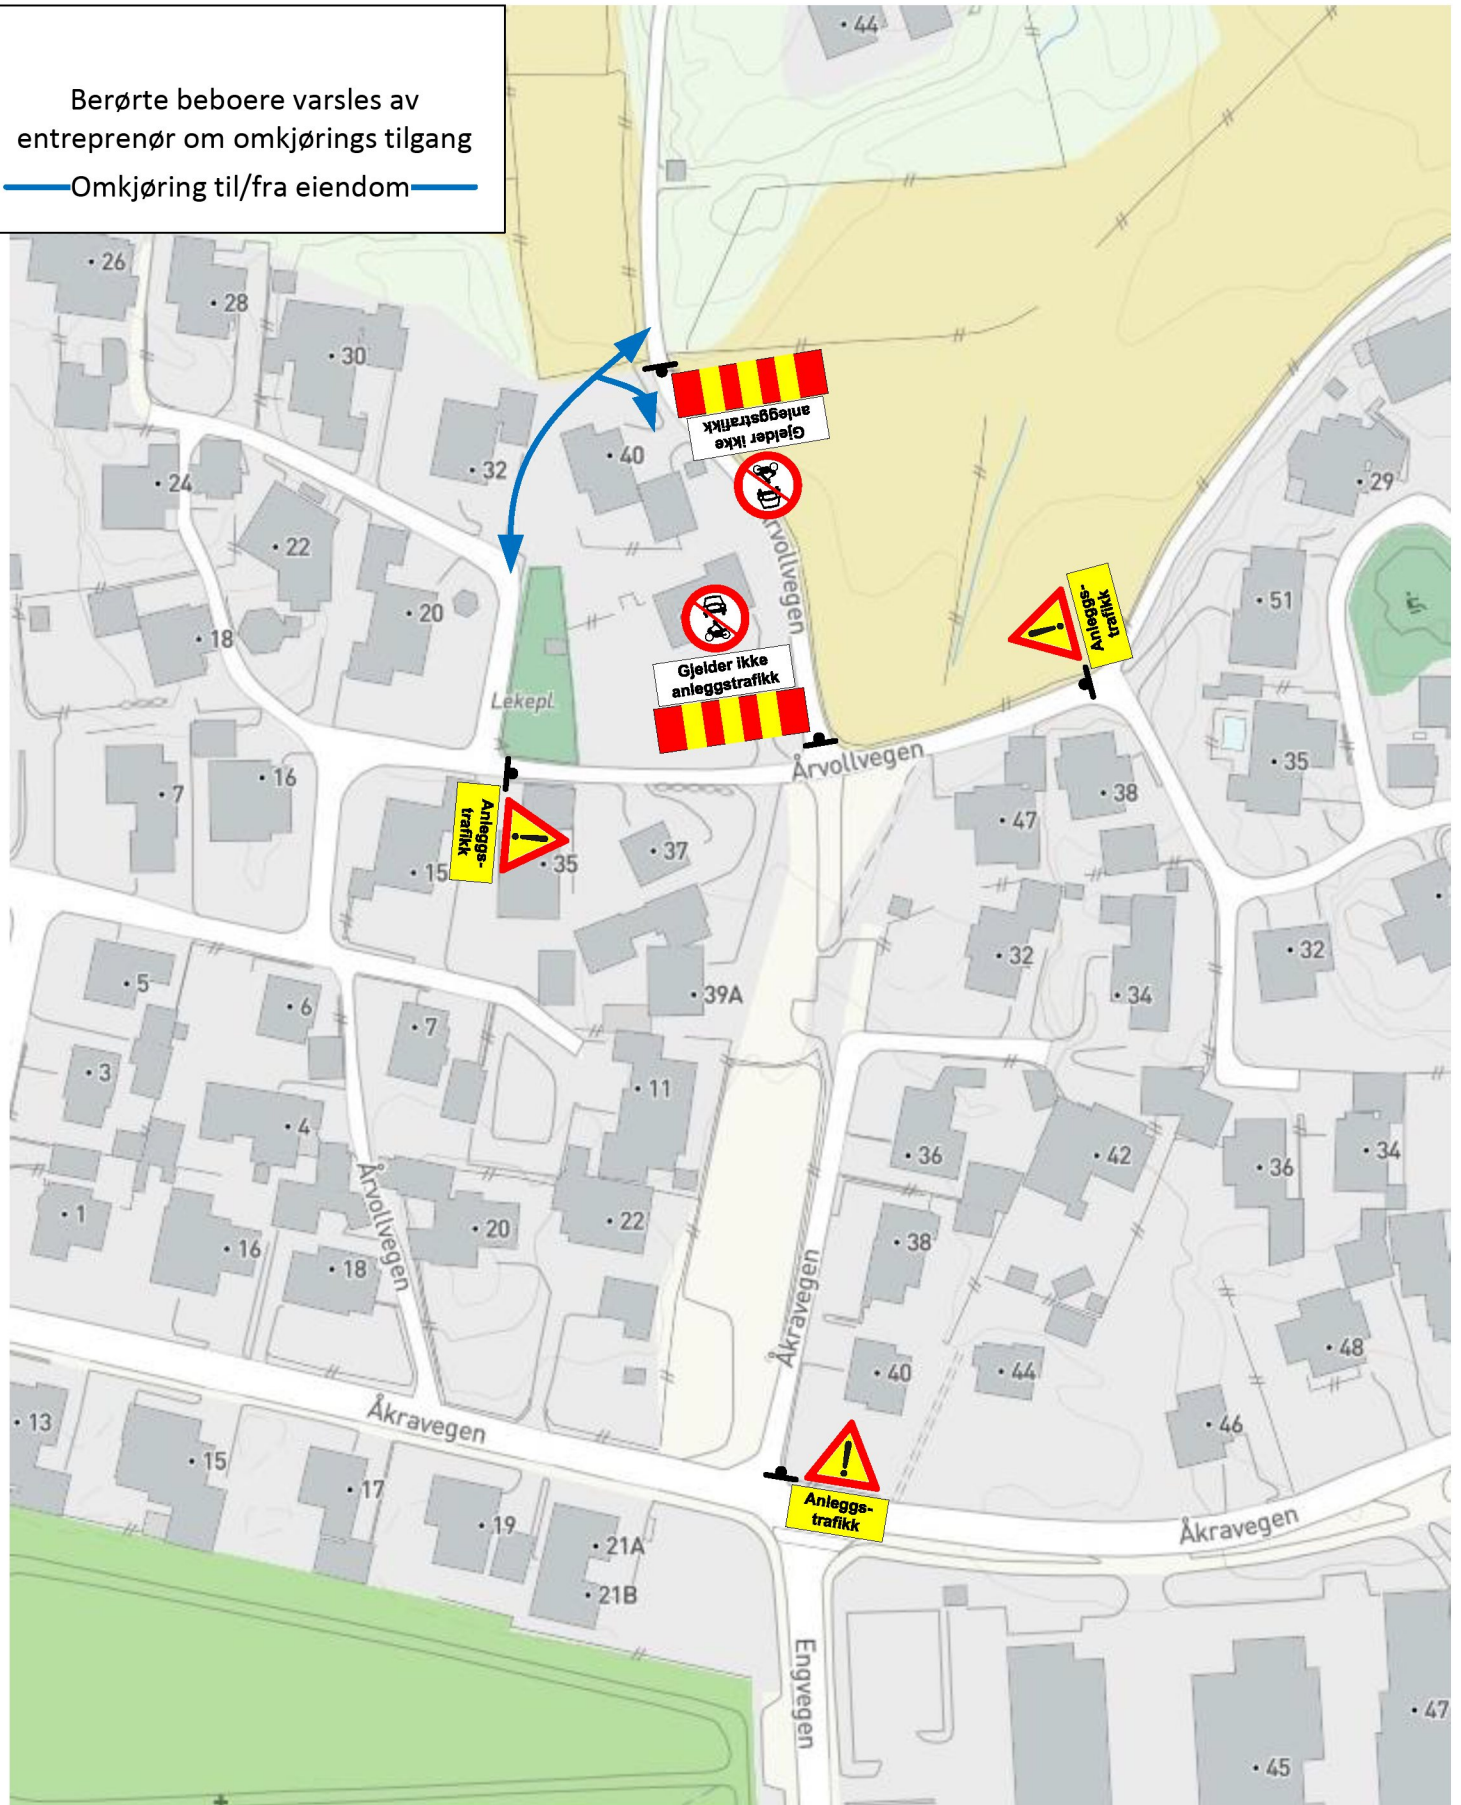

# Søknad om arbeidsvarsling

## PV1295 - Omkjøring - Stengt vei - Fase 1 - BG-HB

### Søknadsinformasjon

#### Begrunnelse for endring av søknad

Justere dato

#### Prosjekttittel

PV1295 - Omkjøring - Stengt vei - Fase 1 - BG-HB

#### Plantype

Spesiell

#### Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
Helge	Byberg	91 889177	helge.byberg@ramudden.no


### Område

#### Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	PV1295 S4D1 M78 (K)	30	-
	Til	PV1295 S4D1 M4 (K)		

#### Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	KV1295 S1D1 M67 (K)	30	-
Varslingspunkt 2	KV1295 S1D1 M179 (K)	30	-
Varslingspunkt 3	PV1293 S1D1 M2 (K)	40	-

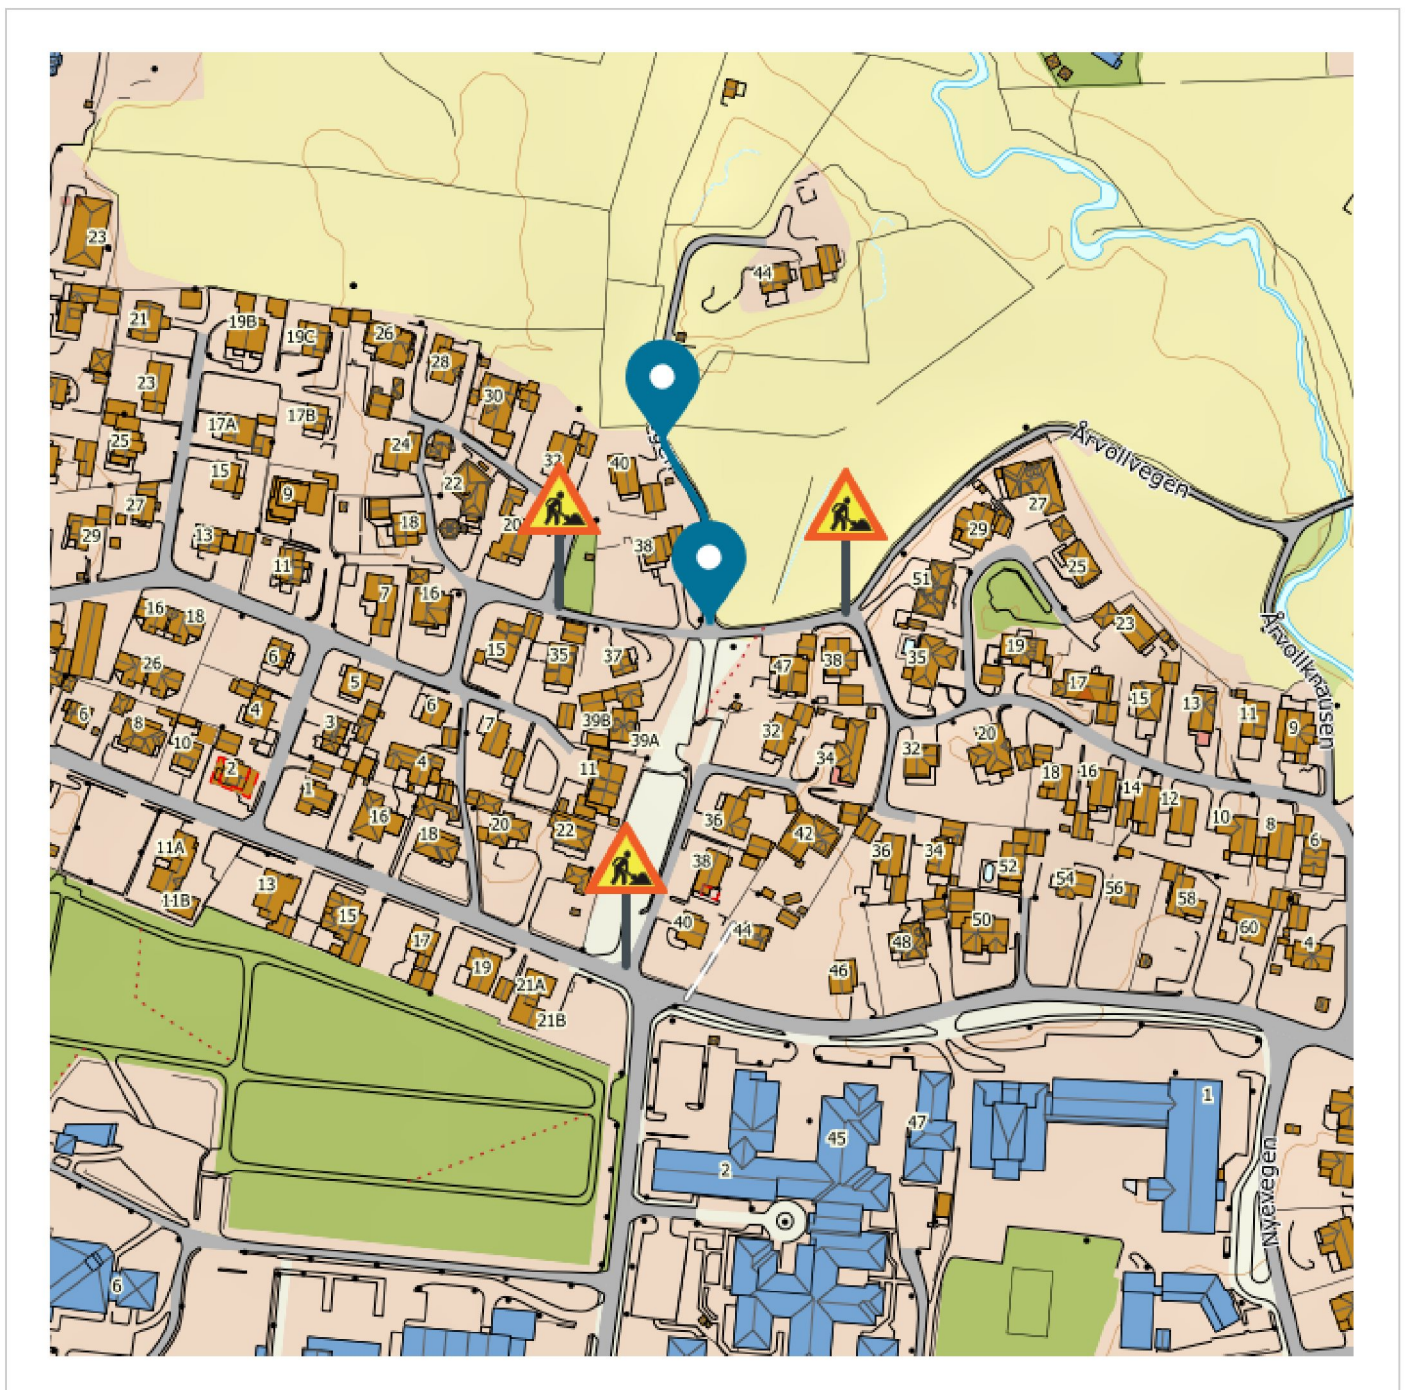



## Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
19.09.2023	29.03.2024	24 uker	Alle dager	Hele døgnet kl. 00:00—23:59

## Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

### Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

**Annet** – Diverse grøft arbeid og annet iht agder fk Åkra prosjekt.  
Ny vei / va og trekkørgrøfter

### Hvilke trafikanter ferdes i området?

**Fotgjengere**

**Syklister**

**Bilister**

**Tungtransport**

### Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

**Trafikkregulering** – Forbud

PV1295 skiltes med 306.1 + 808.319

Gjelder hele arbeidsperioden

**Trafikkregulering** – Trafikkvakt

Trafikkvakt for myke trafikanter må vurderes på stedet av entreprenør hvis det er til fare rundt åpne grop/grøft under arbeidstid.

Gjelder i arbeidstiden

**Stengt veg** – Omkjøring stengt veg

PV1295 stenges og midlertidig omkjøring for de 2 berørte eiendommene blir opprettet.

Gjelder hele arbeidsperioden

**Varsling** – Varsling/infoskilt

Berørte veier varsles med 156 +808.712

Gjelder hele arbeidsperioden

**Varsling** – Hindermarkering

Det settes opp sperrebukk på PV1295 med 306.1 + 808.319 og evt 906 for å sperre av veien og markere andre farer/hinder

Gjelder hele arbeidsperioden

**Sikring** – Myke trafikanter

Hvis det er åpne grøft/grop eller lignende som er til fare for myke trafikanter/beboere så skal disse sikres på en forsvarlig måte ved endt arbeidsdag.

Gjelder hele arbeidsperioden

## Kontaktinformasjon

### Byggherre

**Bedrift**

ROGALAND FYLKESKOMMUNE  
(971045698)

**Kontaktperson**

Martin Ramstad

**Telefonnummer**

45901020

**E-postadresse**

martin.ramstad@rogfk.no

### Utfører av arbeid

**Utførende entreprenør**

BERTELSEN & GARPESTAD AS  
(939015159)

**Ansvarlig for arbeidsvarsling**

BERTELSEN & GARPESTAD AS  
(939015159)

**E-postadresse til  
varslingsansvarlig**

Kenneth.rott@bg.no

### Ansvarshavende

Navn

Mobiltelefonnummer

E-postadresse

Kompetansebevis (gyldig til)

Arnt Helge Helgstad	92057334	arnthelge.hegelstad@bg.no	kurs_Arnt Helge Helgstad_Arnt Helge Helgstad, Kurs 2 – 08.04.26.jpg (08.04.2026)
---------------------	----------	---------------------------	--

### Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Lars Martin Vika	99543511	Lars.Martin.Vika@bg.no	kurs_Lars Martin Vika_Lars Martin Vika – Kurs 2 – 01.09.26.JPG (01.09.2026)

## Skisser

Skisse 1 – Skisse\_1\_Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggstrafikk – Fase 1 – GIA – RAD.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Forbud – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkvakt – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse\_2\_Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggstrafikk – Fase 1 – GUA – RAD.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Forbud – Gjelder utenfor arbeidstiden

## Tilleggsinformasjon

### Kommentar

Søkes om vedtak for skilt plassert på privat vei.

Vedlegg bekreftelse på bruk av privat tomt for omkjøring og div

Gravesøknad foreligger fra før ettersom dette er et rogaland fk prosjekt.

Kommunen er innforstått med prosjektet og har gitt tillatelser og vedtak for kommunale veier.
