



Statens vegvesen

Likelydende brev – se vedlagt liste

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/98931-2

Deres referanse:

Vår dato:
30.05.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – PV1295 – Omkjøring – Stengt vei – Fase 1 – RAD – spesiell – KV1295, PV1293 – Rogaland – Karmøy – APV20235567-T1

Vi viser til søknad av: **26. mai 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **BERTELSEN & GARPESTAD AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **26. mai 2023 – 26. juni 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Sikring for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Forbud – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkvakt – Gjelder i arbeidstiden

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden

Sikring for myke trafikanter – Gjelder utenfor arbeidstiden

Omkjøring stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden

Forbud – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1 m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

Avtaler med grunneier legges til grunn

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Hindermarkering
Sikring for myke trafikanter
Omkjøring stengt veg
Forbud
Trafikkvakt

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
RADOMIR ALEKSANDER DJURASINOVIC
RAMUDDEN AS AVD LINDESNESE, Rødbergsveien 123, 4520 LINDESNESE


Kopi
Arnt Helge Helgstad
Arnt Helge Helgstad
BERTELSEN & GARPESTAD AS
BERTELSEN & GARPESTAD AS
RADOMIR ALEKSANDER DJURASINOVIC
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggsstrafikk – Fase 1

Gjelder hele døgnet

Berørte beboere varsles av
entreprenør om omkjørings tilgang

— Omkjøring til/fra eiendom —

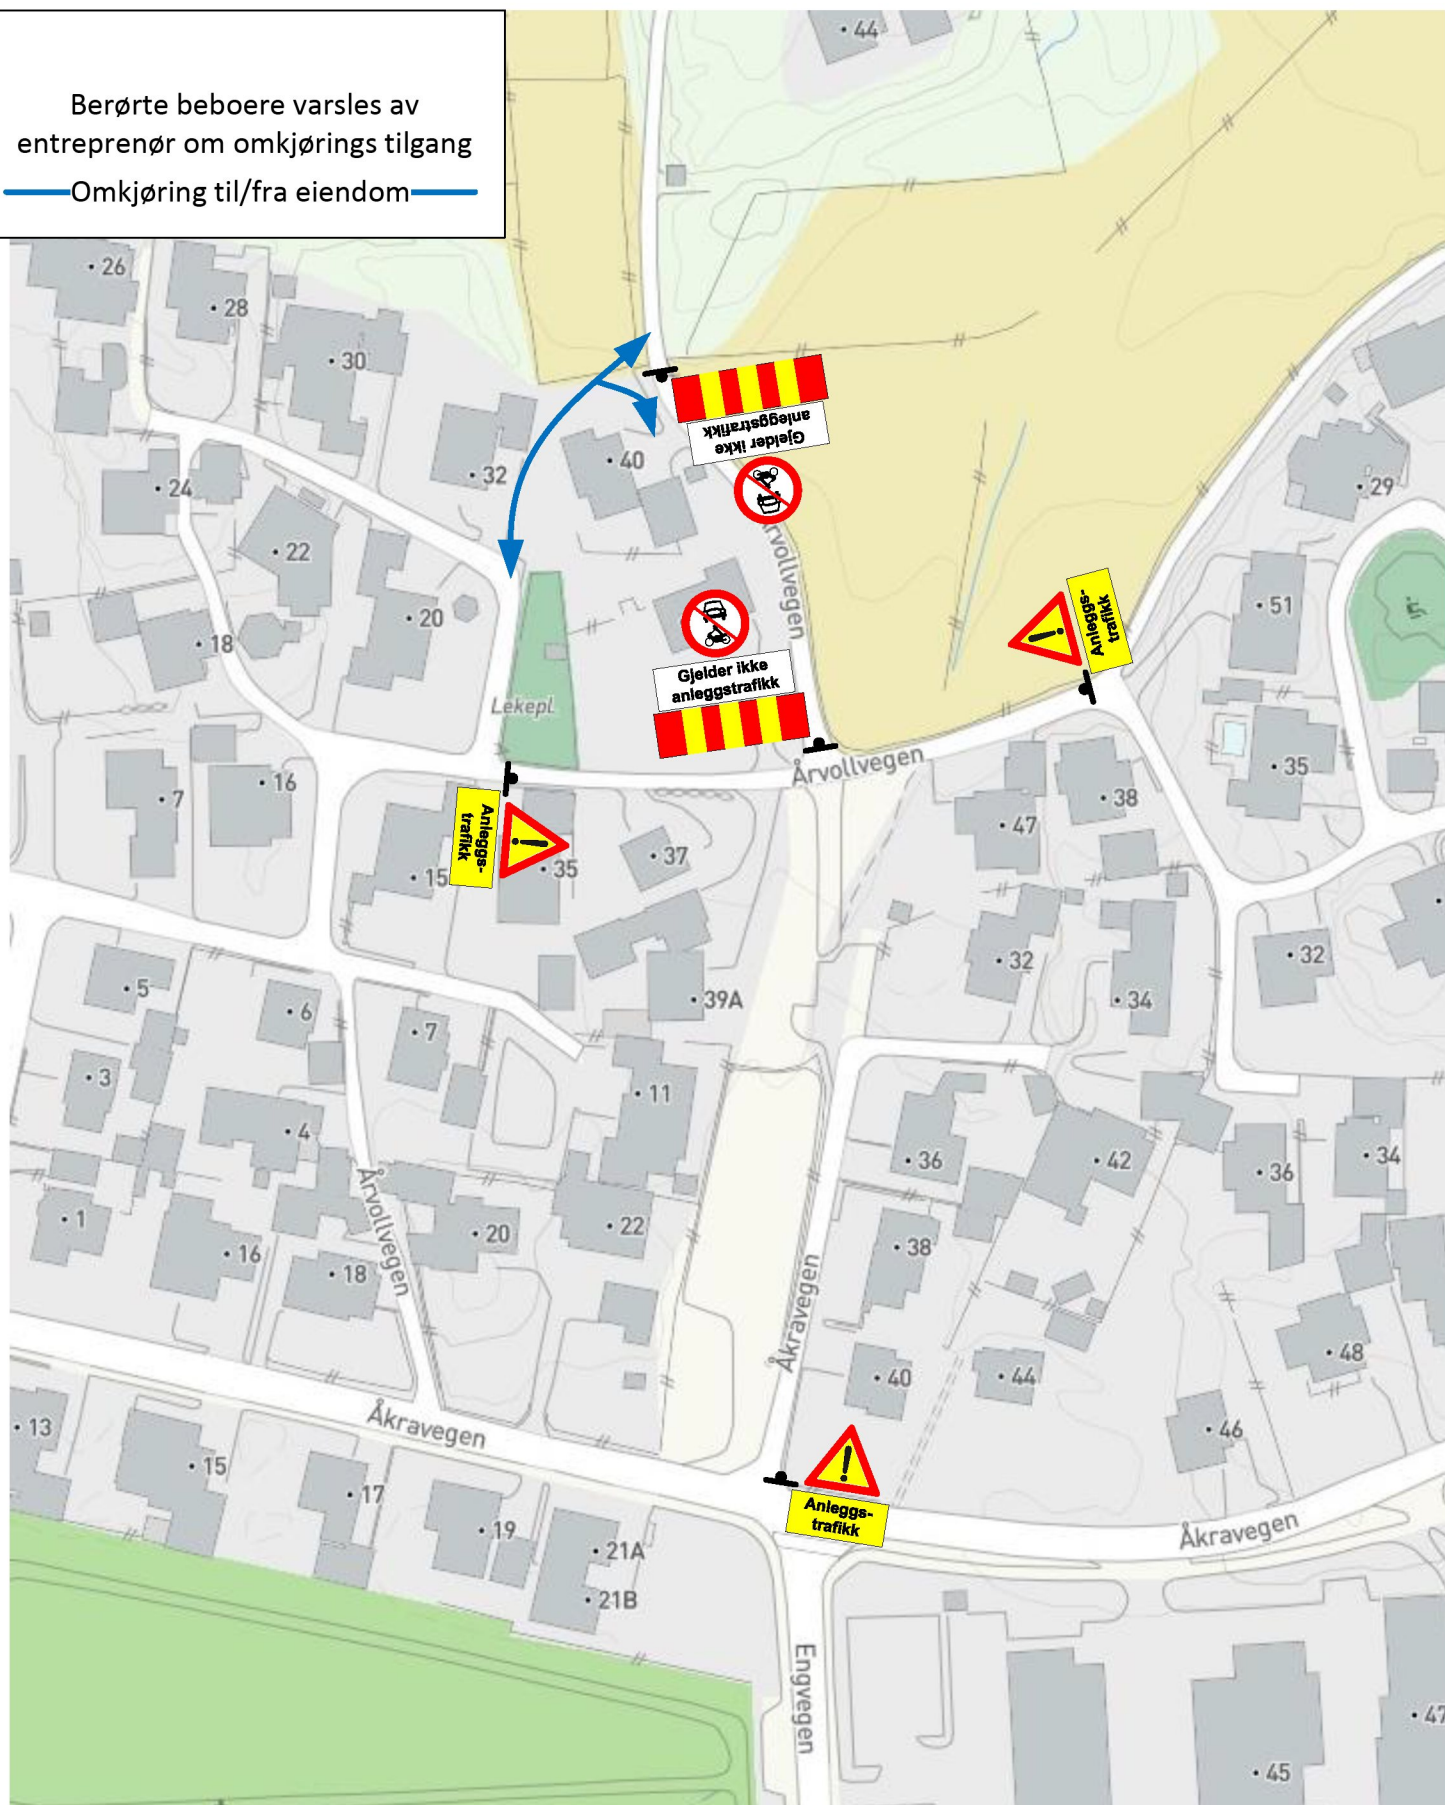


Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggsstrafikk – Fase 1

Gjelder hele døgnet

Berørte beboere varsles av
entreprenør om omkjørings tilgang

— Omkjøring til/fra eiendom —

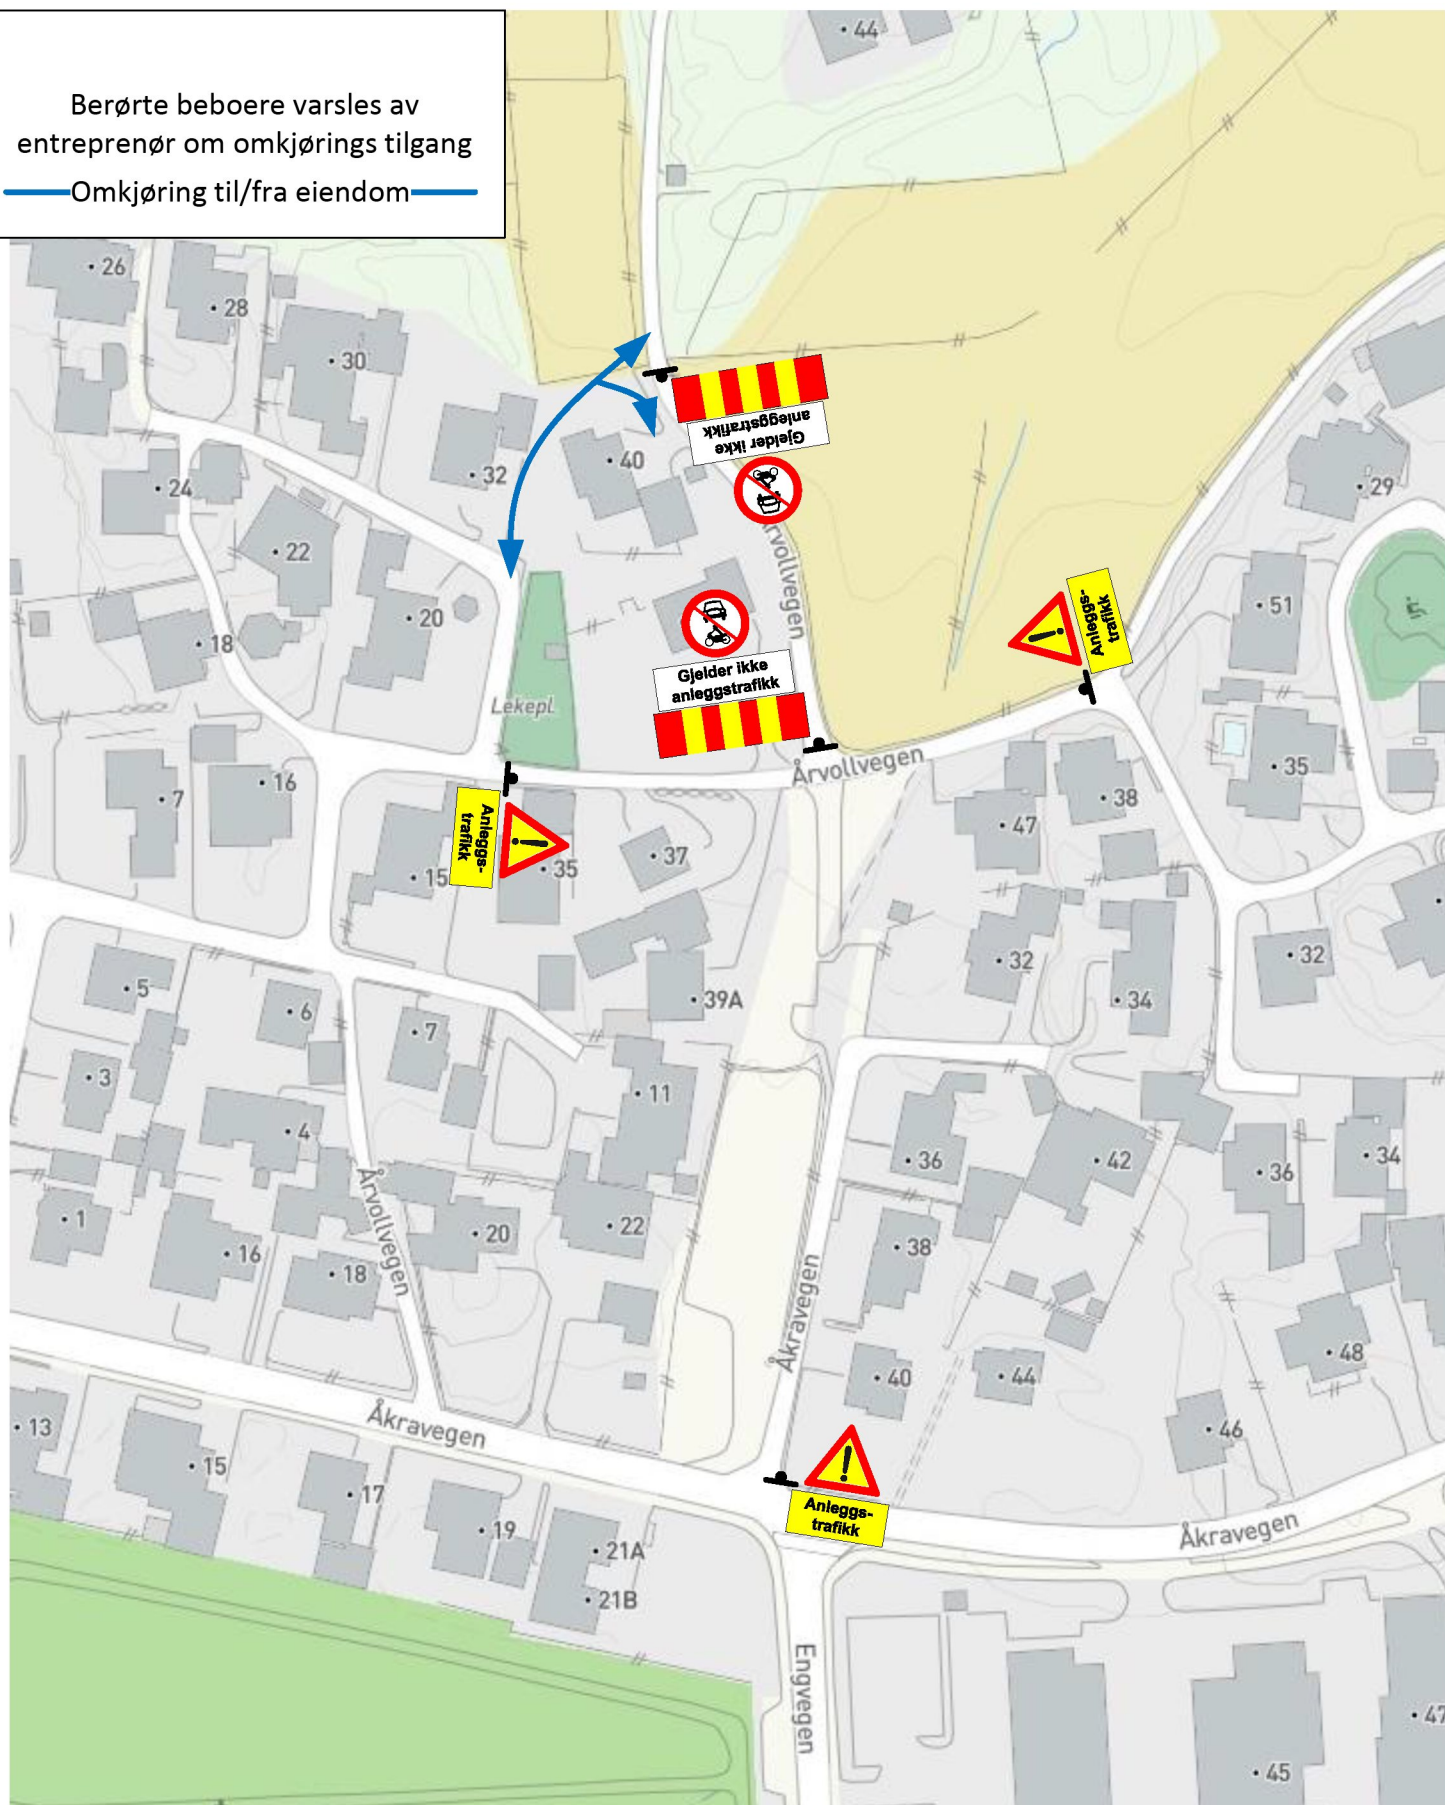

Søknad om arbeidsvarsling

PV1295 - Omkjøring - Stengt vei - Fase 1 - RAD

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

PV1295 – Omkjøring – Stengt vei – Fase 1 – RAD

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

RADOMIR ALEKSANDER

Etternavn

DJURASINOVIC

Telefonnummer


98654145

E-postadresse

Radomir.Aleksander@Ramudden.no

Område

Arbeidsområde				
Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	PV1295 S4D1 M78 (K)	30	–
	Til	PV1295 S4D1 M4 (K)		
Vegarbeidsområde				
Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT	
Varslingspunkt 1	KV1295 S1D1 M67 (K)	30	–	
Varslingspunkt 2	KV1295 S1D1 M179 (K)	30	–	
Varslingspunkt 3	PV1293 S1D1 M2 (K)	40	–	

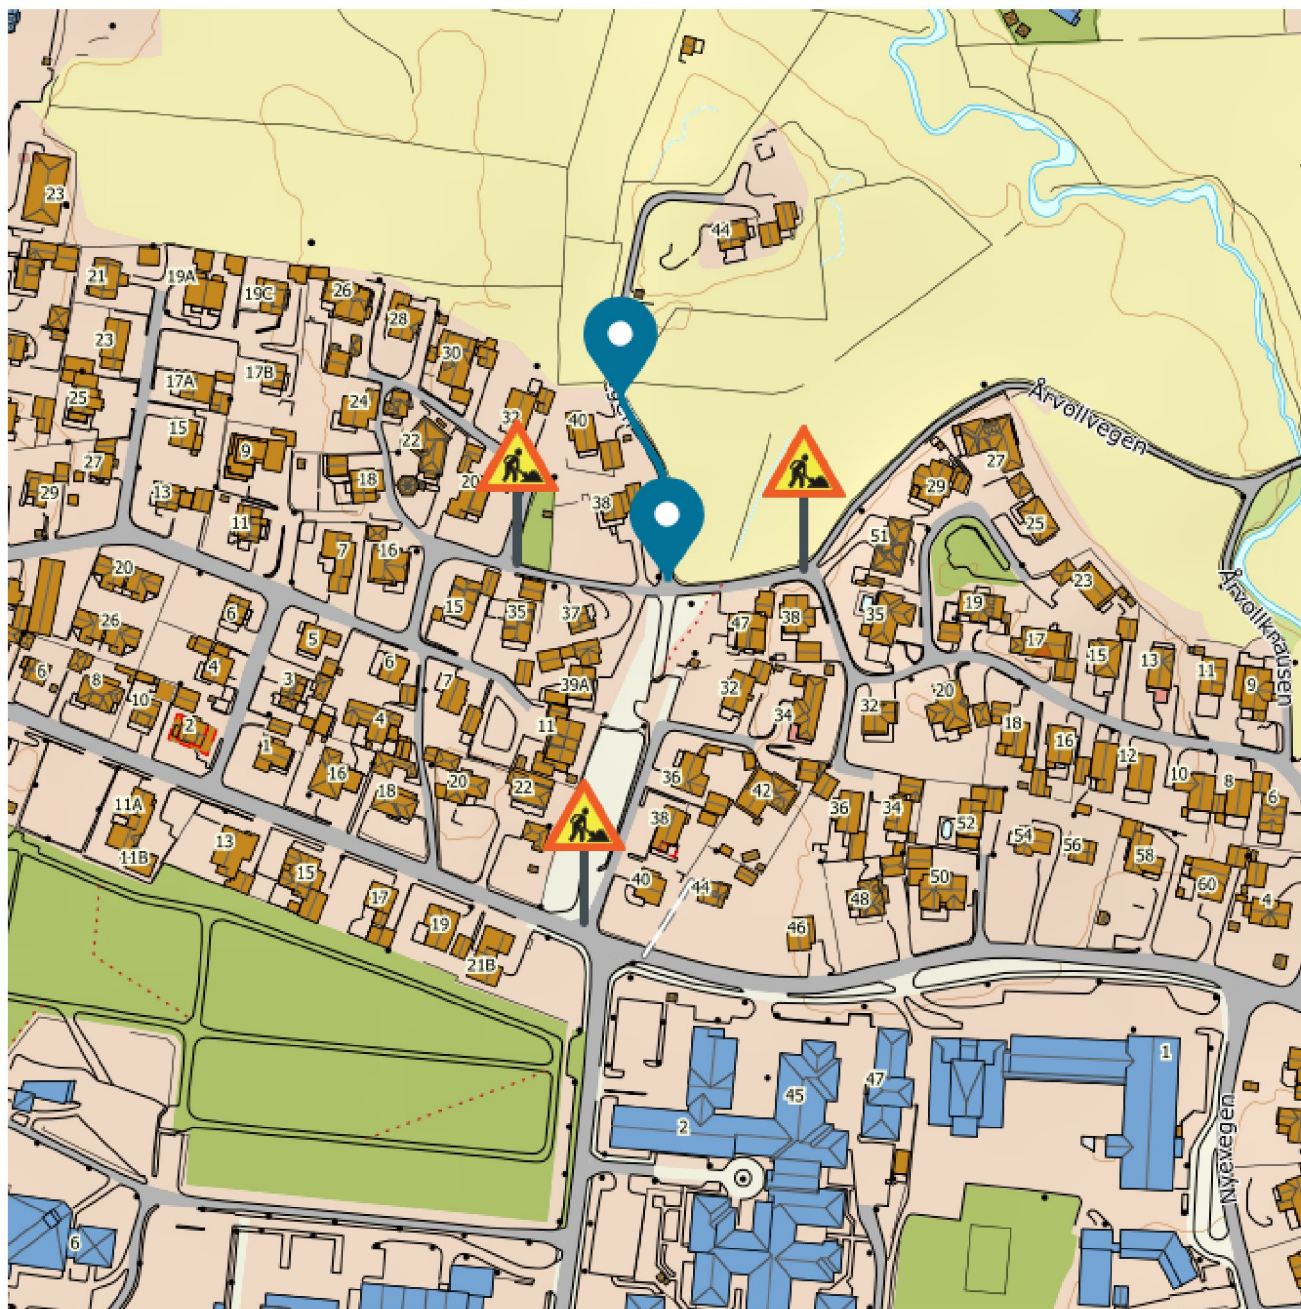

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
26.05.2023	26.06.2023	30 dager	Alle dager	Hele døgnet
				kl. 00:00—23:59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Annet – Diverse grøft arbeid og annet iht agder fk Åkra prosjekt.
Ny vei / va og trekkørgrøfter

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Syklister

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Forbud

PV1295 skiltes med 306.1 + 808.319

Gjelder hele arbeidsperioden

Trafikkregulering – Trafikkvakt

Trafikkvakt for myke trafikanter må vurderes på stedet av entreprenør hvis det er til fare rundt åpne grop/grøft under arbeidstid.

Gjelder i arbeidstiden

Stengt veg – Omkjøring stengt veg

PV1295 stenges og midlertidig omkjøring for de 2 berørte eiendommene blir opprettet.

Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling – Varsling/infoskilt

Berørte veier varsles med 156 +808.712

Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling – Hindermarkering

Det settes opp sperrebukk på PV1295 med 306.1 + 808.319 og evt 906 for å sperre av veien og markere andre farer/hinder

Gjelder hele arbeidsperioden

Sikring – Myke trafikanter

Hvis det er åpne grøft/grop eller lignende som er til fare for myke trafikanter/beboere så skal disse sikres på en forsvarlig måte ved endt arbeidsdag.

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Kontaktperson

Martin Ramstad

Telefonnummer

45901020

E-postadresse

martin.ramstad@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

BERTELSEN & GARPESTAD AS
(939015159)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

BERTELSEN & GARPESTAD AS
(939015159)

**E-postadresse til
varslingsansvarlig**

Kenneth.rott@bg.no

Ansvarshavende

Navn

Mobiltelefonnummer

E-postadresse

Kompetansebevis (gyldig til)

Arnt Helge
Helgstad

92057334

arnthelge.hegelstad@bg.no

kurs_Arnt Helge Helgstad_Arnt Helge
Hegelstad, Kurs 2 – 08.04.26.jpg
(08.04.2026)

Stedsansvarlig

Navn

Mobiltelefonnummer

E-postadresse

Kompetansebevis (gyldig til)

Lars Martin Vika

99543511

Lars.Martin.Vika@bg.no

kurs_Lars Martin Vika_Lars Martin Vika – Kurs
2 – 01.09.26.JPG (01.09.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggstrafikk – Fase 1 – GIA – RAD.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Forbud – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkvakt – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_Årvollvegen – Stengt – Omkjøring – Anleggstrafikk – Fase 1 – GUA – RAD.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Forbud – Gjelder utenfor arbeidstiden

Tilleggsinformasjon

Kommentar

Søkes om vedtak for skilt plassert på privat vei.

Vedlegg bekreftelse på bruk av privat tomt for omkjøring og div

Gravesøknad foreligger fra før ettersom dette er et rogaland fk prosjekt.

Kommunen er innforstått med prosjektet og har gitt tillatelser og vedtak for kommunale veier.
